MIA – Haus für Kinder, Markt Indersdorf | Ausführungsterminplan

Vorabzug 20.03.2026
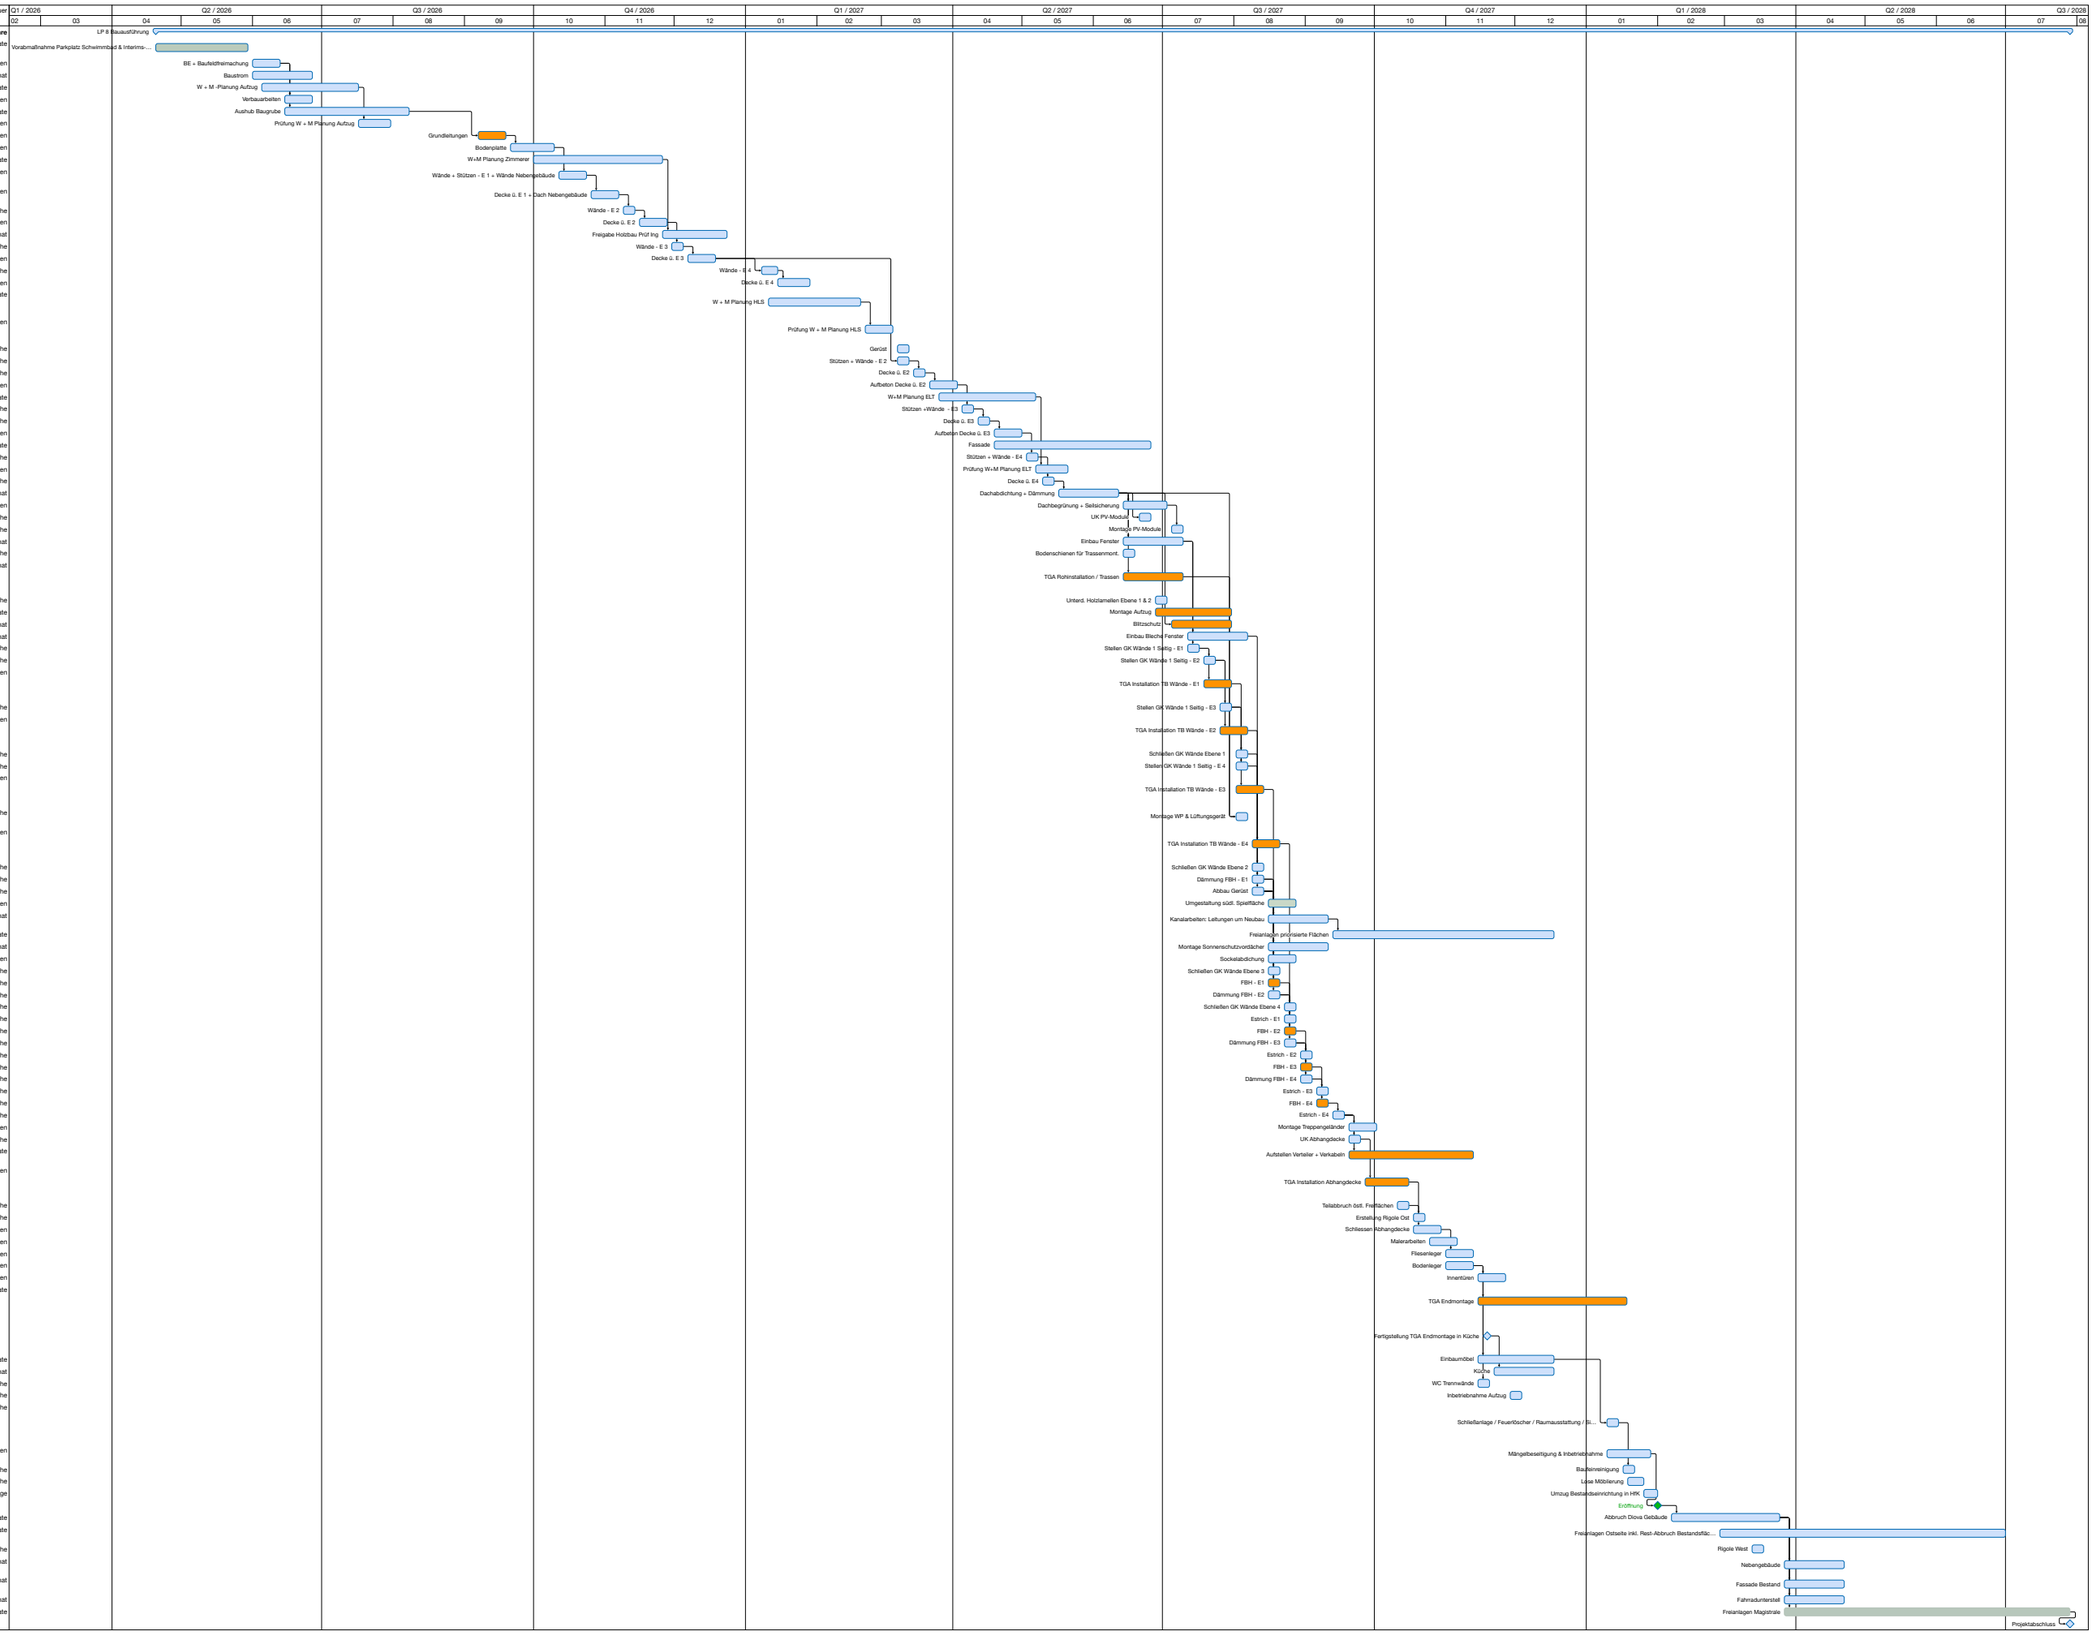
LV Nummer	Titel	#	Erwarteter Start	Ende	Erwartete Dauer
	LP 8 Bauausführung	**0**	**20.04.26**	**28.07.28**	**2,48 Jahre**
LV 501	Vorabmaßnahme Parkplatz Schwimmbad & Interims-Stellplätze	1	20.04.26	29.05.26	1,5 Monate
LV 101	BE + Baufeldfreimachung	2	01.06.26	12.06.26	2 Wochen
LV 301	Baustrom	3	01.06.26	26.06.26	1 Monat
LV 304	W + M -Planung Auftrag	4	05.06.26	16.07.26	1,5 Monate
LV 101	Verbauarbeiten	5	15.06.26	26.06.26	2 Wochen
LV 101	Aushub Baugrube	6	15.06.26	07.08.26	2 Monate
LV 304	Prüfung W + M Planung Auftrag	7	17.07.26	30.07.26	2 Wochen
LV 102	Grundleitungen	8	07.09.26	18.09.26	2 Wochen
LV 102	Bodenplatte	9	21.09.26	09.10.26	3 Wochen
LV 103	W+M Planung Zimmerer	10	01.10.26	25.11.26	2 Monate
LV 102	Wände + Stützen - E 1 + Wände Nebengebäude	11	12.10.26	23.10.26	2 Wochen
LV 102	Decke ü. E 1 + Dach Nebengebäude	12	26.10.26	06.11.26	2 Wochen
LV 102	Wände - E 2	13	09.11.26	13.11.26	1 Woche
LV 102	Decke ü. E 2	14	16.11.26	27.11.26	2 Wochen
LV 103	Freigabe Holzbau Prüf Ing	15	26.11.26	23.12.26	1 Monat
LV 102	Wände - E 3	16	30.11.26	04.12.26	1 Woche
LV 102	Decke ü. E 3	17	07.12.26	18.12.26	2 Wochen
LV 102	Wände - E 4	18	08.01.27	14.01.27	1 Woche
LV 102	Decke ü. E 4	19	15.01.27	28.01.27	2 Wochen
LV 201 LV 202 LV 203	W + M Planung HLS	20	11.01.27	19.02.27	1,5 Monate
LV 201 LV 202 LV 203	Prüfung W + M Planung HLS	21	22.02.27	05.03.27	2 Wochen
LV 103	Gerüst	22	08.03.27	12.03.27	1 Woche
LV 103	Stützen + Wände - E 2	23	08.03.27	12.03.27	1 Woche
LV 103	Decke ü. E2	24	15.03.27	19.03.27	1 Woche
LV 103	Aufbeton Decke ü. E2	25	22.03.27	02.04.27	2 Wochen
LV 303	W+M Planung ELT	26	26.03.27	06.05.27	1,5 Monate
LV 103	Stützen +Wände - E3	27	05.04.27	09.04.27	1 Woche
LV 103	Decke ü. E3	28	12.04.27	16.04.27	1 Woche
LV 103	Aufbeton Decke ü. E3	29	19.04.27	30.04.27	2 Wochen
LV 103	Fassade	30	19.04.27	25.06.27	2,5 Monate
LV 103	Stützen + Wände - E4	31	03.05.27	07.05.27	1 Woche
LV 303	Prüfung W+M Planung ELT	32	07.05.27	20.05.27	2 Wochen
LV 103	Decke ü. E4	33	10.05.27	14.05.27	1 Woche
LV 104	Dachabdichtung + Dämmung	34	17.05.27	11.06.27	1 Monat
LV 104	Dachbegrünung + Seilsicherung	35	14.06.27	02.07.27	3 Wochen
LV 303	UK PV-Module	36	21.06.27	25.06.27	1 Woche
LV 303	Montage PV-Module	37	05.07.27	09.07.27	1 Woche
LV 106	Einbau Fenster	38	14.06.27	09.07.27	1 Monat
LV 107	Bodenschienen für Trassenmont.	39	14.06.27	18.06.27	1 Woche
LV 201 LV 202 LV 203 LV 303	TGA Rohinstallation / Trassen	40	14.06.27	09.07.27	1 Monat
LV 103	Unterd. Holzlamellen Ebene 1 & 2	41	28.06.27	02.07.27	1 Woche
LV 304	Montage Aufzug	42	28.06.27	30.07.27	1,25 Monate
LV 302	Blitzschutz	43	05.07.27	30.07.27	1 Monat
LV 106	Einbau Bleche Fenster	44	12.07.27	06.08.27	1 Monat
LV 107	Stellen GK Wände 1 Seitig - E1	45	12.07.27	16.07.27	1 Woche
LV 107	Stellen GK Wände 1 Seitig - E2	46	19.07.27	23.07.27	1 Woche
LV 201 LV 202 LV 203 LV 303	TGA Installation TB Wände - E1	47	19.07.27	30.07.27	2 Wochen
LV 107	Stellen GK Wände 1 Seitig - E3	48	26.07.27	30.07.27	1 Woche
LV 201 LV 202 LV 203 LV 303	TGA Installation TB Wände - E2	49	26.07.27	06.08.27	2 Wochen
LV 107	Schließen GK Wände Ebene 1	50	02.08.27	06.08.27	1 Woche
LV 107	Stellen GK Wände 1 Seitig - E 4	51	02.08.27	06.08.27	1 Woche
LV 201 LV 202 LV 203 LV 303	TGA Installation TB Wände - E3	52	02.08.27	13.08.27	2 Wochen
LV 201 LV 202	Montage WP & Lüftungsgerät	53	02.08.27	06.08.27	1 Woche
LV 201 LV 202 LV 203 LV 303	TGA Installation TB Wände - E4	54	09.08.27	20.08.27	2 Wochen
LV 107	Schließen GK Wände Ebene 2	55	09.08.27	13.08.27	1 Woche
LV 108	Dämmung FBH - E1	56	09.08.27	13.08.27	1 Woche
LV 103	Abbau Gerüst	57	09.08.27	13.08.27	1 Woche
LV 502	Umgestaltung südl. Spielfläche	58	16.08.27	27.08.27	2 Wochen
LV 204	Kanalarbeiten: Leitungen um Neubau	59	16.08.27	10.09.27	1 Monat
LV 502	Freianlagen priorisierte Flächen	60	13.09.27	17.12.27	3,5 Monate
LV 105	Montage Sonnenschutzvordächer	61	16.08.27	10.09.27	1 Monat
LV 104	Sockelabdichtung	62	16.08.27	27.08.27	2 Wochen
LV 107	Schließen GK Wände Ebene 3	63	16.08.27	20.08.27	1 Woche
LV 201	FBH - E1	64	16.08.27	20.08.27	1 Woche
LV 108	Dämmung FBH - E2	65	16.08.27	20.08.27	1 Woche
LV 107	Schließen GK Wände Ebene 4	66	23.08.27	27.08.27	1 Woche
LV 108	Estrich - E1	67	23.08.27	27.08.27	1 Woche
LV 201	FBH - E2	68	23.08.27	27.08.27	1 Woche
LV 108	Dämmung FBH - E3	69	23.08.27	27.08.27	1 Woche
LV 108	Estrich - E2	70	30.08.27	03.09.27	1 Woche
LV 201	FBH - E3	71	30.08.27	03.09.27	1 Woche
LV 108	Dämmung FBH - E4	72	30.08.27	03.09.27	1 Woche
LV 108	Estrich - E3	73	06.09.27	10.09.27	1 Woche
LV 201	FBH - E4	74	06.09.27	10.09.27	1 Woche
LV 108	Estrich - E4	75	13.09.27	17.09.27	1 Woche
LV 105	Montage Treppengeländer	76	20.09.27	01.10.27	2 Wochen
LV 107	UK Abhangdecke	77	20.09.27	24.09.27	1 Woche
LV 201 LV 303	Aufstellen Verteiler + Verkabeln	78	20.09.27	12.11.27	2 Monate
LV 201 LV 202 LV 203 LV 303	TGA Installation Abhangdecke	79	27.09.27	15.10.27	3 Wochen
LV 502	Teilabbruch östl. Freiflächen	80	11.10.27	15.10.27	1 Woche
LV 204	Erstellung Rigole Ost	81	18.10.27	22.10.27	1 Woche
LV 107	Schliessen Abhangdecke	82	18.10.27	29.10.27	2 Wochen
LV 114	Malerarbeiten	83	25.10.27	05.11.27	2 Wochen
LV 109	Fliesenleger	84	01.11.27	12.11.27	2 Wochen
LV 110	Bodenleger	85	01.11.27	12.11.27	2 Wochen
LV 111	Innentüren	86	15.11.27	26.11.27	2 Wochen
LV 201 LV 202 LV 203 LV 303	TGA Endmontage	87	15.11.27	18.01.28	2,33 Monate
LV 201 LV 202 LV 203 LV 303	Fertigstellung TGA Endmontage in Küche	88	19.11.27	19.11.27	
LV 112	Einbaumöbel	89	15.11.27	17.12.27	1,25 Monate
LV 401	Küche	90	22.11.27	17.12.27	1 Monat
LV 113	WC Trennwände	91	15.11.27	19.11.27	1 Woche
LV 304	Inbetriebnahme Aufzug	92	29.11.27	03.12.27	1 Woche
LV 115 LV 117 LV 118 LV 119 LV 120	Schließanlage / Feuerlöscher / Raumausstattung / Signaletik	93	10.01.28	14.01.28	1 Woche
	Mängelbeseitigung & Inbetriebnahme	94	10.01.28	28.01.28	3 Wochen
LV 116	Baufeinreinigung	95	17.01.28	21.01.28	1 Woche
LV 120	Lose Möblierung	96	19.01.28	25.01.28	1 Woche
	Umzug Bestandseinrichtung in HfK	97	26.01.28	31.01.28	4 Tage
	Eröffnung	98	01.02.28	01.02.28	
LV 150	Abbruch Diova Gebäude	99	07.02.28	24.03.28	1,75 Monate
LV 502	Freianlagen Ostseite inkl. Rest-Abbruch Bestandsflächen	100	28.02.28	30.06.28	4,5 Monate
LV 502	Rigole West	101	13.03.28	17.03.28	1 Woche
LV 103 LV 105	Nebengebäude	102	27.03.28	21.04.28	1 Monat
LV 103 LV 106	Fassade Bestand	103	27.03.28	21.04.28	1 Monat
LV 102	Fahrradunterstell	104	27.03.28	21.04.28	1 Monat
LV 502	Freianlagen Magistrale	105	27.03.28	28.07.28	4,5 Monate
	Projektabschluss	106	28.07.28	28.07.28
