Terminplan
Ausführungsplanung

Projekt: 522L Installation maschinelle Überschussschlammeindickung
Kläranlage Aidlingen

Datum: Mon 11.05.26
Ketterer

Nr.	Vorgangsn	Task name	Duration	Anfang	Ende	Vorgänger
1		LP4: Genehmigungsplanung	8 Wochen	Mon 01.12.25	Mit 28.01.26	
2		**LP5+6: Ausführungsplanung + Vergabevorbereitung**	**202,5 Tage**	**Mit 28.01.26**	**Don 12.11.26**	
3		**Bautechnik**	**133,87 Tage**	**Mit 28.01.26**	**Don 23.07.26**	
4		Ausführungsplanung	11,5 Wochen	Mit 28.01.26	Die 14.04.26	1
5		LV-Erstellung	4 Wochen	Die 14.04.26	Die 12.05.26	4
6		Erstellung KEVM	2 Wochen	Die 07.04.26	Die 21.04.26	4EA-5 Tage
7		Abstimmung LV und KEVM mit AG	2 Wochen	Die 12.05.26	Mon 25.05.26	6;5
8		Ausgabe LV	0 Tage	Die 26.05.26	Die 26.05.26	7EA+1 Tag
9		Kalkulationszeit	5 Wochen	Die 26.05.26	Fre 26.06.26	8
10		Submission	0 Tage	Fre 26.06.26	Fre 26.06.26	9
11		Prüfung und Wertung	1,8 Wochen	Fre 26.06.26	Don 09.07.26	9
12		Vergabevorschlag	0 Tage	Don 09.07.26	Don 09.07.26	11
13		Vergabe	2 Wochen	Don 09.07.26	Mit 22.07.26	11
14		GR-Sitzung	0 Tage	Don 23.07.26	Don 23.07.26	13
15		**Maschinen-, Prozess- und Verfahrenstechnik**	**133,87 Tage**	**Mit 28.01.26**	**Don 23.07.26**	
16		Ausführungsplanung	11,5 Wochen	Mit 28.01.26	Die 14.04.26	1
17		LV-Erstellung	2 Wochen	Die 14.04.26	Mon 27.04.26	16
18		Erstellung KEVM	2 Wochen	Die 07.04.26	Die 21.04.26	16EA-5 Tage
19		Abstimmung LV und KEVM mit AG	2 Wochen	Mon 27.04.26	Die 12.05.26	17
20		Ausgabe LV	0 Tage	Die 12.05.26	Die 12.05.26	19
21		Kalkulationszeit	6 Wochen	Die 12.05.26	Fre 19.06.26	20
22		Submission	0 Tage	Fre 19.06.26	Fre 19.06.26	21
23		Prüfung und Wertung	3 Wochen	Fre 19.06.26	Don 09.07.26	21
24		Vergabevorschlag	0 Tage	Don 09.07.26	Don 09.07.26	23
25		Vergabe	2 Wochen	Don 09.07.26	Mit 22.07.26	23
26		GR-Sitzung	0 Tage	Don 23.07.26	Don 23.07.26	25
27		**EMSR-Technik**	**95 Tage**	**Fre 19.06.26**	**Don 12.11.26**	
28		Ausführungsplanung	4 Wochen	Fre 19.06.26	Don 16.07.26	
29		LV-Erstellung	2 Wochen	Don 16.07.26	Mit 29.07.26	28
30		Abstimmung LV und KEVM mit AG	2 Wochen	Mit 29.07.26	Die 01.09.26	29
31		Ausgabe LV	0 Tage	Die 01.09.26	Die 01.09.26	30
32		Kalkulationszeit	6 Wochen	Die 01.09.26	Fre 09.10.26	31
33		Prüfung und Wertung	3 Wochen	Fre 09.10.26	Don 29.10.26	32
34		Vergabe	2 Wochen	Don 29.10.26	Don 12.11.26	33
35		**LP8: Bauüberwachung**	**180 Tage**	**Mit 22.07.26**	**Mon 12.04.27**	
36		**Bautechnik**	**140 Tage**	**Mit 22.07.26**	**Mit 17.02.27**	
37		FT-Garage: Technische Klärung	4 Wochen	Mit 22.07.26	Die 08.09.26	13
38		FT-Garage: Lieferzeit	18 Wochen	Die 08.09.26	Fre 08.01.27	37
39		FT-Garage Lieferung	0 Tage	Fre 22.01.27	Fre 22.01.27	38;41EA+2 Woche
40		Versetzung Gastank	1 Woche	Don 29.10.26	Don 05.11.26	45AA+1 Monat
41		Herstellen Bodenplatte	8 Wochen	Don 12.11.26	Fre 08.01.27	40EA+1 Woche
42		Bauarbeiten (Belagsarbeiten, Außenanlagen, ...)	4 Wochen	Fre 22.01.27	Mit 17.02.27	39
43		**Maschinen-, Prozess- und Verfahrenstechnik**	**180 Tage**	**Mit 22.07.26**	**Mon 12.04.27**	
44		Technische Klärung + Werkplanung	2 Monate	Mit 22.07.26	Mon 05.10.26	25
45		Arbeiten erdverlegte Rohrleitungen	2 Monate	Mon 05.10.26	Mit 25.11.26	44
46		Scheibeneindicker: Lieferzeit	16 Wochen	Mon 05.10.26	Fre 22.01.27	44
47		Montage	2 Monate	Mit 17.02.27	Mon 12.04.27	46;39EA+1 Monat
48		Inbetriebnahme	2 Wochen	Die 30.03.27	Mon 12.04.27	52;53
49		**EMSR-Technik**	**100 Tage**	**Don 12.11.26**	**Die 30.03.27**	
50		Technische Klärung	1 Monat	Don 12.11.26	Mit 09.12.26	34
51		Lieferzeiten	2 Monate	Mit 09.12.26	Don 04.02.27	50
52		Elektroinstallation	1 Monat	Don 04.02.27	Mit 03.03.27	51
53		Programmierung	1 Monat	Mit 03.03.27	Die 30.03.27	52

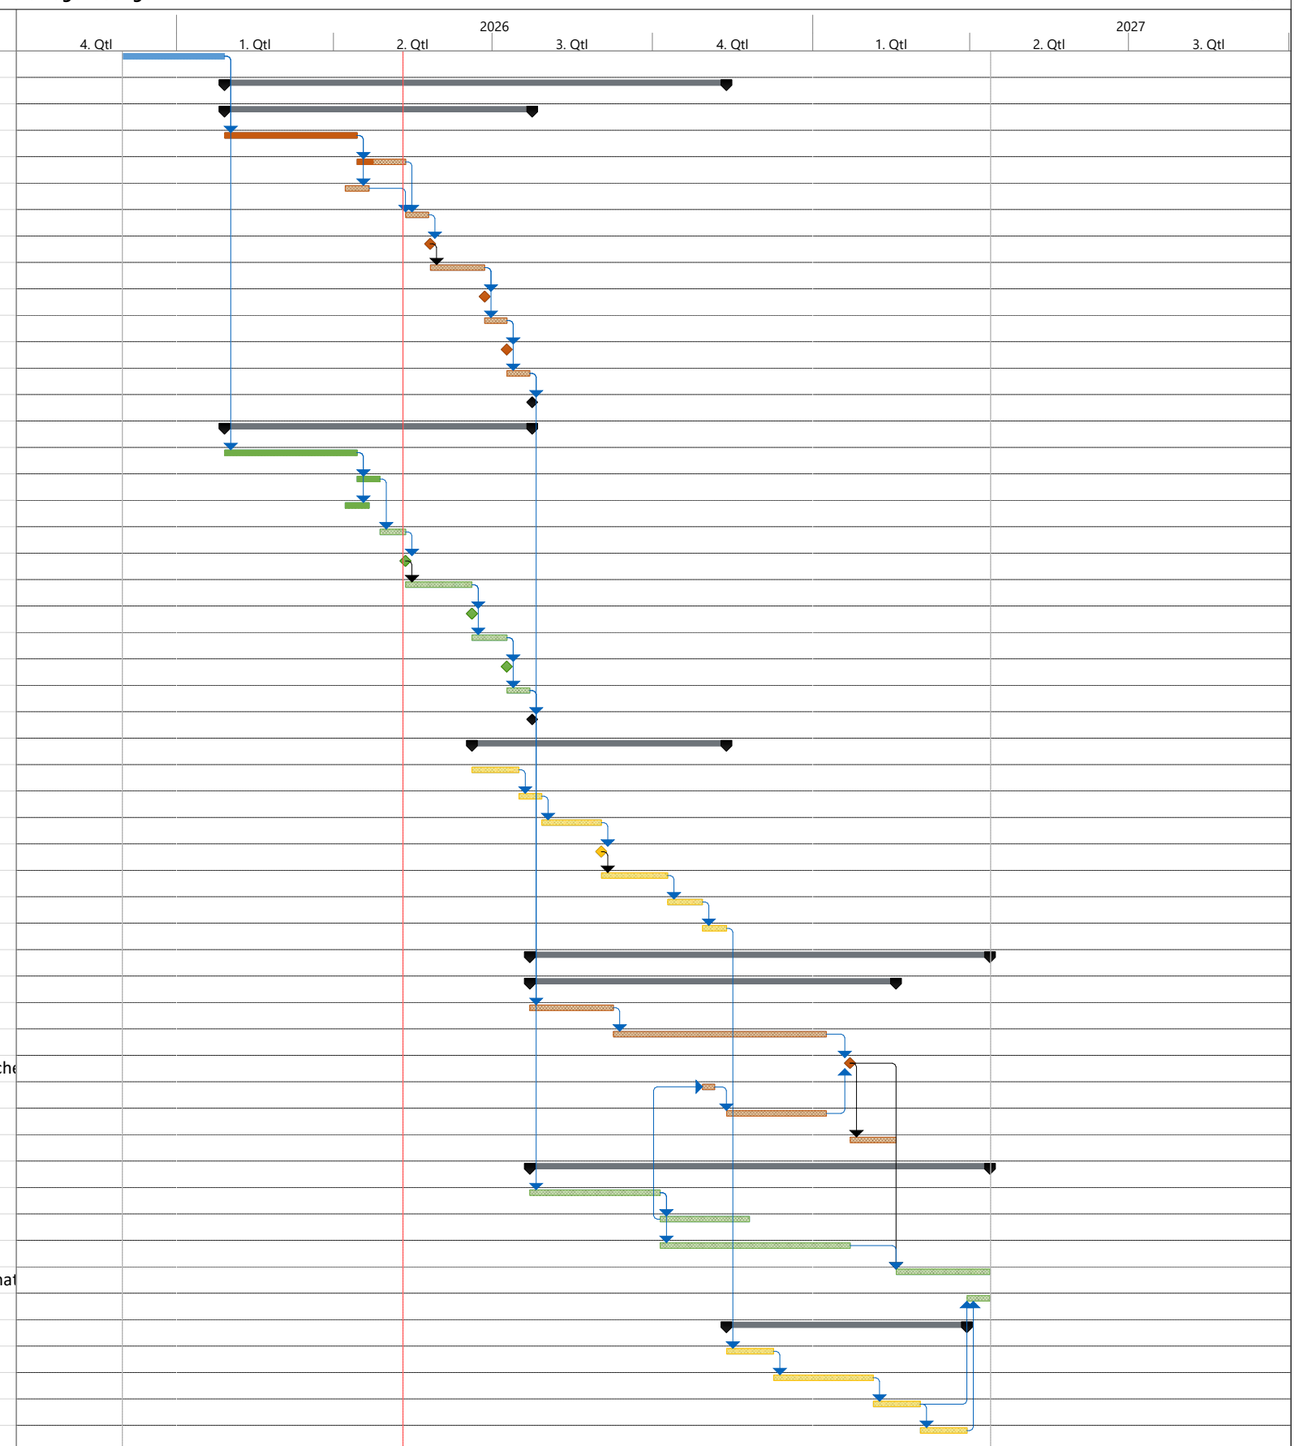

SAG INGENIEURE

Geplanter Meilenstein
Geplanter Sammelvorgang
Vorgang
Fortschritt
Basisplan Meilenstein
Basisplan Sammelvorgang
Meilenstein Aktuell
Sammelvorgang
Basisplan
Vorgang Maschinentechnik
Fortschritt Maschinentechnik
Vorgang EMSR-Technik
Fortschritt EMSR-Technik
Vorgang Bautechnik
Fortschritt Bautechnik
Verspätung
Meilenstein Maschinentechnik
Meilenstein EMSR-Technik
Meilenstin Bautechnik
Geplant
