Bauvorhaben - AOI - Neubau Gasbehälter

Rahmenterminplan

Stand: 30.04.2026
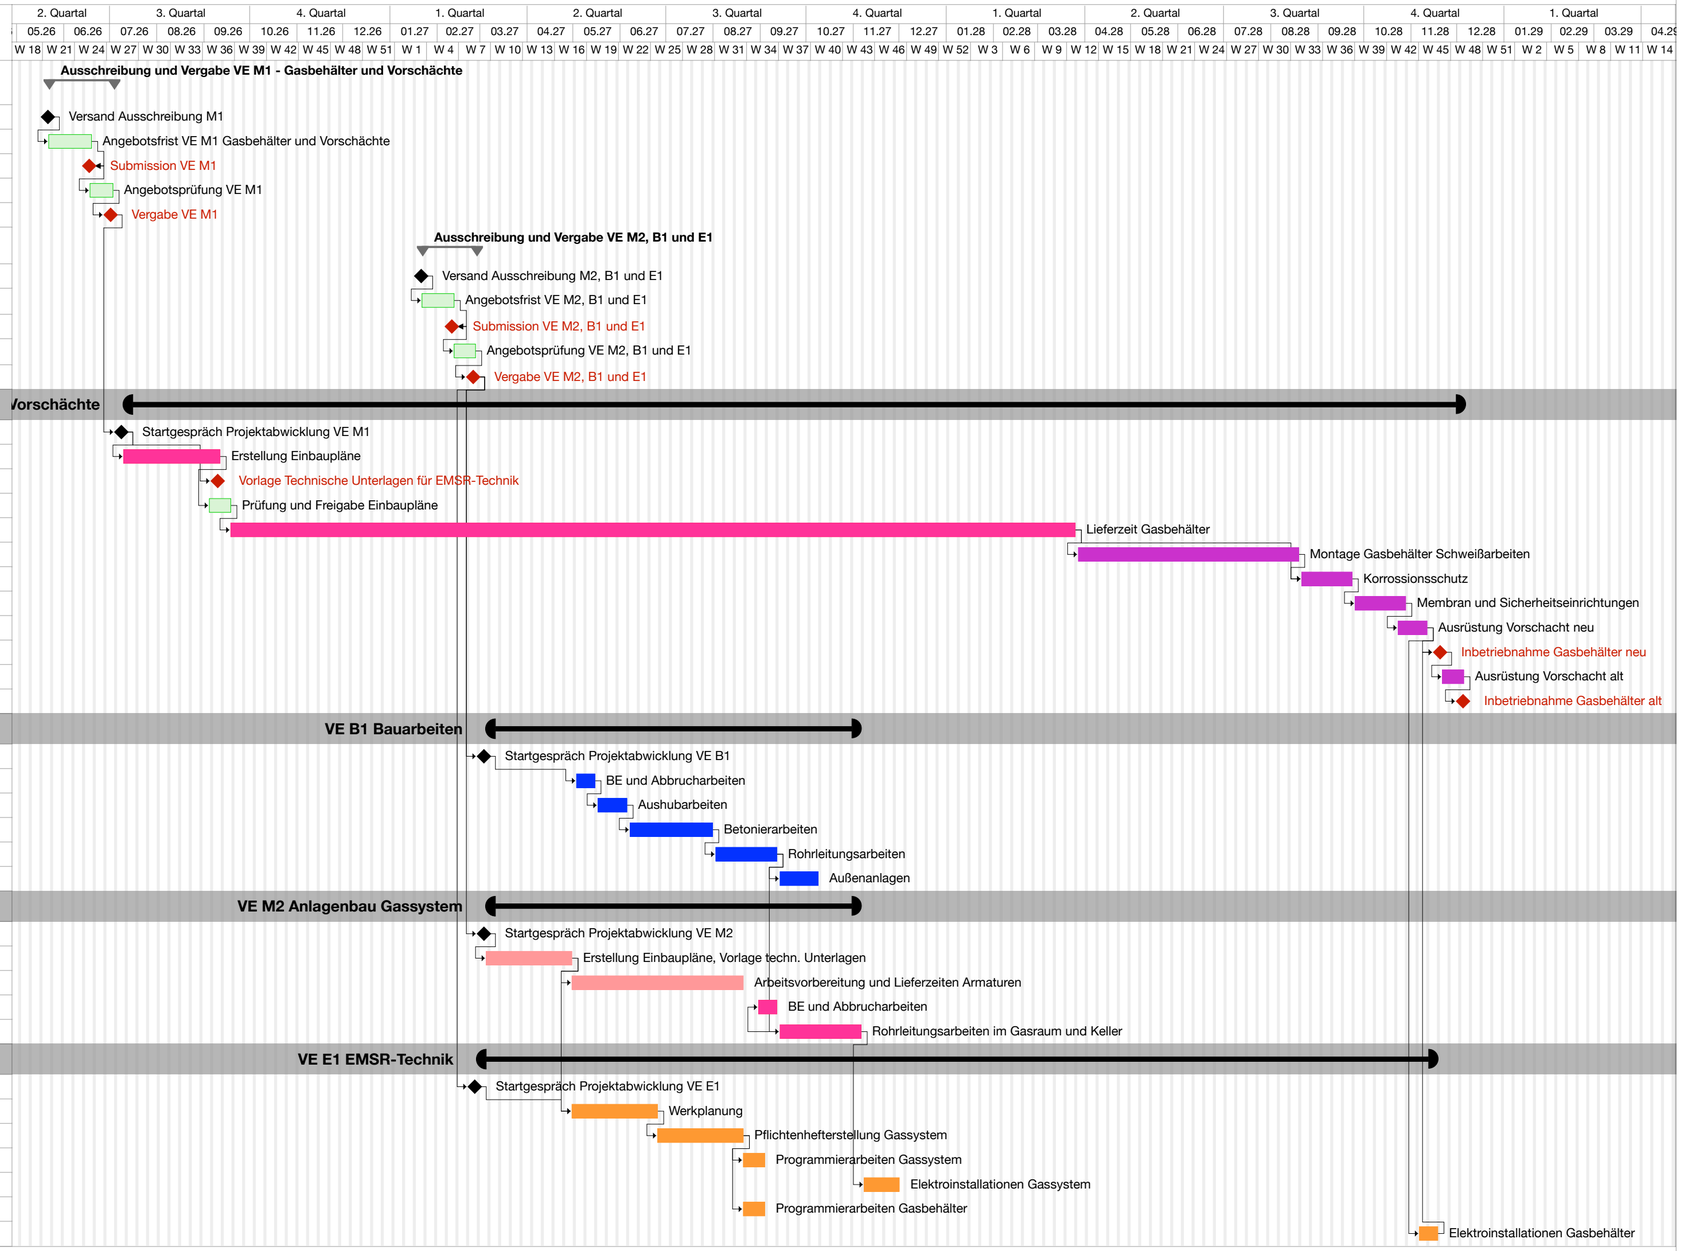
	Name	Dauer	Anfang	Ende
1	**Ausschreibung und Vergabe VE M1 - Gasbehälter und Vorschächte**	**30 t**	**22.05.26, 08:00**	**02.07.26, 17:00**
2	Versand Ausschreibung M1	0 t	22.05.26, 08:00	22.05.26, 08:00
3	Angebotsfrist VE M1 Gasbehälter und Vorschächte	19,38 t	22.05.26, 08:00	18.06.26, 11:00
4	Submission VE M1	0 t	18.06.26, 11:00	18.06.26, 11:00
5	Angebotsprüfung VE M1	10 t	18.06.26, 11:00	02.07.26, 11:00
6	Vergabe VE M1	0 t	02.07.26, 17:00	02.07.26, 17:00
7	**Ausschreibung und Vergabe VE M2, B1 und E1**	**25 t**	**22.01.27, 08:00**	**25.02.27, 17:00**
8	Versand Ausschreibung M2, B1 und E1	0 t	22.01.27, 08:00	22.01.27, 08:00
9	Angebotsfrist VE M2, B1 und E1	15 t	22.01.27, 08:00	11.02.27, 17:00
10	Submission VE M2, B1 und E1	1 t	11.02.27, 08:00	11.02.27, 17:00
11	Angebotsprüfung VE M2, B1 und E1	10 t	12.02.27, 08:00	25.02.27, 17:00
12	Vergabe VE M2, B1 und E1	0 t	25.02.27, 17:00	25.02.27, 17:00
13	**VE M1 Gasbehälter und Vorschächte**	**629 t**	**09.07.26, 08:00**	**05.12.28, 17:00**
14	Startgespräch Projektabwicklung VE M1	1 t	09.07.26, 08:00	09.07.26, 17:00
15	Erstellung Einbaupläne	45 t	10.07.26, 08:00	10.09.26, 17:00
16	Vorlage Technische Unterlagen für EMSR-Technik	0 t	10.09.26, 17:00	10.09.26, 17:00
17	Prüfung und Freigabe Einbaupläne	2 w	04.09.26, 08:00	17.09.26, 17:00
18	Lieferzeit Gasbehälter	396 t	18.09.26, 08:00	24.03.28, 17:00
19	Montage Gasbehälter Schweißarbeiten	21 w	27.03.28, 08:00	18.08.28, 17:00
20	Korrossionsschutz	5 w	21.08.28, 08:00	22.09.28, 17:00
21	Membran und Sicherheitseinrichtungen	5 w	25.09.28, 08:00	27.10.28, 17:00
22	Ausrüstung Vorschacht neu	3 w	23.10.28, 08:00	10.11.28, 17:00
23	Inbetriebnahme Gasbehälter neu	1 t	20.11.28, 08:00	20.11.28, 17:00
24	Ausrüstung Vorschacht alt	2 w	21.11.28, 08:00	04.12.28, 17:00
25	Inbetriebnahme Gasbehälter alt	1 t	05.12.28, 08:00	05.12.28, 17:00
26	**VE B1 Bauarbeiten**	**177 t**	**04.03.27, 08:00**	**05.11.27, 17:00**
27	Startgespräch Projektabwicklung VE B1	1 t	04.03.27, 08:00	04.03.27, 17:00
28	BE und Abbrucharbeiten	2 w	03.05.27, 08:00	14.05.27, 17:00
29	Aushubarbeiten	3 w	17.05.27, 08:00	04.06.27, 17:00
30	Betonierarbeiten	8 w	07.06.27, 08:00	30.07.27, 17:00
31	Rohrleitungsarbeiten	6 w	02.08.27, 08:00	10.09.27, 17:00
32	Außenanlagen	4 w	13.09.27, 08:00	08.10.27, 17:00
33	**VE M2 Anlagenbau Gassystem**	**177 t**	**04.03.27, 08:00**	**05.11.27, 17:00**
34	Startgespräch Projektabwicklung VE M2	1 t	04.03.27, 08:00	04.03.27, 17:00
35	Erstellung Einbaupläne, Vorlage techn. Unterlagen	8 w	05.03.27, 08:00	29.04.27, 17:00
36	Arbeitsvorbereitung und Lieferzeiten Armaturen	16 w	30.04.27, 08:00	19.08.27, 17:00
37	BE und Abbrucharbeiten	2 w	30.08.27, 08:00	10.09.27, 17:00
38	Rohrleitungsarbeiten im Gasraum und Keller	8 w	13.09.27, 08:00	05.11.27, 17:00
39	**VE E1 EMSR-Technik**	**451 t**	**26.02.27, 08:00**	**17.11.28, 17:00**
40	Startgespräch Projektabwicklung VE E1	1 t	26.02.27, 08:00	26.02.27, 17:00
41	Werkplanung	8 w	30.04.27, 08:00	24.06.27, 17:00
42	Pflichtenhefterstellung Gassystem	8 w	25.06.27, 08:00	19.08.27, 17:00
43	Programmierarbeiten Gassystem	2 w	20.08.27, 08:00	02.09.27, 17:00
44	Elektroinstallationen Gassystem	17 t	08.11.27, 08:00	30.11.27, 17:00
45	Programmierarbeiten Gasbehälter	2 w	20.08.27, 08:00	02.09.27, 17:00
46	Elektroinstallationen Gasbehälter	2 w	06.11.28, 08:00	17.11.28, 17:00
