Projekt: 18050 - Sanierung Schule Grassau

Bauzeitenplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1				
2	**Bauzeit 1. + 2. BA**	**1069 Tage**	**Mon 01.08.22**	**Fre 18.12.26**
3	Baustelleneinrichtung	3 Tage	Mon 01.08.22	Mit 03.08.22
4	Interimsmaßnahme Stronmversorgung für Gebäudebestand im Bet	5 Tage	Mit 03.08.22	Die 09.08.22
5	**1. BA einschl. Umzug Schule**	**482 Tage**	**Mon 01.08.22**	**Fre 26.07.24**
71				
73				
74	**2. BA einschl. Umzug Schule**	**563 Tage**	**Mon 02.09.24**	**Fre 18.12.26**
75	**Schadstoffsanierung + Entkernung**	**78 Tage**	**Mon 02.09.24**	**Fre 20.12.24**
78	**Baumeister**	**328 Tage**	**Mit 23.10.24**	**Fre 06.03.26**
89	**Gerüstbau**	**363 Tage**	**Mon 20.01.25**	**Die 14.07.26**
93	**Haustechnische Gewerke**	**406 Tage**	**Mon 14.04.25**	**Fre 04.12.26**
94	HLS-Rohinstallation inkl. Montage Lüftungsgeräte + Heizkör	76 Tage	Mon 14.04.25	Fre 07.11.25
95	HLS: Bodenschienen f. HLS-Ständer/Trockenbau-Sanitärvorw	5 Tage	Mon 15.09.25	Fre 19.09.25
96	ELT-Rohinstallation inkl. Kernbohrungen	77 Tage	Mon 28.04.25	Fre 24.10.25
97	Blitzschutz Dach + Rinnen	10 Tage	Don 11.12.25	Fre 16.01.26
98	Installationen in Trockenbauwänden HLS, ELT	30 Tage	Mon 12.01.26	Fre 20.02.26
99	HLS- + ELT-Brandschotts schließen	15 Tage	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26
100	Feininstallation HLS	45 Tage	Mon 14.09.26	Fre 13.11.26
101	Feininstallation ELT	30 Tage	Mon 21.09.26	Fre 30.10.26
102	Messungen, Inbetriebnahmen, Abnahmen Brandschutz, HLS,	23 Tage	Mit 04.11.26	Fre 04.12.26
103	**Zimmerer/Dachdecker**	**286 Tage**	**Mit 09.07.25**	**Mon 07.09.26**
115	**Spengler**	**151 Tage**	**Fre 21.11.25**	**Mon 13.07.26**
122	**Alu-Holzfenster/-Pfosten-Riegel-Elemente**	**212 Tage**	**Mon 27.01.25**	**Fre 28.11.25**
127	**Alu-Fenster/-Außentüren**	**376 Tage**	**Mon 03.03.25**	**Fre 11.09.26**
135	**Sonnenschutzanlagen**	**162 Tage**	**Mon 26.05.25**	**Die 27.01.26**
139	**Natursteinarbeiten**	**75 Tage**	**Mit 20.08.25**	**Mit 03.12.25**
142	**Innenputz**	**120 Tage**	**Mit 11.06.25**	**Fre 28.11.25**
146	**Wärmedämmverbundsystem**	**40 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Mit 08.07.26**
148	**Trockenbau**	**223 Tage**	**Mon 04.08.25**	**Mon 06.07.26**
149	Abbruch GK-Decken OG Bt1	3 Tage	Mon 04.08.25	Mit 06.08.25
150	Trockenbau: Unterkonstrution Sanitärwände	5 Tage	Mit 22.10.25	Die 28.10.25
151	Abbruch Dachschrägenverkleidung + Dämmung	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25
152	Dampfbremse + Dachschrägenverkldg. neu	21 Tage	Mon 22.12.25	Mon 02.02.26
153	Wände neu Bt2 DG	20 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.02.26
154	Trockenbau DG Bt1: Wände, einseitig beplankt	5 Tage	Mon 22.12.25	Fre 09.01.26
155	Trockenbau EG+ OG: Wände, einseitig beplankt	15 Tage	Die 04.11.25	Mon 24.11.25
156	Trockenbau: Wände schließen	15 Tage	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26
157	Trockenbau: Türstürze Flure + Abgehängte Decken	80 Tage	Mon 09.03.26	Mon 06.07.26
158	**Gussasphaltestrich**	**10 Tage**	**Mon 23.03.26**	**Die 07.04.26**
160	**Fliesen**	**70 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Mit 12.08.26**
161	Wandfliesen Sanitärbereiche + Klassen	29 Tage	Mon 04.05.26	Die 16.06.26
162	Bodenfliesen Sanitärbereiche	25 Tage	Die 02.06.26	Die 07.07.26
163	Bodenfliesen Treppen , Flure	29 Tage	Fre 03.07.26	Mit 12.08.26
164	**Aufzugschacht im Bestand**	**87 Tage**	**Mon 02.03.26**	**Mit 08.07.26**
165	Demontage Aufzugschachtverglasung + -kabine	2 Tage	Mon 02.03.26	Die 03.03.26
166	Remontage Aufzugschachtverglasung + -kabine	3 Tage	Mon 06.07.26	Mit 08.07.26
167	**Schlosser**	**56 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Mon 31.08.26**
168	Schlosser: Demontage Treppengeländer alt + Montage Treppengeländer neu + Rampen Bt2	15 Tage	Mon 15.06.26	Fre 03.07.26
169	Schlosser: Vordach Bt1 Haupteingang Nord, Aussengeländer	19 Tage	Mit 05.08.26	Mon 31.08.26
170	**Maler**	**45 Tage**	**Mon 29.06.26**	**Fre 28.08.26**
171	Maler: Anstrich Wände + Decken, Estrichanstriche	45 Tage	Mon 29.06.26	Fre 28.08.26
172	Maler: Anstrich Treppengeländer	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
173	**Bodenbeläge: Linoleum/Parkett**	**25 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Fre 28.08.26**
174	Bodenbeläge: Ergänzen Trockenestriche, Ausbesserung Gußasphalt (Bestand)	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26
175	Bodenbeläge: Linoleum	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26
176	Parkett	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
177	**Innentüren / WC-Trennwände**	**15 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 18.09.26**
180	**Schreiner: Garderoben etc.**	**5 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 04.09.26**
182	**Bauschlussreinigung**	**35 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 16.10.26**
185	Loses Mobiliar	15 Tage	Mon 02.11.26	Fre 20.11.26
186	**Freianlagen: Eingangstreppen**	**24 Tage**	**Mit 15.07.26**	**Mon 17.08.26**
187	Treppenanlage Haupteingang Bt1	10 Tage	Mit 22.07.26	Die 04.08.26
188	Freianlagen, Anschluss Fallrohre, Blitzschutzgräben etc.	20 Tage	Mit 15.07.26	Die 11.08.26
189	Treppenanlage Nebeneingang Bt2	10 Tage	Die 04.08.26	Mon 17.08.26
190				
191	**Umzug Schule in Bt1 + 2**	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26

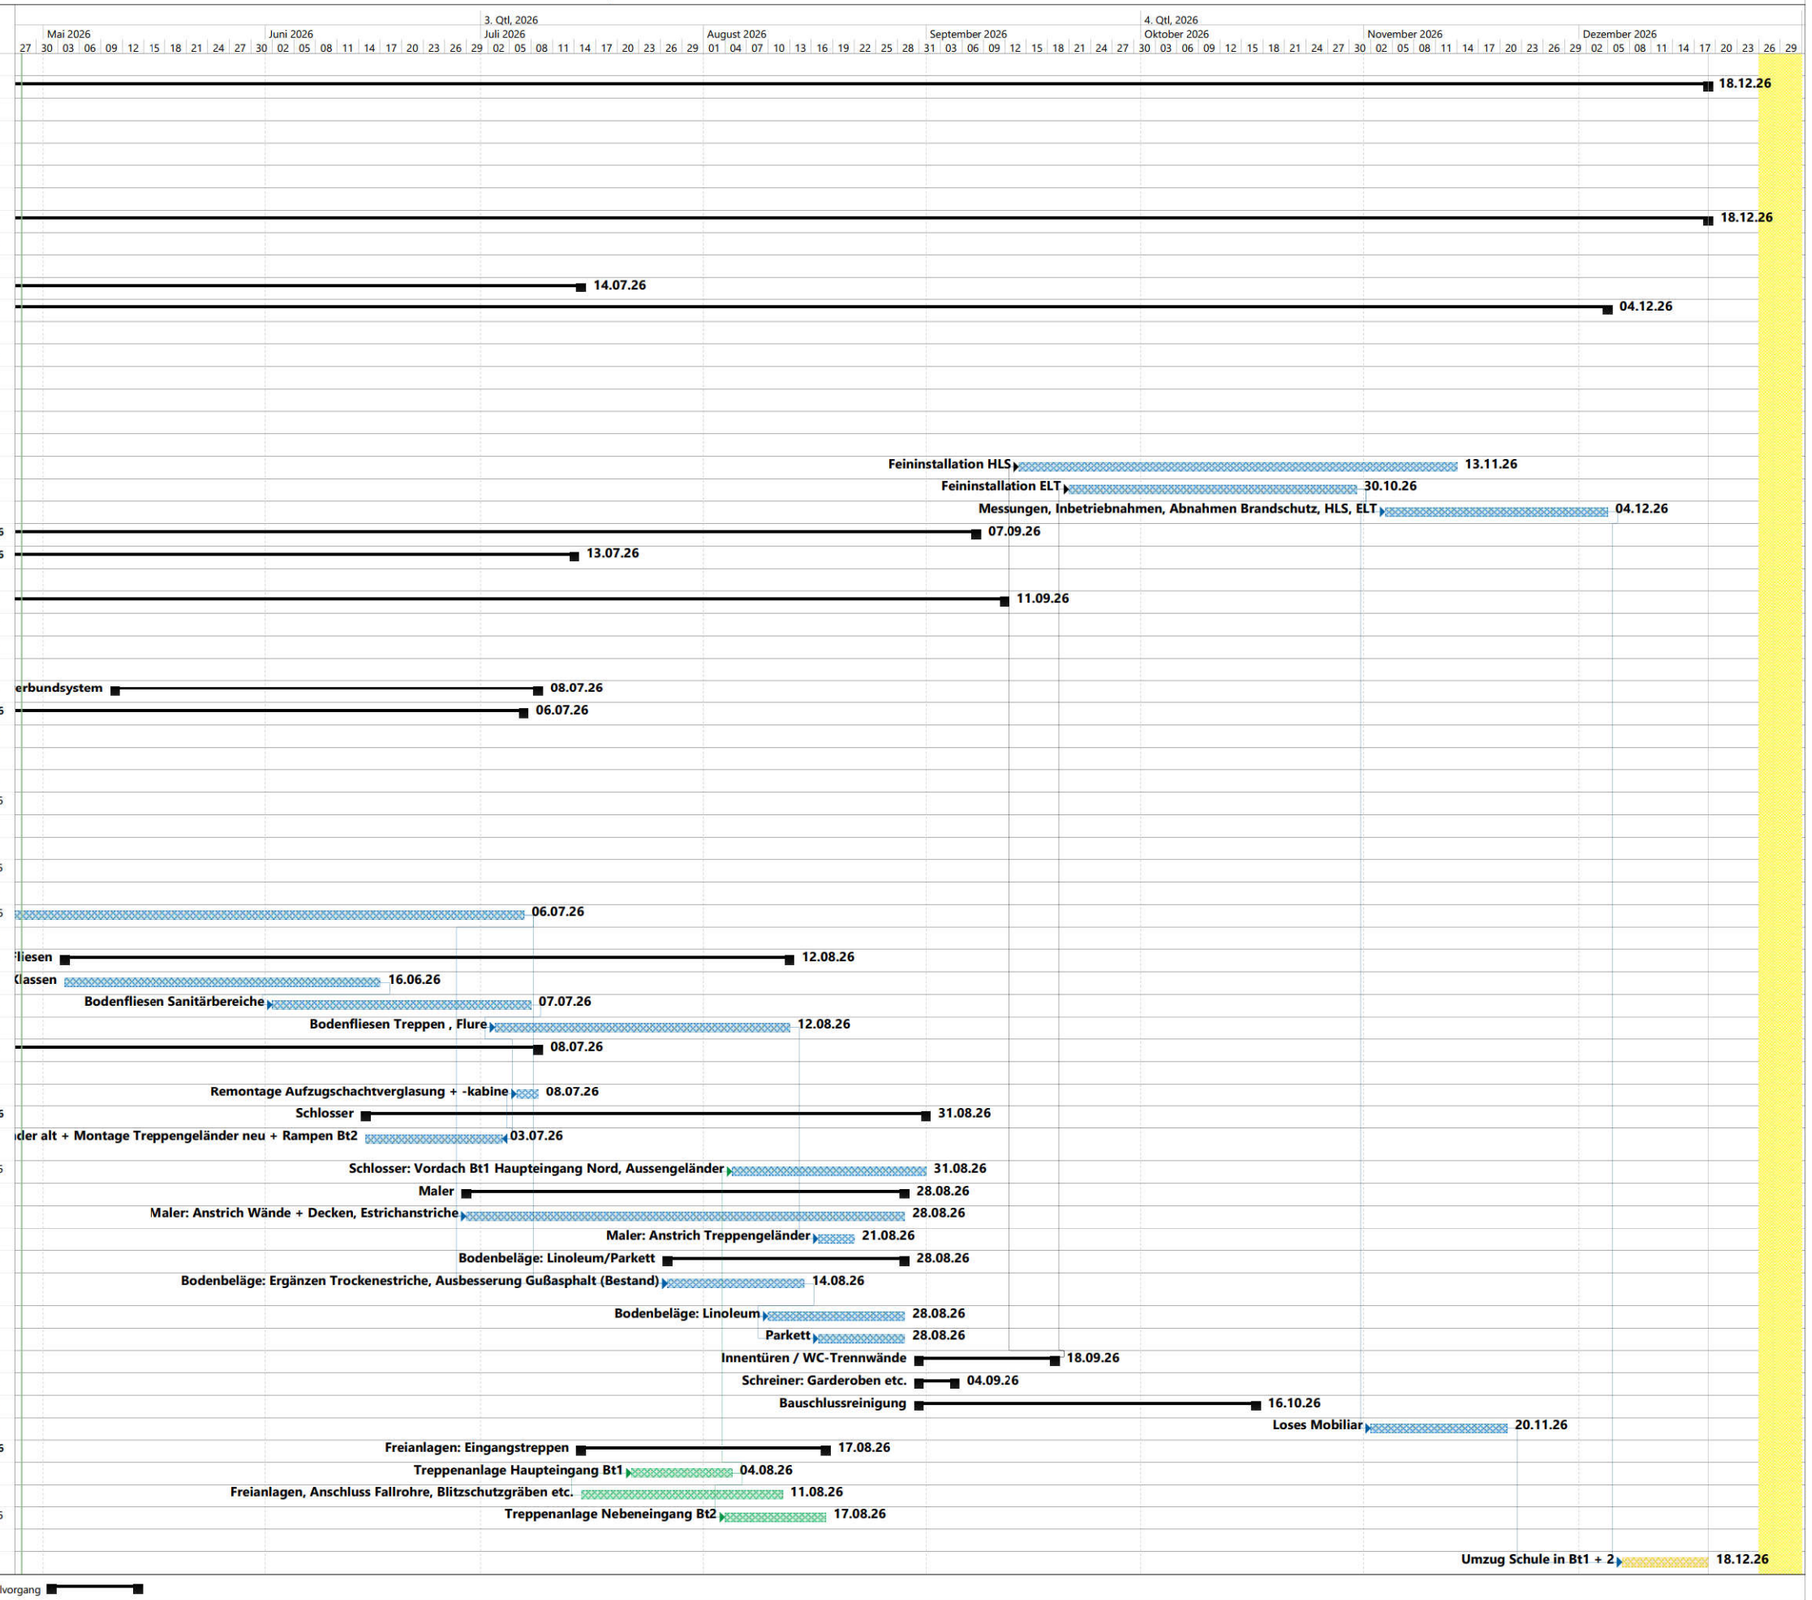

Vorgang | Meilenstein | Sammelvorgang
