Bundesministerium für Bildung und Forschung

Neubau für das Leibniz-Zentrum für Photonik in der Infektionsforschung
Errichtung einer First in Patient Unit (FIPU)

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Bauzeit Umbaumaßnahmen FIPU**	**360 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Fre 29.10.27**	
2	**Bauabschnitt I**	**218 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Mit 14.04.27**	
3	Freischaltung Medien Bereich FIPU 1 BA durch UKJ	0 Tage	Mon 15.06.26	Mon 15.06.26	
4	Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen	15 Tage	Die 16.06.26	Mon 06.07.26	
5	Gerüstaufbau	5 Tage	Mit 17.06.26	Die 23.06.26	4AA+1 Tag
6	Baustellenzugang herstellen	3 Tage	Mit 24.06.26	Fre 26.06.26	5
7	Abbrucharbeiten	15 Tage	Mit 24.06.26	Die 14.07.26	5
8	Durchbruchsarbeiten Außenwand	4 Tage	Don 09.07.26	Die 14.07.26	7EA-4 Tage
9	Außenfenster Blindpaneele	5 Tage	Mit 15.07.26	Die 21.07.26	7
10	Trockenbauwände anlegen & einseitig beplanken	50 Tage	Mit 15.07.26	Die 22.09.26	7
11	Trockenbauwände abgestellen	20 Tage	Mit 26.08.26	Die 22.09.26	10EA-20 Tage
12	Maßnahmen TGA E00	40 Tage	Mit 29.07.26	Die 22.09.26	10AA+10 Tage;9AA+
13	Demontage und Grobinstallation E10	140 Tage	Mit 24.06.26	Die 05.01.27	6AA
14	Installation UK DVE und Lifter	20 Tage	Mit 26.08.26	Die 22.09.26	10EA-20 Tage
15	Trockenbau schließen Wände+Decken	30 Tage	Mit 23.09.26	Die 03.11.26	14
16	Laserschutz	10 Tage	Mit 21.10.26	Die 03.11.26	15EA-10 Tage
17	Einbringung Durchblickfenster & Metalltüren	10 Tage	Mit 21.10.26	Die 03.11.26	15EA-10 Tage
18	Estrich Spachtelmasse / Ausgleichsmasse	5 Tage	Mit 04.11.26	Die 10.11.26	17;15;16
19	Bodenbelagsarbeiten	20 Tage	Mit 11.11.26	Die 08.12.26	18
20	Malerarbeiten	30 Tage	Mit 11.11.26	Die 22.12.26	18
21	Wandschutz	20 Tage	Mit 18.11.26	Die 15.12.26	20AA+5 Tage
22	Tischler- u. Beschlagarbeiten Innentüren	10 Tage	Mit 09.12.26	Die 22.12.26	20EA-10 Tage
23	Tischler Tresen einbauen	5 Tage	Mit 09.12.26	Die 15.12.26	22AA
24	Weihnachtspause	9 Tage	Mit 23.12.26	Mon 04.01.27	
25	Zwischenreinigung	3 Tage	Die 05.01.27	Don 07.01.27	
26	Feininstallation TGA	30 Tage	Fre 08.01.27	Don 18.02.27	25
27	Einrichtung Medizintechnik	30 Tage	Fre 08.01.27	Don 18.02.27	25
28	Einbringung LED Bilder	10 Tage	Fre 08.01.27	Don 21.01.27	25
29	Lose Möbel	7 Tage	Mit 20.01.27	Don 28.01.27	
30	Schließanlage	7 Tage	Mit 20.01.27	Don 28.01.27	
31	Baustellenzugang schließen	5 Tage	Fre 29.01.27	Don 04.02.27	29;30
32	Fassade (WDVS und Maler)	15 Tage	Fre 05.02.27	Don 25.02.27	31
33	Gerüstabbau	2 Tage	Fre 26.02.27	Mon 01.03.27	32
34	Zwischenreinigung	2 Tage	Fre 19.02.27	Mon 22.02.27	26;27
35	Abnahmen und Restleistungen und Probebetrieb	26 Tage	Die 23.02.27	Die 30.03.27	34
36	Bauendreinigung/Hygienereinigung	5 Tage	Mit 31.03.27	Die 06.04.27	35
37	Hygieneabnahme	1 Tag	Mit 07.04.27	Mit 07.04.27	36
38	Inbetriebnahme und Übergabe an Auftraggeber	5 Tage	Don 08.04.27	Mit 14.04.27	37
39	**Bauabschnitt II**	**142 Tage**	**Don 15.04.27**	**Fre 29.10.27**	
40	Freischaltung Medien Bereich FIPU 2 BA durch UKJ	0 Tage	Don 15.04.27	Don 15.04.27	
41	Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen	15 Tage	Fre 16.04.27	Don 06.05.27	38EA+1 Tag
42	Gerüstaufbau	5 Tage	Fre 07.05.27	Don 13.05.27	41
43	Baustellenzugang herstellen	3 Tage	Fre 14.05.27	Die 18.05.27	42
44	Abbrucharbeiten	5 Tage	Fre 14.05.27	Don 20.05.27	42
45	Trockenbauwände anlegen & einseitig beplanken	15 Tage	Fre 21.05.27	Don 10.06.27	44
46	Trockenbauwände abgestellen	10 Tage	Fre 28.05.27	Don 10.06.27	45EA-10 Tage
47	Maßnahmen TGA E00	10 Tage	Fre 28.05.27	Don 10.06.27	45AA+5 Tage
48	Demontage und Grobinstallation E10	70 Tage	Mit 19.05.27	Die 24.08.27	43
49	Installation UK DVE und Lifter	10 Tage	Fre 28.05.27	Don 10.06.27	45EA-10 Tage
50	Trockenbau schließen Wände+Decken	20 Tage	Fre 11.06.27	Don 08.07.27	46
51	Laserschutz	5 Tage	Fre 02.07.27	Don 08.07.27	50EA-5 Tage
52	Metallbauarbeiten	5 Tage	Fre 02.07.27	Don 08.07.27	50EA-5 Tage
53	Estrich Spachtelmasse / Ausgleichsmasse	3 Tage	Fre 09.07.27	Die 13.07.27	50
54	Bodenbelagsarbeiten	15 Tage	Mit 14.07.27	Die 03.08.27	53
55	Malerarbeiten	25 Tage	Mit 14.07.27	Die 17.08.27	53
56	Wandschutz	15 Tage	Mit 21.07.27	Die 10.08.27	55AA+5 Tage
57	Tischler- u. Beschlagarbeiten Innentüren	5 Tage	Mit 11.08.27	Die 17.08.27	55EA-5 Tage
58	Zwischenreinigung	2 Tage	Mit 18.08.27	Don 19.08.27	55
59	Feininstallation TGA	10 Tage	Fre 20.08.27	Don 02.09.27	58
60	Einrichtung Medizintechnik	10 Tage	Fre 20.08.27	Don 02.09.27	58
61	LED Wandelemente	5 Tage	Fre 27.08.27	Don 02.09.27	59EA-5 Tage
62	Schließanlage	5 Tage	Fre 27.08.27	Don 02.09.27	61AA
63	Baustellenzugang schließen	5 Tage	Fre 03.09.27	Don 09.09.27	62
64	Fassade (WDVS und Maler)	10 Tage	Fre 10.09.27	Don 23.09.27	63
65	Gerüstabbau	2 Tage	Fre 24.09.27	Mon 27.09.27	64
66	Zwischenreinigung	5 Tage	Fre 03.09.27	Don 09.09.27	62
67	Abnahmen und Restleistungen und Probetrieb	25 Tage	Fre 10.09.27	Don 14.10.27	66
68	Bauendreinigung/Hygienereinigung	5 Tage	Fre 15.10.27	Don 21.10.27	67
69	Hygieneabnahme	1 Tag	Fre 22.10.27	Fre 22.10.27	68
70	Inbetriebnahme und Übergabe an Auftraggeber	5 Tage	Mon 25.10.27	Fre 29.10.27	69

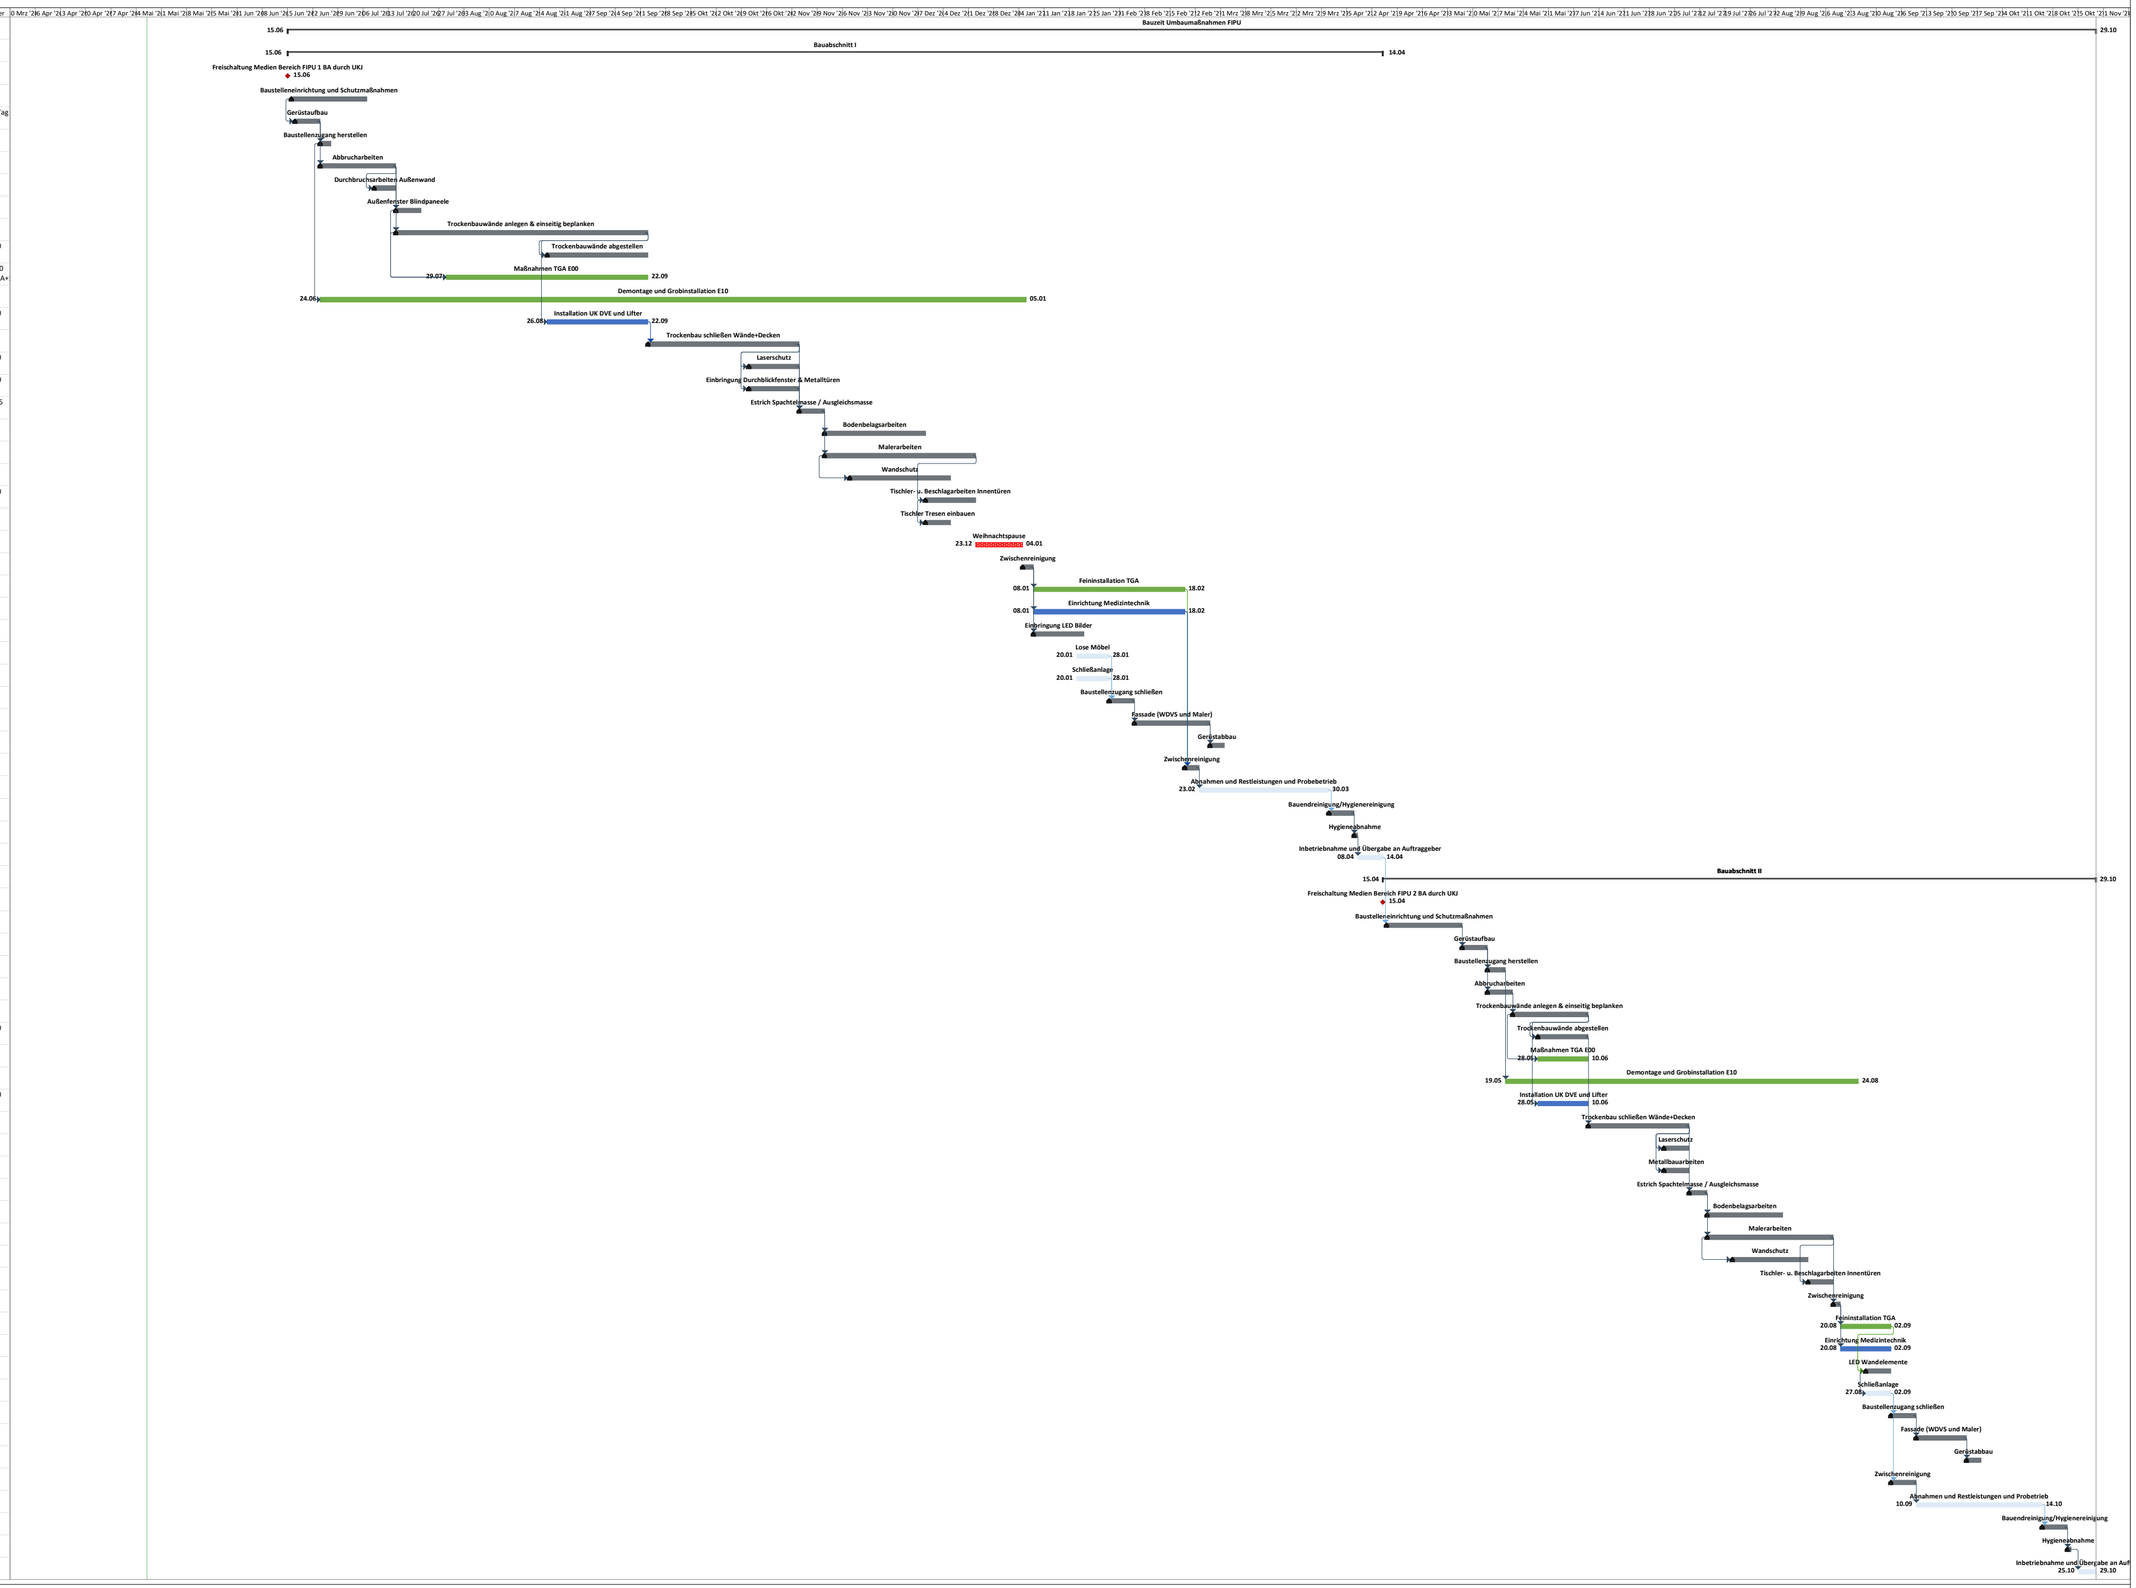

Projekt: First-in-Patient-Unit (212
Datum: Don 07.05.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt

SGP³ Dr. Scholz Gesamtplan GmbH
Neuwerkstraße 29, 99084 Erfurt
Tel.: +49 (0) 361 349 468 0 Mail: 212-01@sgp3.de

Bauablaufplan
