Rahmenterminplan
fassade zuerst)

Druckdatum: 21.05.2026 14:56

Pos	Vorgang	Zuständ	Dauer	Start	Ende
17	**Bauabschnitt 2 (BT POR + Schwimmbad)**		481 kt	Mo, 22.06.26	Fr, 15.10.27
17.1	Baustelleneinrichtung		5 at	Do, 24.09.26	Mi, 30.09.26
17.2	Medienfreiheit		5 at	Fr, 02.10.26	Do, 08.10.26
17.3	**Bauphase 2**		383 kt	Mo, 28.09.26	Fr, 15.10.27
17.4	**Bauphase 2 Schwimmbad**		431 kt	Mo, 22.06.26	Do, 26.08.27
17.4.1	Brandschutz während der Bauphase		5 at	Mo, 22.06.26	Fr, 26.06.26
17.4.2	Medienfreiheit		5 at	Mo, 22.06.26	Fr, 26.06.26
17.4.3	**Bauabschnitt leer**		1 at	Mo, 29.06.26	Mo, 29.06.26
17.4.4	**Rohbauarbeiten**		189 at	Mo, 28.09.26	Fr, 02.07.27
17.4.4.1	Baustelleneinrichtung / Bauzaun	Rohba	2 at	Mo, 28.09.26	Di, 29.09.26
17.4.4.2	Vorhaltung Baustelleneinrichtung / Bauzaun	Rohba	182 at	Mi, 30.09.26	Fr, 25.06.27
17.4.4.3	Umbau Baustelleneinrichtung / Bauzaun	Rohba	5 at	Mo, 28.09.26	Fr, 02.10.26
17.4.4.4	Abbau/ Umbau Baustelleneinrichtung / Bauzaun	Rohba	5 at	Mo, 28.06.27	Fr, 02.07.27
17.4.4.5	Beckenränder abschneiden	Rohba	5 at	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26
17.4.4.6	Abbruch tragende Wände, Erstellung WD+DD	Rohba	5 at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26
17.4.4.7	Stahlträger setzen	Rohba	5 at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26
17.4.4.8	Erdarbeiten / Grundleitungen	Rohba	5 at	Mo, 26.10.26	Fr, 30.10.26
17.4.5	**Entrümpelung / Abbrucharbeiten**	Abbruc	26 at	Fr, 25.09.26	Fr, 30.10.26
17.4.5.1	Kick OFF und Einweisung		1 at	Fr, 25.09.26	Fr, 25.09.26
17.4.5.2	Entrümpelungsarbeiten		5 at	Mo, 28.09.26	Fr, 02.10.26
17.4.5.3	Schutzmaßnahmen		5 at	Mo, 05.10.26	Fr, 09.10.26
17.4.5.4	Abbrucharbeiten Bellage		10 at	Mo, 12.10.26	Fr, 23.10.26
17.4.5.5	Abbrucharbeiten Fenster inkl. OSB Verschluss		10 at	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26
17.4.6	**Estricharbeiten**		52 kt	Mo, 18.01.27	Mi, 10.03.27
17.4.6.1	Abdichtung Bodenplatte		2 at	Mo, 18.01.27	Di, 19.01.27
17.4.6.2	Dämmung		3 at	Mi, 20.01.27	Fr, 22.01.27
17.4.6.3	Estrich		5 at	Mo, 25.01.27	Fr, 29.01.27
17.4.6.4	Estrichtrocknung		39 kt	Sa, 30.01.27	Di, 09.03.27
17.4.6.5	Estrich begehbar		1 kt	Mi, 03.02.27	Mi, 03.02.27
17.4.6.6	Estrich trocken		1 at	Mi, 10.03.27	Mi, 10.03.27
17.4.7	**Fensterbauarbeiten**		75 at	Mo, 27.07.26	Fr, 06.11.26
17.4.7.1	Arbeitsvorbereitung	Fenste	10 at	Mo, 27.07.26	Fr, 07.08.26
17.4.7.2	Produktion	Fenste	50 at	Mo, 10.08.26	Fr, 16.10.26
17.4.7.3	Montage Fenster	Fenste	10 at	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26
17.4.8	**Trockenbauarbeiten**		77 at	Mo, 16.11.26	Fr, 12.03.27
17.4.8.1	Grundkonstruktion1-seitig Beplankung Bäder		10 at	Mo, 16.11.26	Fr, 27.11.26
17.4.8.2	Grundkonstruktion Abhangdecken Holzdecken Schwimmbad		5 at	Mo, 08.03.27	Fr, 12.03.27
17.4.8.3	Beplankung und Spachtelung Bäder		5 at	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27
17.4.8.4	Abhangdecken Bäder		10 at	Mo, 22.02.27	Fr, 05.03.27
17.4.9	**Haustechnik**		199 at	Mo, 05.10.26	Fr, 23.07.27
17.4.9.1	Rohinstallation Bäder		15 at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26
17.4.9.1.1	Heizungsarbeiten		15 at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26
17.4.9.1.2	Sanitärarbeiten		15 at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26
17.4.9.1.3	Lüftungsarbeiten		15 at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26
17.4.9.1.4	Elektroarbeiten		15 at	Mo, 30.11.26	Fr, 18.12.26
17.4.9.2	Demontage Schwimmbadtechnik Bestand		10 at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26
17.4.9.3	Rohinstallation Schwimmhalle		40 at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.03.27
17.4.9.3.1	Schwimmbadtechnik		40 at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.03.27
17.4.9.3.2	Schwimmbecken		40 at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.03.27
17.4.9.3.3	Heizungsarbeiten		40 at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.03.27
17.4.9.3.4	Sanitärarbeiten		40 at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.03.27
17.4.9.3.5	Lüftungsarbeiten		40 at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.03.27
17.4.9.3.6	Elektroarbeiten		40 at	Mo, 11.01.27	Fr, 05.03.27
17.4.9.4	Endmontage		20 at	Di, 11.05.27	Mi, 09.06.27
17.4.9.4.1	Heizungsarbeiten		10 at	Di, 11.05.27	Di, 25.05.27
17.4.9.4.2	Sanitärarbeiten		20 at	Di, 11.05.27	Mi, 09.06.27
17.4.9.4.3	Lüftungsarbeiten		20 at	Di, 11.05.27	Mi, 09.06.27
17.4.9.4.4	Elektroarbeiten		20 at	Di, 11.05.27	Mi, 09.06.27
17.4.9.5	Inbetriebnahmen		20 at	Mo, 28.06.27	Fr, 23.07.27
17.4.9.5.1	Inbetriebnahme Schwimmbadtechnik		20 at	Mo, 28.06.27	Fr, 23.07.27
17.4.9.5.2	Strömungstest Schwimmbecken		20 at	Mo, 28.06.27	Fr, 23.07.27
17.4.10	**Betonsanierung Schwimmbad**		20 at	Mo, 02.11.26	Fr, 27.11.26
17.4.11	**Innenputzarbeiten**		20 at	Mo, 09.11.26	Fr, 04.12.26
17.4.11.1	Innenputz Bäder		5 at	Mo, 09.11.26	Fr, 13.11.26
17.4.11.2	Innenputz Schwimmbad		5 at	Mo, 30.11.26	Fr, 04.12.26
17.4.12	**Deckenschiene Lifter**		95 at	Mo, 11.01.27	Di, 25.05.27
17.4.12.1	Unterkonstruktion		5 at	Mo, 11.01.27	Fr, 15.01.27
17.4.12.2	Schienen		10 at	Di, 11.05.27	Di, 25.05.27
17.4.13	**Holzakustikdecken**		60 at	Mo, 04.01.27	Fr, 26.03.27
17.4.13.1	Abstimmung Holzakustikelemente		10 at	Mo, 04.01.27	Fr, 15.01.27
17.4.13.2	Produktion Holzakustikelemente		40 at	Mo, 18.01.27	Fr, 12.03.27
17.4.13.3	Montage Holzakustikelemente		10 at	Mo, 15.03.27	Fr, 26.03.27
17.4.14	**Abdichtungsarbeiten Fenster**		20 at	Mo, 09.11.26	Fr, 04.12.26
17.4.14.1	Sockelabdichtung	Abdich	10 at	Mo, 09.11.26	Fr, 20.11.26
17.4.14.2	Sockeldämmung	Abdich	10 at	Mo, 23.11.26	Fr, 04.12.26
17.4.15	**Schreiner / Innentüren**		104 at	Mi, 09.12.26	Fr, 14.05.27
17.4.15.1	Abstimmung		10 at	Mi, 09.12.26	Di, 22.12.26
17.4.15.2	Fertigung		55 at	Mo, 04.01.27	Fr, 19.03.27
17.4.15.3	Montage Zargen		5 at	Mo, 22.03.27	Fr, 26.03.27
17.4.15.4	Montage Türblätter		4 at	Di, 11.05.27	Fr, 14.05.27
17.4.16	**Fliesenarbeiten**		20 at	Mo, 29.03.27	Fr, 23.04.27
17.4.16.1	Boden		10 at	Mo, 29.03.27	Fr, 09.04.27
17.4.16.2	Wände		10 at	Mo, 12.04.27	Fr, 23.04.27
17.4.17	**Malerarbeiten**		34 at	Mo, 26.04.27	Di, 15.06.27
17.4.17.1	Malerarbeiten		10 at	Mo, 26.04.27	Mo, 10.05.27
17.4.17.2	Malerarbeiten Nacharbeiten		4 at	Do, 10.06.27	Di, 15.06.27
17.4.18	Endreinigung		8 at	Mi, 16.06.27	Fr, 25.06.27
17.4.19	**Abnahmen / Inbetriebnahme / Übergabe Nutzer / Dokumentation BA 2**		24 at	Mo, 26.07.27	Do, 26.08.27

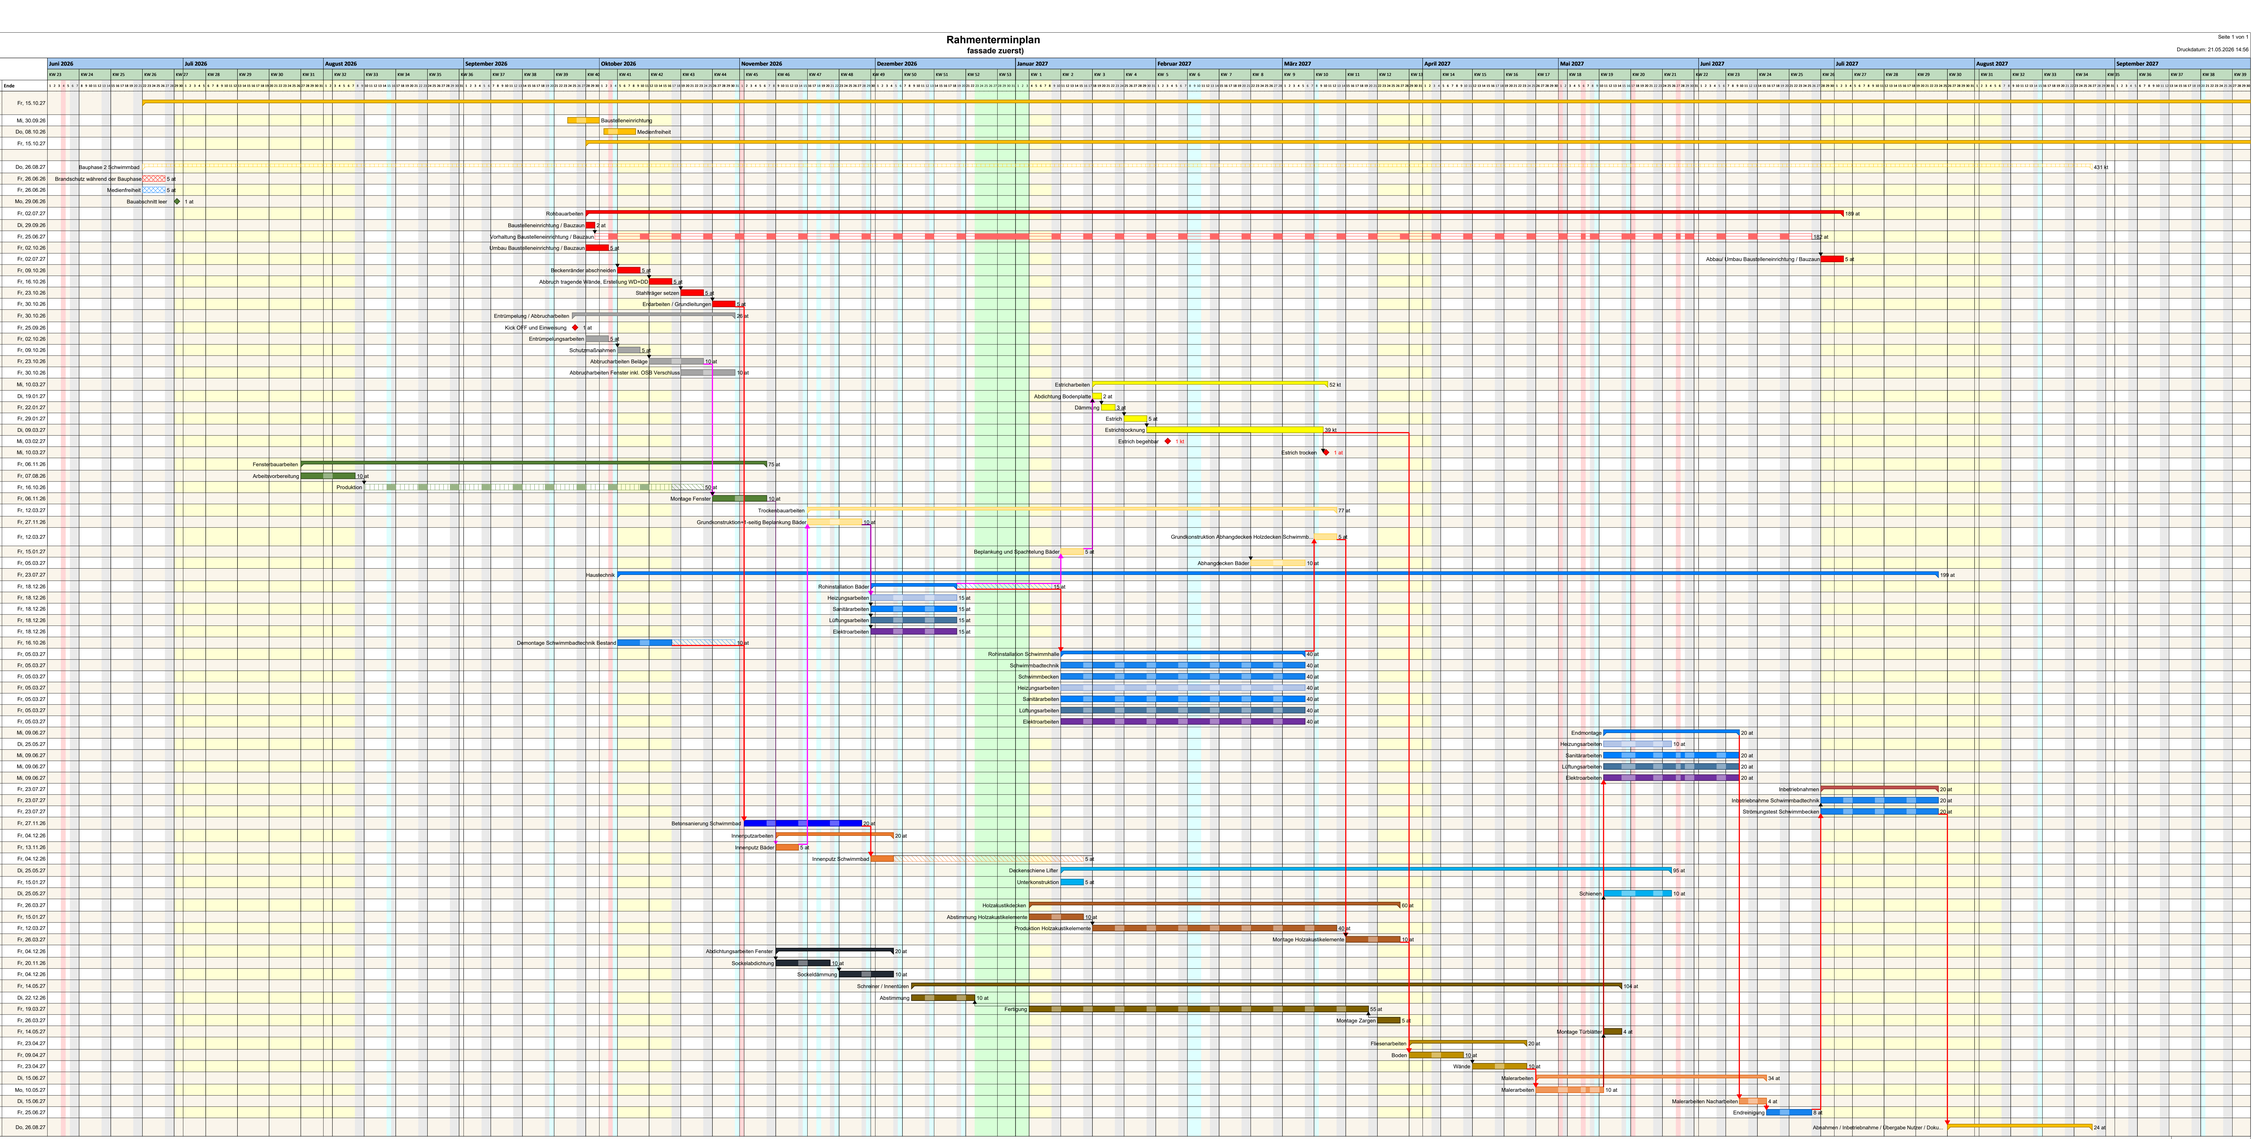

Projektzeitrahmen von Mo, 01.01.24 bis Mi, 30.08.28
Kalender: Rheinland-Pfalz (eingebettet)
Filter:

Karlstr. 21a
Karlsruhe
Tel. +49 721 9671700
Fax +49 721 9671799
e-Mail: info@pa-architekten.de
