Projektnummer:

Bauzeitenplan
GER-GS unverbindlicher Bauzeitenplan BA 6+8_20240820

Pos	Vorgang	Dauer	Start
1	BA 6+8 Süd	208kt	Mo, 02.02.2
1.1	Außen	136kt	Mo, 16.02.2
1.1.1	Gerüstarbeiten/ Treppentürme / Plattformen Außen / Innen	101kt	Mo, 23.03.2
1.1.2	Glasdach Umbau, Stahlbau	5at	Mo, 23.02.2
1.1.3	Wärmedämmung und Wartungbeläge DG	15at	Mo, 02.03.2
1.1.4	Dachdurchdringungen Zimmerer/ Spengler	8at	Mo, 23.02.2
1.1.5	Installationsausführungen im Dachbereich	40at	Do, 05.03.2
1.1.6	Sporthalle First, Binderverkleidung Mängelbeseitigung, Sporthalle Wasser final dicht	5at	Mo, 16.02.2
1.1.7	Firstabschluss Flachdach Schmetterlingsdach	10at	Mo, 16.02.2
1.1.8	Fassadenverkleidung HPL allg.	61kt	Mo, 16.02.2
1.1.8.1	Fassadenverkleidung HPL BA 6 Süd, Ost Nord	45at	Mo, 16.02.2
1.1.9	Flachdach Terrasse Ost	10at	Mo, 09.03.2
1.1.10	Blechverkleidung Terrassen- Zwischenwände	10at	Mo, 23.03.2
1.1.11	Spenglerarbeiten Terrassen	5at	Mo, 06.04.2
1.1.12	Lichtkuppeln Spengler	5at	Mo, 30.03.2
1.1.13	Blechverkleidung um Shedfenster Spengler	10at	Mo, 09.03.2
1.2	Obergeschoss- Ausbau	208kt	Mo, 02.02.2
1.2.1	UK Podest Physik	5at	Mo, 23.02.2
1.2.2	Holztüren zum Flur Z	10at	Mo, 30.03.2
1.2.3	Holzzargen inkl. Glasfelder	10at	Mo, 06.04.2
1.2.4	Stahlrahmentüren,-fenster	10at	Mo, 16.03.2
1.2.5	Stahlrahmenglastür Bestand drehen	10at	Mo, 30.03.2
1.2.6	Gewerk: Holzinnentüren: Elemente in AHD	3at	Mo, 23.02.2
1.2.7	Trockenbau Decke schließen	58tt	Mo, 02.02.2
1.2.8	Gewerk: Holzinnentüren: Innenfenster- Verdunklung	5at	Mo, 23.03.2
1.2.9	Bodenbelagarbeiten	25at	Mo, 18.05.2
1.2.10	Maler- und Lackierarbeiten (einschl. Spachteln)	86at	Mo, 13.04.2
1.2.11	Schlosserarbeiten Geländer, Handläufe	10at	Mo, 27.04.2
1.2.12	Fachklassenausstattung	45at	Mo, 08.06.2
1.2.13	Tischlerarbeiten (Einbaumöbel),	49at	Mo, 08.06.2
1.2.14	Hörsaalgestühl	5at	Mi, 29.07.26
1.2.15	Türblätter	10at	Mo, 08.06.2
1.2.16	Feininstallation	42at	Mo, 08.06.2
1.2.17	lose Möblierung	10at	Mo, 17.08.2
1.3	Erdgeschoss Ausbau	201kt	Mo, 09.02.2
1.3.1	Stahlrahmentüren,-fenster	10at	Mo, 16.03.2
1.3.2	Trockenbau Schließen Umkleiden/ Du / WCs	15at	Mo, 23.02.2
1.3.3	Estrichtrennschienen Umkleiden / Du/ WCs	5at	Mo, 09.03.2
1.3.4	Gefälleestrich, Abdichutng, Dämmung Duschen/ Umkleiden / WCs	10at	Mo, 09.03.2
1.3.5	Fußbodenheizung	10at	Mo, 23.03.2
1.3.6	Estrich+ Beschleuniger Umkleiden/ Du/ WCs,	8at	Di, 07.04.26
1.3.7	Aufheizen Estrich	15at	Mo, 20.04.2
1.3.8	Trockenbau Decken Schließen Umkleiden/ Du / WCs	15at	Mo, 20.04.2
1.3.9	Stahlzargen- Futterzargen Umkleiden / Du / WCs	5at	Mo, 18.05.2
1.3.10	Stahlzargen- Umkleiden / Du / WCs	4at	Mo, 15.06.2
1.3.11	Fliesen	36kt	Mo, 11.05.2
1.3.12	Maler Wände Spachteln Umkleiden+Flur	15at	Mo, 20.04.2
1.3.13	Maler- und Lackierarbeiten: Du/ WCs/ Umkleiden / Flur	40tt	Mo, 11.05.2
1.3.14	Bodenbelagarbeiten: Du/ WCs/ Umkleiden / Flur	15at	Mo, 22.06.2
1.3.15	Einbaumöbel: Umkleiden	5at	Mo, 13.07.2
1.3.16	Feininstallation: Du/ WCs/ Umkleiden	20at	Mo, 13.07.2
1.3.17	Türblätter: Du/ WCs/ Umkleiden / Flur	3at	Mo, 13.07.2
1.3.18	WC Trennwände	5at	Mo, 20.07.2
1.3.19	UK bzw. Estrichabstellen für Regie	5at	Mo, 23.02.2
1.3.20	Trittschall-Dämmung Galerie, Flur, Foyer	10at	Mo, 30.03.2
1.3.21	Estrich Umkleiden, Galerie, Flur, Foyer	10at	Mo, 06.04.2
1.3.22	Trockenbau Decken Tribüne, Foyer, Flur, etc.	15at	Mo, 16.03.2
1.3.23	Trockenbau Decken Umkleiden	15at	Mo, 20.04.2
1.3.24	Holzzargen inkl. Glasfelder	15at	Mo, 06.04.2
1.3.25	Trockenbau Decken Schließen LINS	15at	Mo, 09.02.2
1.3.26	Treppengeländer/ Rampe	33tt	Mo, 23.03.2
1.3.27	Holz- UK Rampe	10at	Mo, 30.03.2
1.3.28	Maler Wände Spachteln BA 6	15at	Mo, 06.04.2
1.3.29	Bodenbelagarbeiten Foyer, Tribüne	15at	Mo, 25.05.2
1.3.30	Bodenbelagarbeiten LINS	15at	Mo, 11.05.2
1.3.31	Sitzstufenanlagen BA 6	5at	Mo, 01.06.2
1.3.32	Geländer über Sitzstufen BA 6	10at	Mo, 08.06.2
1.3.33	Handläufe Geländer UG- EG	13at	Mo, 20.04.2
1.3.34	Galeriegeländer Sporthalle	47kt	Mo, 23.03.2
1.3.34.1	Halter Glasgeländer	5at	Mo, 23.03.2
1.3.34.2	Galeriegeländer Sporthalle UK	15at	Mo, 20.04.2
1.3.34.3	Geländer / Netz	15at	Mo, 20.04.2
1.3.35	Sitzstufenunterkonstruktion Sporthalle,	15at	Mo, 04.05.2
1.3.36	Maler- und Lackierarbeiten	129tt	Mo, 20.04.2
1.3.37	allg. Einbauten	50at	Mo, 01.06.2
1.3.38	Türblätter Süd	6at	Mo, 25.05.2
1.3.39	Feininstallation	50at	Mo, 01.06.2
1.3.40	lose Möblierung	10at	Mo, 17.08.2
1.4	Untergeschoss- Ausbau	184kt	Mo, 09.02.2
1.4.1	Estrichergänzungen UG	6at	Fr, 10.04.26
1.4.2	Stahlzargen	4at	Mo, 20.04.2
1.4.3	Trockenbauarbeiten Decken schließen	47kt	Mo, 06.04.2
1.4.4	Installationen im Bereich Trockenbaudecke mit UK	65at	Mo, 09.02.2
1.4.5	Treppengeländer	9at	Mo, 27.04.2
1.4.6	Schlosserarbeiten allg.	9at	Mo, 27.04.2
1.4.7	Oberbeläge	10at	Mo, 15.06.2
1.4.8	Boden- und Treppenanstriche	5at	Mo, 08.06.2
1.4.9	Maler- und Lackierarbeiten	25at	Mo, 11.05.2
1.4.10	Türblätter	5at	Mo, 25.05.2
1.4.11	Feininstallationen	20at	Mi, 15.07.26
2	BA 8 Nord= Sporthalle	1587kt	Mo, 02.05.2
2.1	Montage Dachaufbau,Randabschlüsse, etc.Teil 1 bis 3	14at	Mo, 24.11.2
2.2	Montage Dachaufbau, Randabschlüsse, etc Teil 4	13at	Mo, 24.11.2
2.3	Gerüstarbeiten/ Treppentürme / Plattformen Außen / Innen	208at	Do, 21.08.2
2.4	Installationen Dach außen	14at	Do, 02.10.2
2.5	Einbringöffnung Ost Stb Wand schließen	4at	Do, 26.03.2
2.6	Fassade Ost	5at	Mi, 01.04.26
2.7	Fassade Süd	20at	Mo, 16.02.2
2.8	Fassadenverkleidung	72at	Mo, 23.02.2
2.9	Trockenbauvorsatzschale OG Süd	10at	Di, 07.04.26
2.10	Installation Wände innen	229tt	Mo, 06.10.2
2.11	Spachtelarbeiten Betonbinder, Anputzarbeiten	10at	Mo, 20.04.2
2.12	Trockenbauwand UG	10at	Mo, 16.03.2
2.13	Schwingboden: Abdichtung +Dämmung, Unterbau	15at	Mo, 08.06.2
2.14	Fußbodenheizung	20at	Mo, 22.06.2
2.15	Schwingboden Fertigstellung ohne Belag, Schutzmaßnahmen	10at	Mo, 13.07.2
2.16	Montage Abluftkanäle Sporthalle Nord	20at	Mo, 30.03.26
2.17	Putzarbeiten über ABL Sporthalle Nord	15at	Mo, 13.04.26
2.18	Prallwand inkl. Tore, Fenster, Türen, UK Geräte, etc.	68tt	Mo, 30.03.2
2.19	Innendämmung in Verbundung mit Prallwand	5at	Mo, 09.03.2
2.20	Bodenbelagsarbeiten+ Schutzmaßnahmen+Linierung	40at	Mo, 29.06.2
2.21	Trennvorhänge	75at	Mo, 18.05.2
2.22	Malerarbeiten	33tt	Mo, 04.05.2
2.23	Sportgeräte Endinstalltion	5at	Mo, 27.07.2
2.24	Feininstallation	25at	Mo, 29.06.2
2.25	Feinreinigung	1587tt	Mo, 02.05.2
3	Fertigstellung- Inbetriebnahme BA 6+8	25at	Mo, 03.08.2
4	Beschilderung	10at	Mo, 20.07.2
5	Feuerlöscher	10at	Mo, 03.08.2
6	Schließanlage	15at	Do, 16.07.2
7	Abnahmen	551tt	Mo, 17.02.2
8	Mängelbeseitigung	558tt	Mo, 17.02.2
9	Vorlauf Schule/ Bezug	5at	Mo, 31.08.2
10	Einzugsleistungen Bauherr	5at	Mo, 31.08.2
11	Rückbau BE +Kran	169kt	Fr, 13.03.26
11.1	Kranabbau	2at	Fr, 13.03.26
11.2	Rückbau Baustelleneinrichtung	30at	Mo, 20.07.2
12	Außenanlagen	117tt	Mo, 08.06.2

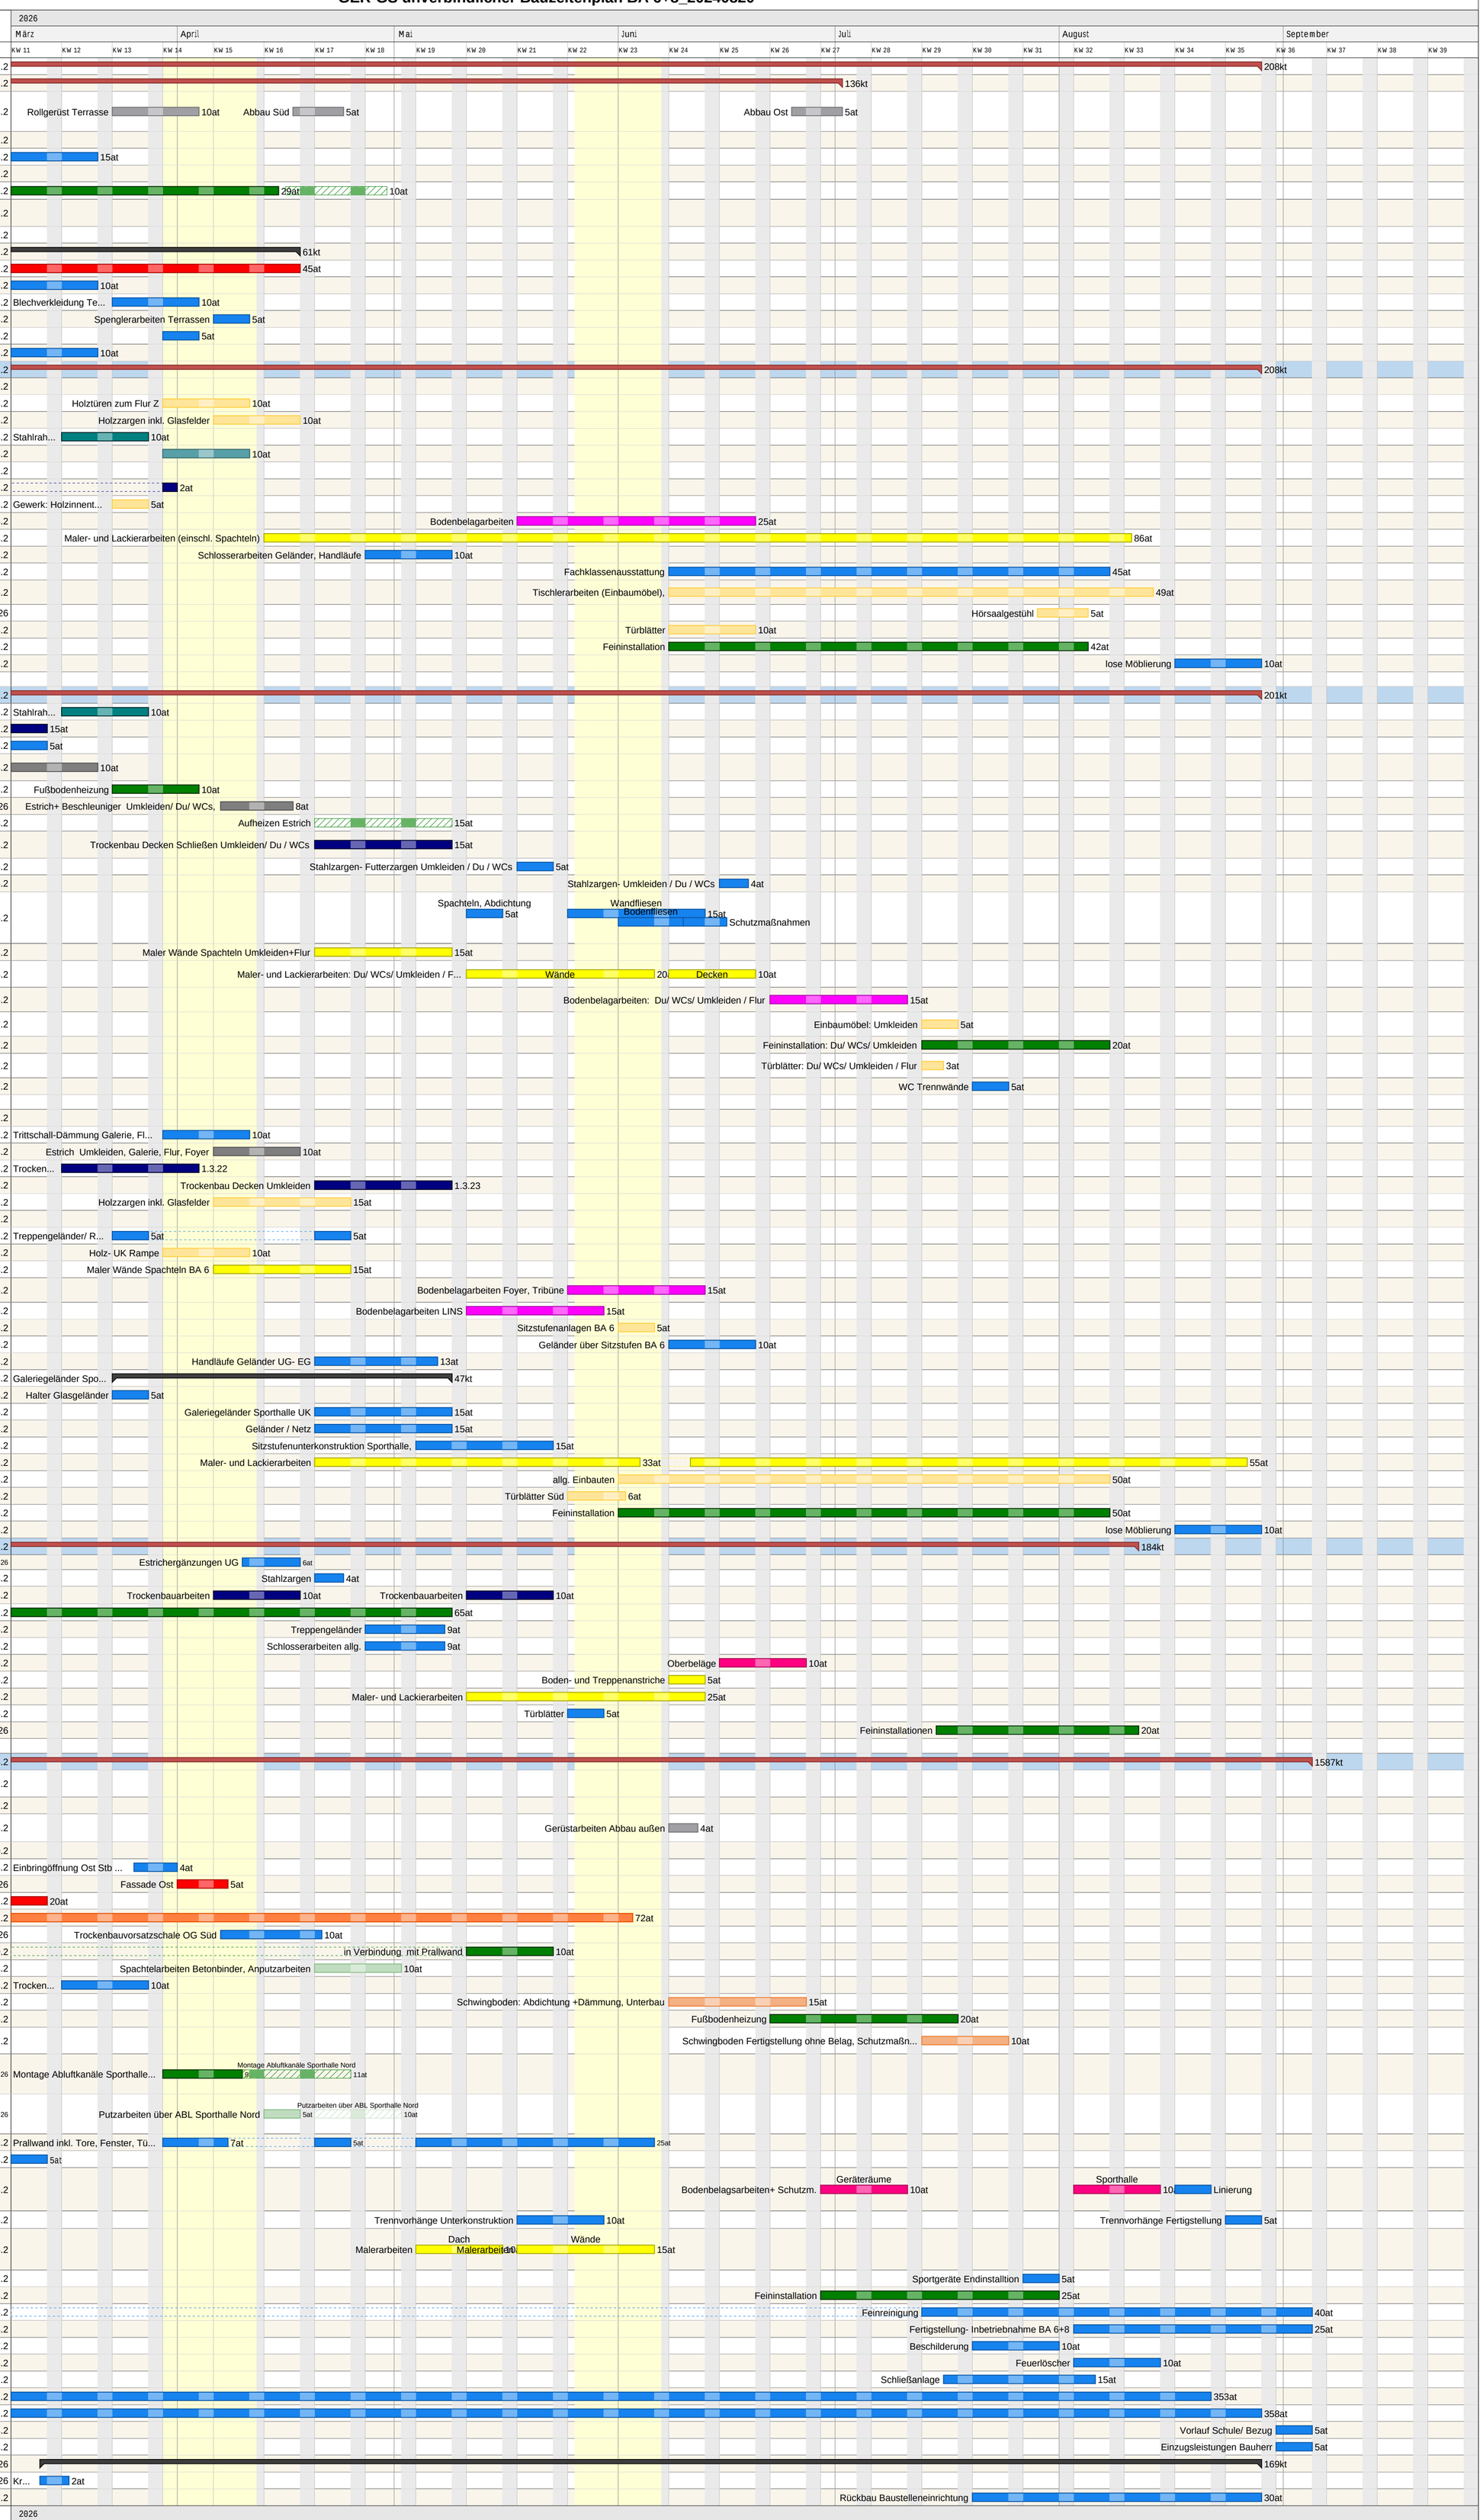

Projektzeitrahmen von So, 01.05.22 bis Mi, 28.10.26
Kalender: Bayern (eingebettet)
Druckdatum: 11.03.2026 14:27
Filter:
Bearbeiter:

D2KP Architekten BDA
Drescher-Kubina & Partner mbB
Römerstraße 14
80801 München
Tel. 089 - 340803-0
Fax 089 - 340803-33
e-Mail: architekten@d2kp.de
