**MIA – Haus für Kinder, Markt Indersdorf | Ausführungsterminplan**

Vorabzug 11.06.2026

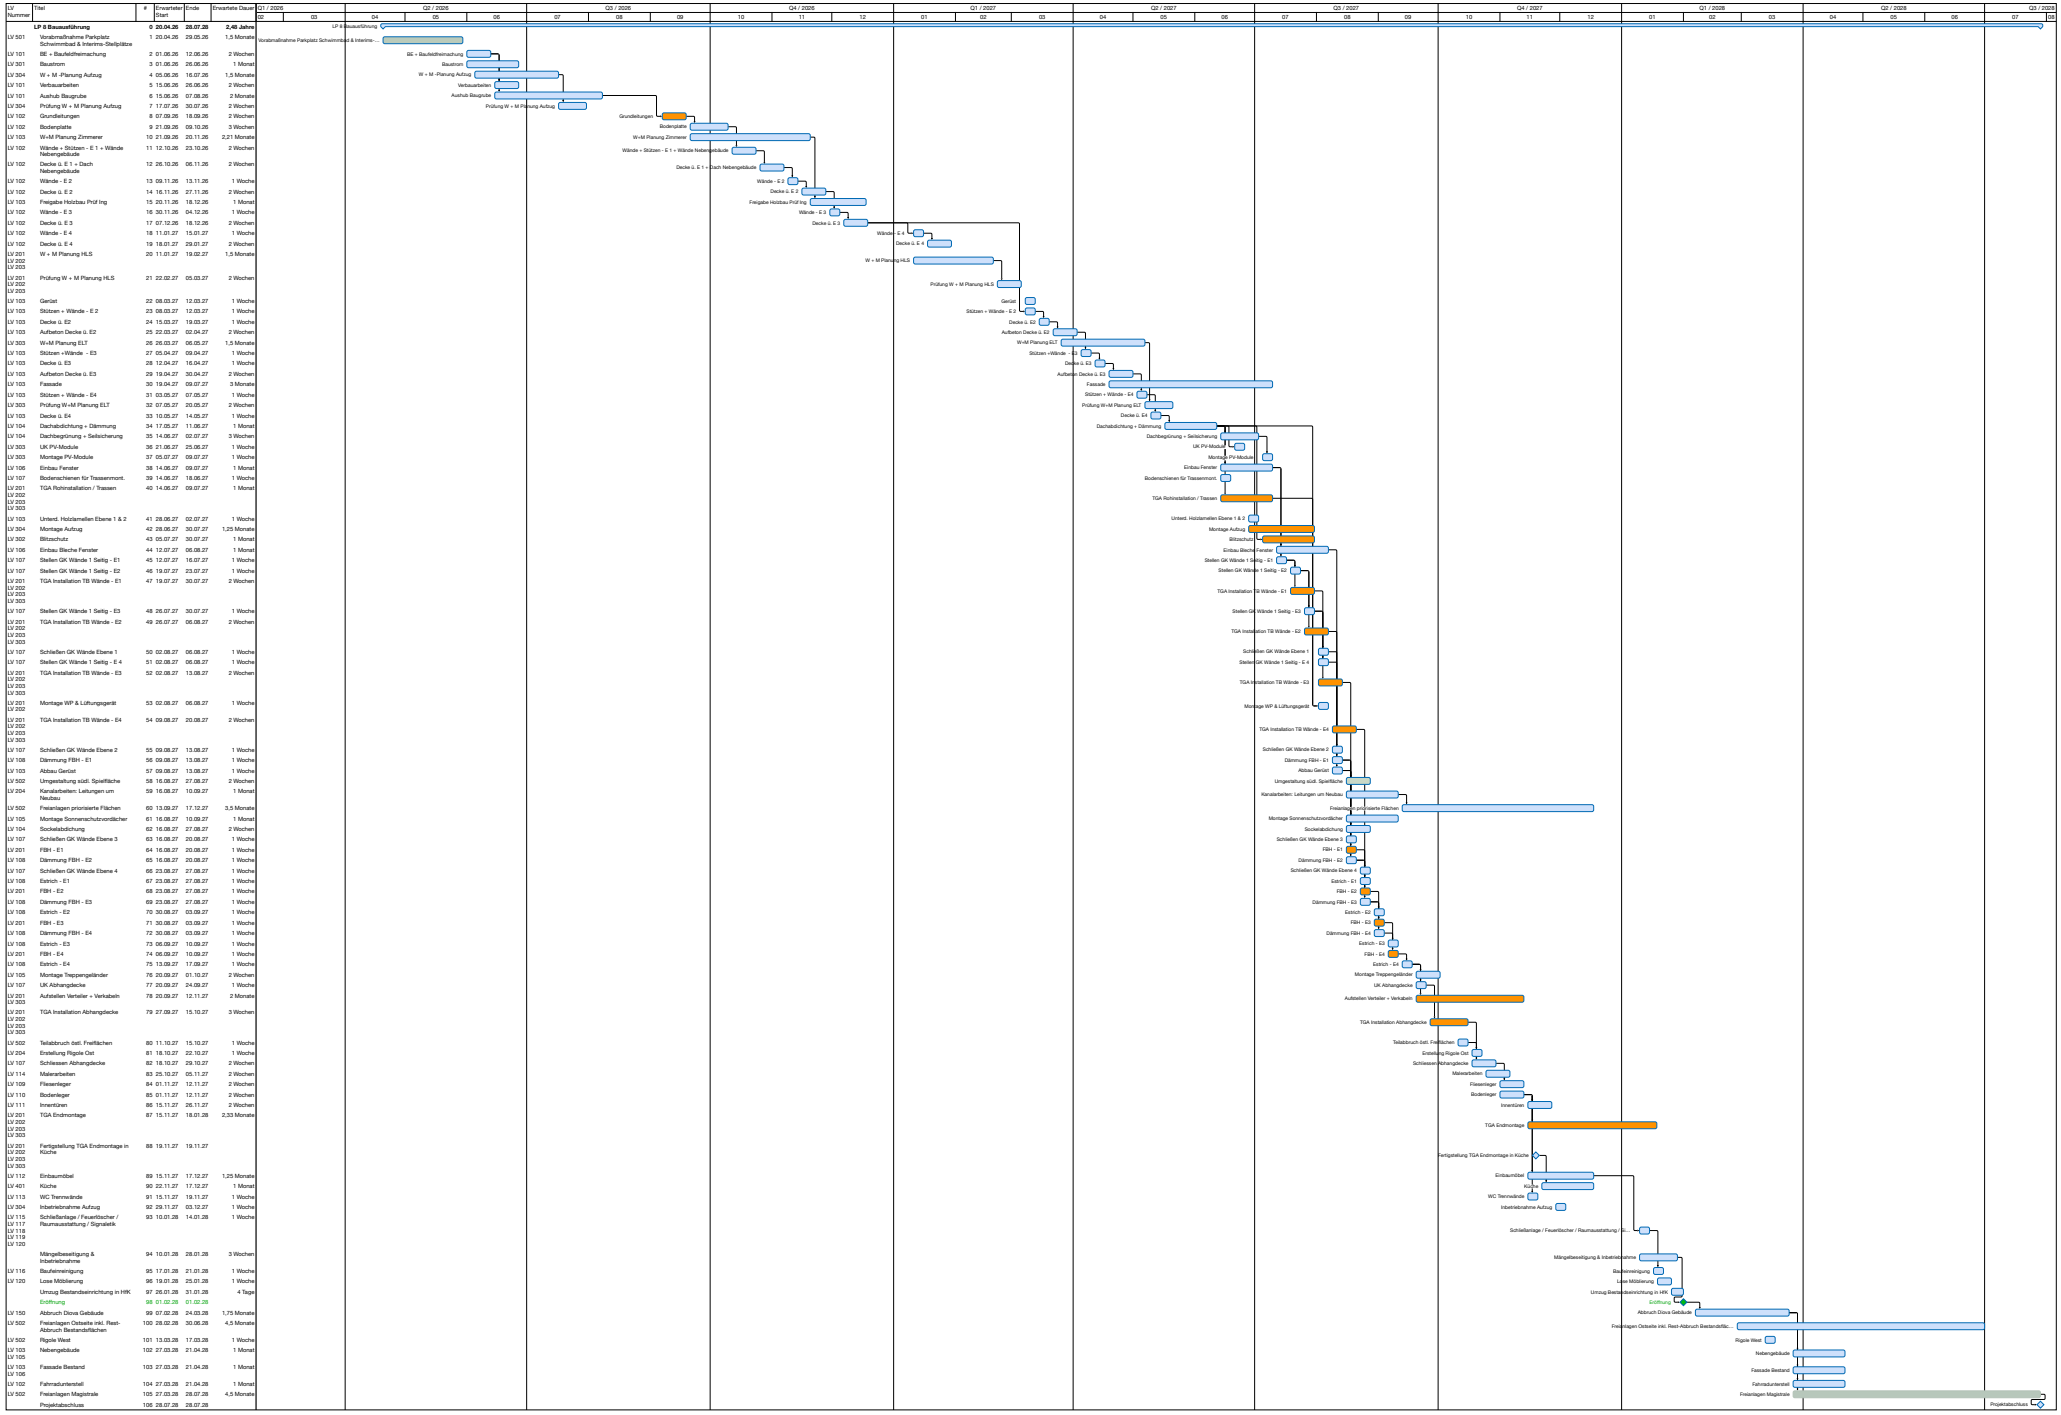


| LV Nummer | Titel | # | Erwarteter Start | Ende | Erwartete Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| | **LP 8 Bauausführung** | **0** | **20.04.26** | **28.07.28** | **2,48 Jahre** |
| LV 501 | Vorabnahme Parkplatz Schwimmbad & Interims-Stellplätze | 1 | 20.04.26 | 29.05.26 | 1,5 Monate |
| LV 101 | BE + Baufeldfreimachung | 2 | 01.06.26 | 12.06.26 | 2 Wochen |
| LV 301 | Baustrom | 3 | 01.06.26 | 26.06.26 | 1 Monat |
| LV 304 | W + M -Planung Aufzug | 4 | 05.06.26 | 16.07.26 | 1,5 Monate |
| LV 101 | Verbauarbeiten | 5 | 15.06.26 | 26.06.26 | 2 Wochen |
| LV 101 | Aushub Baugrube | 6 | 15.06.26 | 07.08.26 | 2 Monate |
| LV 304 | Prüfung W + M Planung Aufzug | 7 | 17.07.26 | 30.07.26 | 2 Wochen |
| LV 102 | Grundleitungen | 8 | 07.09.26 | 18.09.26 | 2 Wochen |
| LV 102 | Bodenplatte | 9 | 21.09.26 | 09.10.26 | 3 Wochen |
| LV 103 | W+M Planung Zimmerer | 10 | 21.09.26 | 20.11.26 | 2,21 Monate |
| LV 102 | Wände + Stützen - E 1 + Wände Nebengebäude | 11 | 12.10.26 | 23.10.26 | 2 Wochen |
| LV 102 | Decke ü. E 1 + Dach Nebengebäude | 12 | 26.10.26 | 06.11.26 | 2 Wochen |
| LV 102 | Wände - E 2 | 13 | 09.11.26 | 13.11.26 | 1 Woche |
| LV 102 | Decke ü. E 2 | 14 | 16.11.26 | 27.11.26 | 2 Wochen |
| LV 103 | Freigabe Holzbau Prüf Ing | 15 | 20.11.26 | 18.12.26 | 1 Monat |
| LV 102 | Wände - E 3 | 16 | 30.11.26 | 04.12.26 | 1 Woche |
| LV 102 | Decke ü. E 3 | 17 | 07.12.26 | 18.12.26 | 2 Wochen |
| LV 102 | Wände - E 4 | 18 | 11.01.27 | 15.01.27 | 1 Woche |
| LV 102 | Decke ü. E 4 | 19 | 18.01.27 | 29.01.27 | 2 Wochen |
| LV 201<br>LV 202<br>LV 203 | W + M Planung HLS | 20 | 11.01.27 | 19.02.27 | 1,5 Monate |
| LV 201<br>LV 202<br>LV 203 | Prüfung W + M Planung HLS | 21 | 22.02.27 | 05.03.27 | 2 Wochen |
| LV 103 | Gerüst | 22 | 08.03.27 | 12.03.27 | 1 Woche |
| LV 103 | Stützen + Wände - E 2 | 23 | 08.03.27 | 12.03.27 | 1 Woche |
| LV 103 | Decke ü. E2 | 24 | 15.03.27 | 19.03.27 | 1 Woche |
| LV 103 | Aufbeton Decke ü. E2 | 25 | 22.03.27 | 02.04.27 | 2 Wochen |
| LV 303 | W+M Planung EL7 | 26 | 26.03.27 | 06.05.27 | 1,5 Monate |
| LV 103 | Stützen +Wände - E3 | 27 | 05.04.27 | 09.04.27 | 1 Woche |
| LV 103 | Decke ü. E3 | 28 | 12.04.27 | 16.04.27 | 1 Woche |
| LV 103 | Aufbeton Decke ü. E3 | 29 | 19.04.27 | 30.04.27 | 2 Wochen |
| LV 103 | Fassade | 30 | 19.04.27 | 09.07.27 | 3 Monate |
| LV 103 | Stützen + Wände - E4 | 31 | 03.05.27 | 07.05.27 | 1 Woche |
| LV 303 | Prüfung W+M Planung EL7 | 32 | 07.05.27 | 20.05.27 | 2 Wochen |
| LV 103 | Decke ü. E4 | 33 | 10.05.27 | 14.05.27 | 1 Woche |
| LV 104 | Dachabdichtung + Dämmung | 34 | 17.05.27 | 11.06.27 | 1 Monat |
| LV 104 | Dachbegrünung + Seilsicherung | 35 | 14.06.27 | 02.07.27 | 3 Wochen |
| LV 303 | UK PV-Module | 36 | 21.06.27 | 25.06.27 | 1 Woche |
| LV 303 | Montage PV-Module | 37 | 05.07.27 | 09.07.27 | 1 Woche |
| LV 106 | Einbau Fenster | 38 | 14.06.27 | 09.07.27 | 1 Monat |
| LV 107 | Bodenschienen für Trasseremont. | 39 | 14.06.27 | 18.06.27 | 1 Woche |
| LV 201<br>LV 202<br>LV 203<br>LV 303 | TGA Rohinstallation / Trassen | 40 | 14.06.27 | 09.07.27 | 1 Monat |
| LV 103 | Unterd. Holzlamellen Ebene 1 & 2 | 41 | 28.06.27 | 02.07.27 | 1 Woche |
| LV 304 | Montage Aufzug | 42 | 28.06.27 | 30.07.27 | 1,25 Monate |
| LV 302 | Blitzschutz | 43 | 05.07.27 | 30.07.27 | 1 Monat |
| LV 106 | Einbau Bleche Fenster | 44 | 12.07.27 | 06.08.27 | 1 Monat |
| LV 107 | Stellen GK Wände 1 Seitig - E1 | 45 | 12.07.27 | 16.07.27 | 1 Woche |
| LV 107 | Stellen GK Wände 1 Seitig - E2 | 46 | 19.07.27 | 23.07.27 | 1 Woche |
| LV 201<br>LV 202<br>LV 203<br>LV 303 | TGA Installation TB Wände - E1 | 47 | 19.07.27 | 30.07.27 | 2 Wochen |
| LV 107 | Stellen GK Wände 1 Seitig - E3 | 48 | 26.07.27 | 30.07.27 | 1 Woche |
| LV 201<br>LV 202<br>LV 203<br>LV 303 | TGA Installation TB Wände - E2 | 49 | 26.07.27 | 06.08.27 | 2 Wochen |
| LV 107 | Schließen GK Wände Ebene 1 | 50 | 02.08.27 | 06.08.27 | 1 Woche |
| LV 107 | Stellen GK Wände 1 Seitig - E 4 | 51 | 02.08.27 | 06.08.27 | 1 Woche |
| LV 201<br>LV 202<br>LV 203<br>LV 303 | TGA Installation TB Wände - E3 | 52 | 02.08.27 | 13.08.27 | 2 Wochen |
| LV 201<br>LV 202 | Montage WP & Lüftungsgerät | 53 | 02.08.27 | 06.08.27 | 1 Woche |
| LV 201<br>LV 202<br>LV 203<br>LV 303 | TGA Installation TB Wände - E4 | 54 | 09.08.27 | 20.08.27 | 2 Wochen |
| LV 107 | Schließen GK Wände Ebene 2 | 55 | 09.08.27 | 13.08.27 | 1 Woche |
| LV 108 | Dämmung FBH - E1 | 56 | 09.08.27 | 13.08.27 | 1 Woche |
| LV 103 | Abbau Gerüst | 57 | 09.08.27 | 13.08.27 | 1 Woche |
| LV 502 | Umgestaltung südl. Spielfläche | 58 | 16.08.27 | 27.08.27 | 2 Wochen |
| LV 204 | Kanalarbeiten: Leitungen um Neubau | 59 | 16.08.27 | 10.09.27 | 1 Monat |
| LV 502 | Freianlagen priorisierte Flächen | 60 | 13.09.27 | 17.12.27 | 3,5 Monate |
| LV 105 | Montage Sonnenschutzvordächer | 61 | 16.08.27 | 10.09.27 | 1 Monat |
| LV 104 | Sockelabdichtung | 62 | 16.08.27 | 27.08.27 | 2 Wochen |
| LV 107 | Schließen GK Wände Ebene 3 | 63 | 16.08.27 | 20.08.27 | 1 Woche |
| LV 201 | FBH - E1 | 64 | 16.08.27 | 20.08.27 | 1 Woche |
| LV 108 | Dämmung FBH - E2 | 65 | 16.08.27 | 20.08.27 | 1 Woche |
| LV 107 | Schließen GK Wände Ebene 4 | 66 | 23.08.27 | 27.08.27 | 1 Woche |
| LV 108 | Estrich - E1 | 67 | 23.08.27 | 27.08.27 | 1 Woche |
| LV 201 | FBH - E2 | 68 | 23.08.27 | 27.08.27 | 1 Woche |
| LV 108 | Dämmung FBH - E3 | 69 | 23.08.27 | 27.08.27 | 1 Woche |
| LV 108 | Estrich - E2 | 70 | 30.08.27 | 03.09.27 | 1 Woche |
| LV 201 | FBH - E3 | 71 | 30.08.27 | 03.09.27 | 1 Woche |
| LV 108 | Dämmung FBH - E4 | 72 | 30.08.27 | 03.09.27 | 1 Woche |
| LV 108 | Estrich - E3 | 73 | 06.09.27 | 10.09.27 | 1 Woche |
| LV 201 | FBH - E4 | 74 | 06.09.27 | 10.09.27 | 1 Woche |
| LV 108 | Estrich - E4 | 75 | 13.09.27 | 17.09.27 | 1 Woche |
| LV 105 | Montage Treppengeländer | 76 | 20.09.27 | 01.10.27 | 2 Wochen |
| LV 107 | UK Abhangdecke | 77 | 20.09.27 | 24.09.27 | 1 Woche |
| LV 201<br>LV 303 | Aufstellen Verteiler + Verkabeln | 78 | 20.09.27 | 12.11.27 | 2 Monate |
| LV 201<br>LV 202<br>LV 203<br>LV 303 | TGA Installation Abhangdecke | 79 | 27.09.27 | 15.10.27 | 3 Wochen |
| LV 502 | Teilabbruch östl. Freiflächen | 80 | 11.10.27 | 15.10.27 | 1 Woche |
| LV 204 | Erstellung Rigole Ost | 81 | 18.10.27 | 22.10.27 | 1 Woche |
| LV 107 | Schliessen Abhangdecke | 82 | 18.10.27 | 29.10.27 | 2 Wochen |
| LV 114 | Malerarbeiten | 83 | 25.10.27 | 05.11.27 | 2 Wochen |
| LV 109 | Fliesenleger | 84 | 01.11.27 | 12.11.27 | 2 Wochen |
| LV 110 | Bodenleger | 85 | 01.11.27 | 12.11.27 | 2 Wochen |
| LV 111 | Innentüren | 86 | 15.11.27 | 26.11.27 | 2 Wochen |
| LV 201<br>LV 202<br>LV 203<br>LV 303 | TGA Endmontage | 87 | 15.11.27 | 18.01.28 | 2,33 Monate |
| LV 201<br>LV 202<br>LV 203<br>LV 303 | Fertigstellung TGA Endmontage in Küche | 88 | 19.11.27 | 19.11.27 | |
| LV 112 | Einbaumöbel | 89 | 15.11.27 | 17.12.27 | 1,25 Monate |
| LV 401 | Küche | 90 | 22.11.27 | 17.12.27 | 1 Monat |
| LV 113 | WC Trennwände | 91 | 15.11.27 | 19.11.27 | 1 Woche |
| LV 304 | Inbetriebnahme Aufzug | 92 | 29.11.27 | 03.12.27 | 1 Woche |
| LV 115<br>LV 117<br>LV 118<br>LV 119<br>LV 120 | Schließanlage / Feuerlöscher / Raumausstattung / Signalanl. | 93 | 10.01.28 | 14.01.28 | 1 Woche |
| | Mängelbeseitigung & Inbetriebnahme | 94 | 10.01.28 | 28.01.28 | 3 Wochen |
| LV 116 | Baufeinreinigung | 95 | 17.01.28 | 21.01.28 | 1 Woche |
| LV 120 | Lose Möblierung | 96 | 19.01.28 | 25.01.28 | 1 Woche |
| | Umzug Bestandseinrichtung in HfK | 97 | 26.01.28 | 31.01.28 | 4 Tage |
| | Eröffnung | 98 | 01.02.28 | 01.02.28 | |
| LV 150 | Abbruch Diova Gebäude | 99 | 07.02.28 | 24.03.28 | 1,75 Monate |
| LV 502 | Freianlagen Ostseite inkl. Rest-Abbruch Bestandsflächen | 100 | 28.02.28 | 30.06.28 | 4,5 Monate |
| LV 502 | Rigole West | 101 | 13.03.28 | 17.03.28 | 1 Woche |
| LV 103<br>LV 105 | Nebengebäude | 102 | 27.03.28 | 21.04.28 | 1 Monat |
| LV 103<br>LV 106 | Fassade Bestand | 103 | 27.03.28 | 21.04.28 | 1 Monat |
| LV 102 | Fahrradunterstell | 104 | 27.03.28 | 21.04.28 | 1 Monat |
| LV 502 | Freianlagen Magistrale | 105 | 27.03.28 | 28.07.28 | 4,5 Monate |
| | Projektabschluss | 106 | 28.07.28 | 28.07.28 | |
