Neubau von 13 Carports mit PV-Anlage
und eines Technikgebäudes für die P+R Anlage
in der Ziegeleistraße
85238 Petershausen

Terminplan

Nr.	Vorgangsname	Firma	Dauer	Anfang	Ende
1	Auftragsvergabe	KU-Petershausen	1 Tag	Fre 02.10.26	Fre 02.10.26
2	allgemeine Baustelleneinrichtung	BE-Firma	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
3	vorbereitende Maßnahmen Tiefbau	Tiefbau	40 Tage	Mon 05.10.26	Fre 27.11.26
4					
5	**Spezialtiefbau**		**75 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Fre 05.02.27**
6	Vorlauf für Planung - Materialbeschaffung	Spezialtiefbau	40 Tage	Mon 05.10.26	Fre 27.11.26
7	Bauabschnitt 1 Carport 10, 12, 13	Spezialtiefbau	10 Tage	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26
8	Bauabschnitt 2 Carport 6, 8	Spezialtiefbau	5 Tage	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26
9	Bauabschnitt 3 Carport 2; 4	Spezialtiefbau	5 Tage	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27
10	Bauabschnitt 4 Carport 9, 11	Spezialtiefbau	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27
11	Bauabschnitt 5 Carport 5, 7	Spezialtiefbau	5 Tage	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27
12	Bauabschnitt 6 Carport 1, 3	Spezialtiefbau	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27
13					
14	**Stahlbauer**		**150 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Fre 21.05.27**
15	Vorlauf für Planung - Materialbeschaffung	Stahlbauer	55 Tage	Mon 05.10.26	Fre 18.12.26
16	Bauabschnitt 2-6 Carport 10, 12, 13	Stahlbauer	20 Tage	Mon 11.01.27	Fre 05.02.27
17	Bauabschnitt 7 Carport 6, 8	Stahlbauer	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27
18	Bauabschnitt 8 Carport 2, 4	Stahlbauer	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27
19	Bauabschnitt 9 Carport 9, 11	Stahlbauer	15 Tage	Mon 22.03.27	Fre 09.04.27
20	Bauabschnitt 10 Carport 5,7	Stahlbauer	15 Tage	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27
21	Bauabschnitt 11 Carport 1,3	Stahlbauer	15 Tage	Mon 03.05.27	Fre 21.05.27
37					
38	**PV-Anlagenbauer**		**165 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Fre 11.06.27**
39	Vorlauf für Planung - Materialbeschaffung	PV-Anlage	75 Tage	Mon 05.10.26	Fre 05.02.27
40	Bauabschnitt 7 Carport 10, 12, 13	PV-Anlage	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27
41	Bauabschnitt 8 Carport 6, 8	PV-Anlage	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27
42	Technikgebäude herstellen	Elektro	30 Tage	Mon 01.03.27	Fre 09.04.27
43	Schaltanlage liefern + aufstellen	Elektro	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27
44	Bauabschnitt 9 Carport 2, 4	PV-Anlage	15 Tage	Mon 22.03.27	Fre 09.04.27
45	Bauabschnitt 10 Carport 9, 11	PV-Anlage	15 Tage	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27
46	Bauabschnitt 11 Carport 5,7	PV-Anlage	15 Tage	Mon 03.05.27	Fre 21.05.27
47	Bauabschnitt 12 Carport 1,3	PV-Anlage	15 Tage	Mon 24.05.27	Fre 11.06.27

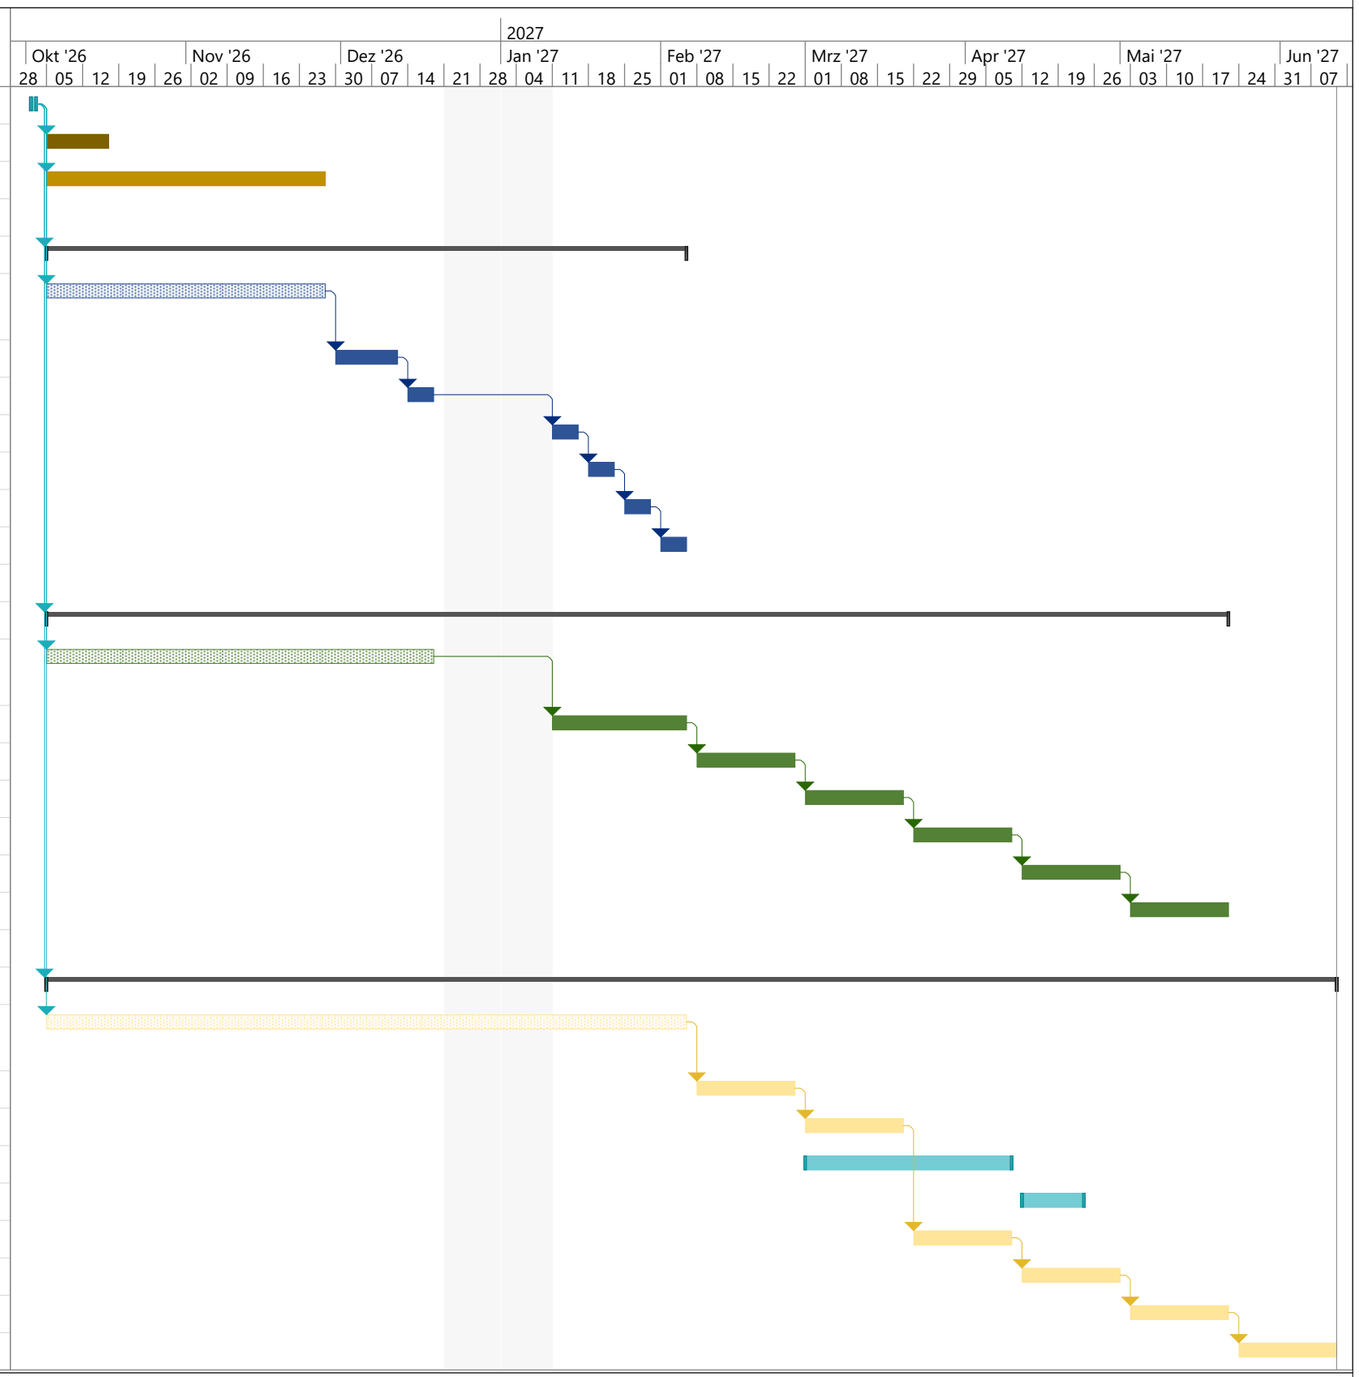

24.07.2026
