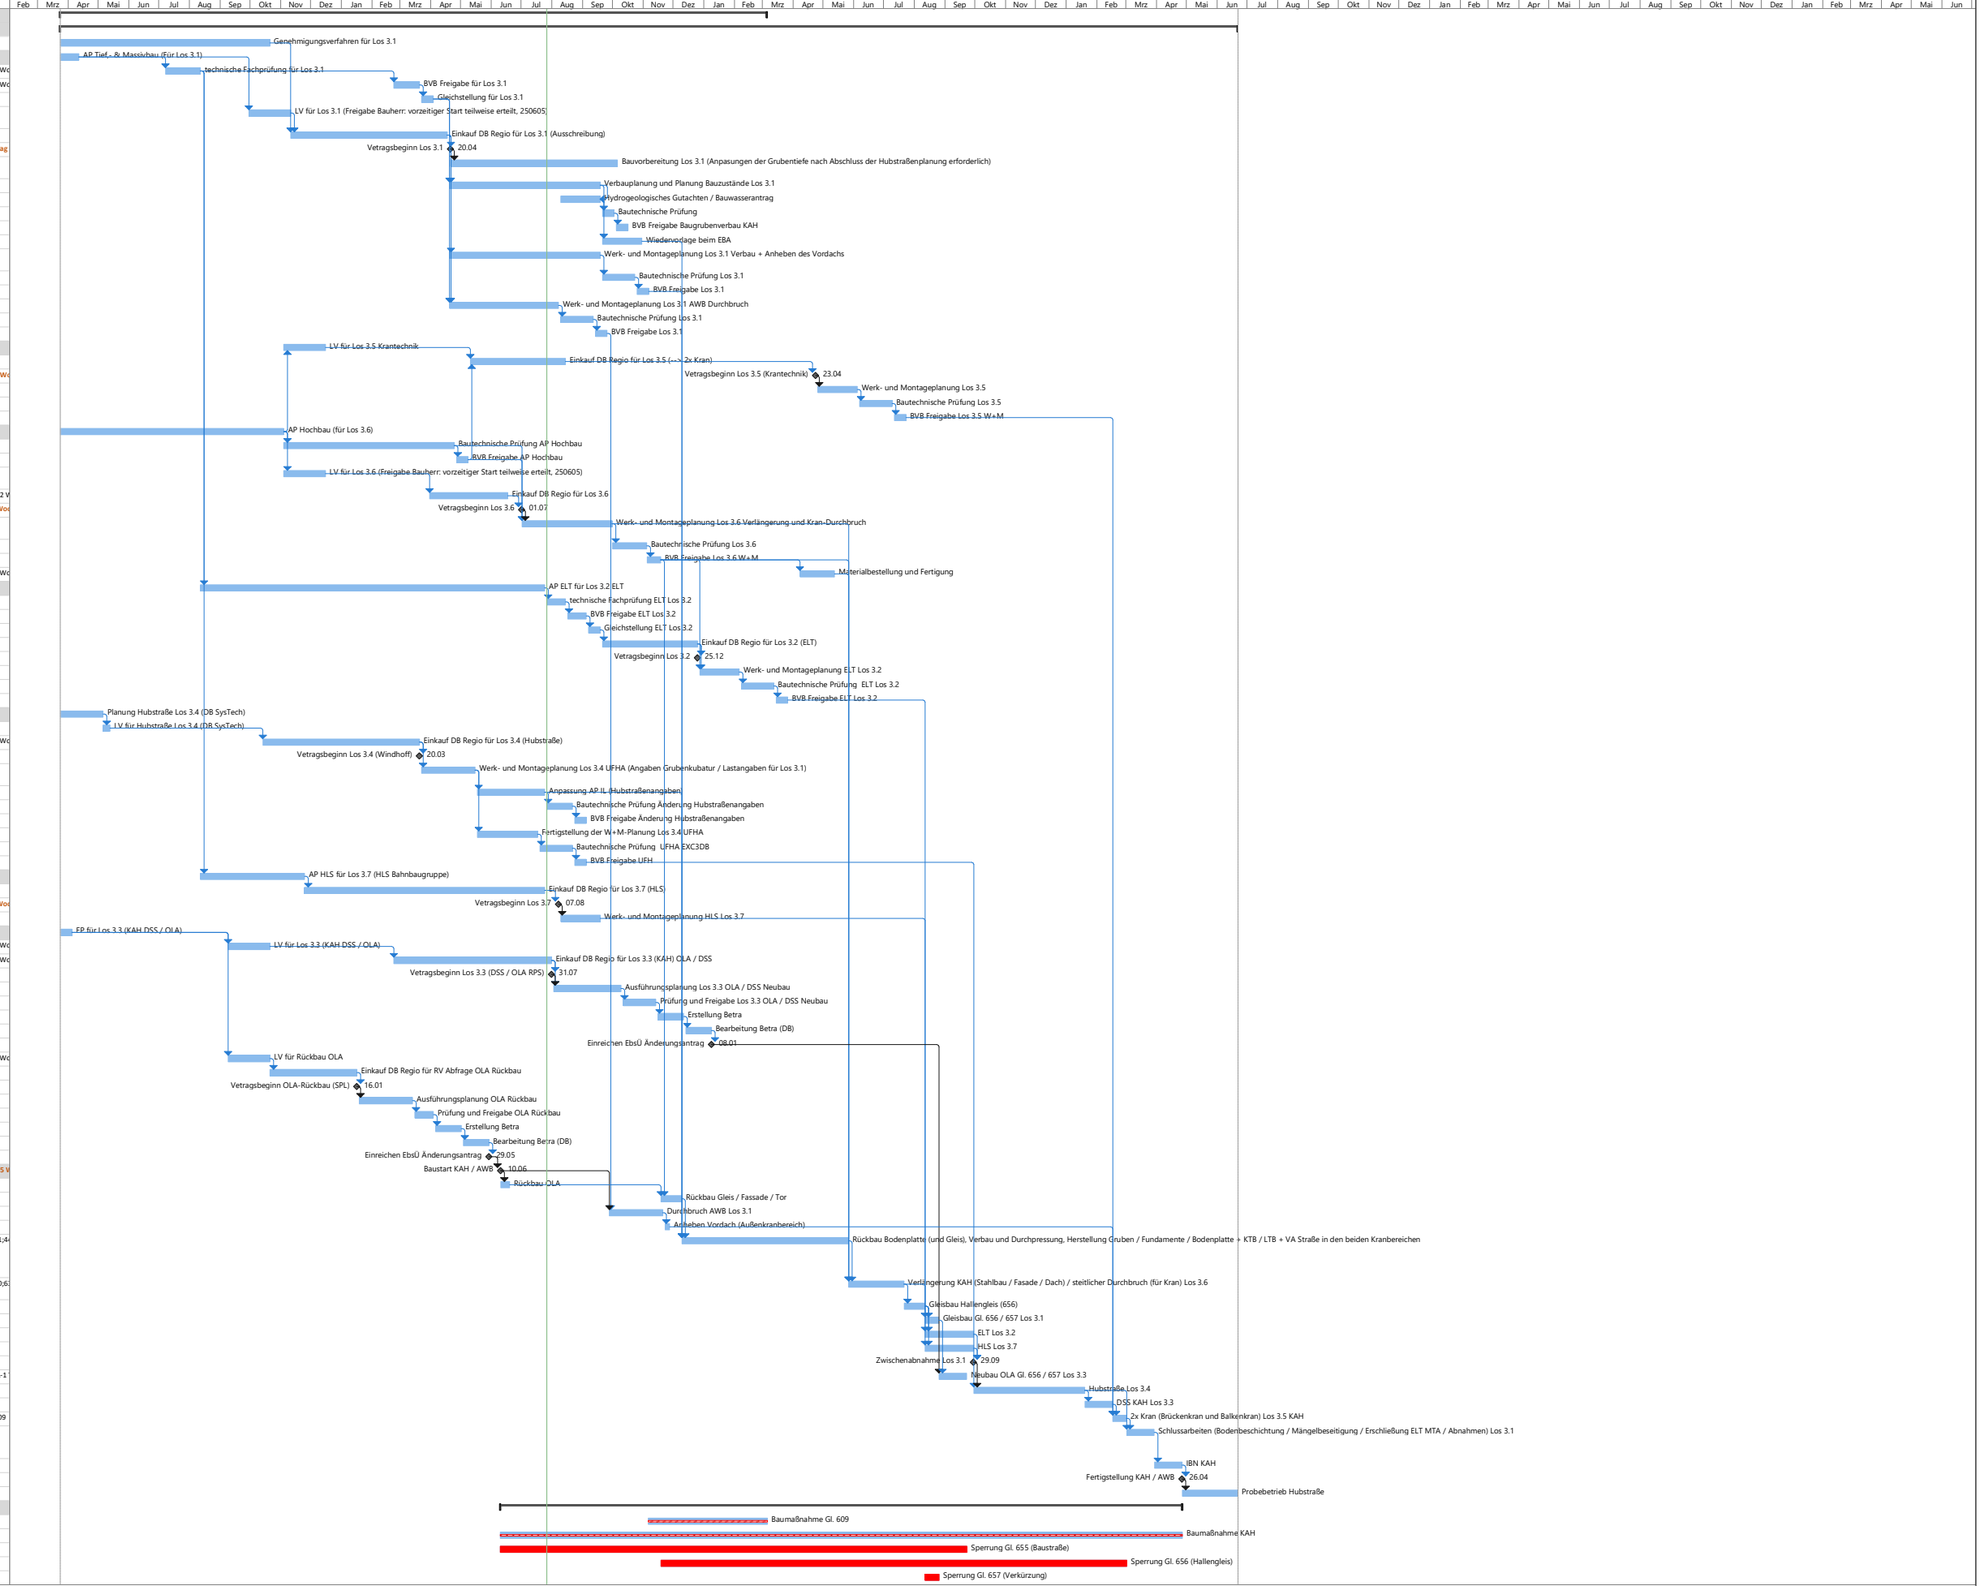Nr.	Vorg.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		**HH Gleis / DAB 609 (Los 2)**	**101 Wochen**	**Mon 24.03.25**	**Fre 05.03.27**	
27		**KAH / AWB Halle**	**168,6 Wochen**	**Mon 24.03.25**	**Mit 21.06.28**	
28		Genehmigungsverfahren für Los 3.1	30 Wochen	Mon 24.03.25	Mon 20.10.25	
29		AP Tief,- & Massivbau (Für Los 3.1)	3 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 11.04.25	
30		technische Fachprüfung für Los 3.1	5 Wochen	Die 08.07.25	Mon 11.08.25	29EA+12 Wo
31		BVB Freigabe für Los 3.1	4 Wochen	Mon 23.02.26	Fre 20.03.26	30EA+27 Wo
32		Gleichstellung für Los 3.1	2 Wochen	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26	31
33		LV für Los 3.1 (Freigabe Bauherr: vorzeitiger Start teilweise erteilt, 250605)	6 Wochen	Die 30.09.25	Mon 10.11.25	29EA+24 Wochen
34		Einkauf DB Regio für Los 3.1 (Ausschreibung)	22 Wochen	Die 11.11.25	Fre 17.04.26	33;28
35		Vetragsbeginn Los 3.1	0 Wochen	Mon 20.04.26	Mon 20.04.26	34EA+1 Tag
36		Bauvorbereitung Los 3.1 (Anpasungen der Grubentiefe nach Abschluss der Hubstraßenplanung erforderlich)	24 Wochen	Die 21.04.26	Mon 05.10.26	35
37		Verbauplanung und Planung Bauzuständе Los 3.1	22 Wochen	Mon 20.04.26	Fre 18.09.26	32;34
38		Hydrogeologisches Gutachten / Bauwasserantrag	6 Wochen	Mon 10.08.26	Fre 18.09.26	37EE
39		Bautechnische Prüfung	2 Wochen	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26	37
40		BVB Freigabe Baugrubenverbau KAH	2 Wochen	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26	39
41		Wiedervorlage beim EBA	6 Wochen	Mon 21.09.26	Fre 30.10.26	38
42		Werk- und Montageplanung Los 3.1 Verbau + Anheben des Vordachs	22 Wochen	Mon 20.04.26	Fre 18.09.26	34
43		Bautechnische Prüfung Los 3.1	5 Wochen	Mon 21.09.26	Fre 23.10.26	42
44		BVB Freigabe Los 3.1	2 Wochen	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26	43
45		Werk- und Montageplanung Los 3.1 AWB Durchbruch	16 Wochen	Mon 20.04.26	Fre 07.08.26	32;34
46		Bautechnische Prüfung Los 3.1	5 Wochen	Mon 10.08.26	Fre 11.09.26	45
47		BVB Freigabe Los 3.1	2 Wochen	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	46
48		LV für Los 3.5 Krantechnik	6 Wochen	Die 04.11.25	Mon 15.12.25	54
49		Einkauf DB Regio für Los 3.5 (--> 2x Kran)	14 Wochen	Mon 11.05.26	Fre 14.08.26	56;48
50		Vetragsbeginn Los 3.5 (Krantechnik)	0 Wochen	Fre 23.04.27	Fre 23.04.27	49EA+36 Wo
51		Werk- und Montageplanung Los 3.5	6 Wochen	Mon 26.04.27	Fre 04.06.27	50
52		Bautechnische Prüfung Los 3.5	5 Wochen	Mon 07.06.27	Fre 09.07.27	51
53		BVB Freigabe Los 3.5 W+M	2 Wochen	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27	52
54		AP Hochbau (für Los 3.6)	32 Wochen	Mon 24.03.25	Mon 03.11.25	
55		Bautechnische Prüfung AP Hochbau	24 Wochen	Die 04.11.25	Fre 24.04.26	54
56		BVB Freigabe AP Hochbau	2 Wochen	Mon 27.04.26	Fre 08.05.26	55
57		LV für Los 3.6 (Freigabe Bauherr: vorzeitiger Start teilweise erteilt, 250605)	6 Wochen	Die 04.11.25	Mon 15.12.25	54
58		Einkauf DB Regio für Los 3.6	11,4 Wochen	Die 31.03.26	Mit 17.06.26	57EA+14,2 W
59		Vetragsbeginn Los 3.6	0 Wochen	Mit 01.07.26	Mit 01.07.26	58EA+2 Woc
60		Werk- und Montageplanung Los 3.6 Verlängerung und Kran-Durchbruch	13 Wochen	Don 02.07.26	Mit 30.09.26	59;55;56
61		Bautechnische Prüfung Los 3.6	5 Wochen	Don 01.10.26	Mit 04.11.26	60
62		BVB Freigabe Los 3.6 W+M	2 Wochen	Don 05.11.26	Mit 18.11.26	61
63		Materialbestellung und Fertigung	5 Wochen	Don 08.04.27	Mit 12.05.27	62EA+20 Wo
64		AP ELT für Los 3.2 ELT	49 Wochen	Die 12.08.25	Fre 24.07.26	30
65		technische Fachprüfung ELT Los 3.2	3 Wochen	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26	64
66		BVB Freigabe ELT Los 3.2	3 Wochen	Mon 17.08.26	Fre 04.09.26	65
67		Gleichstellung ELT Los 3.2	2 Wochen	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26	66
68		Einkauf DB Regio für Los 3.2 (ELT)	14 Wochen	Mon 21.09.26	Fre 25.12.26	67
69		Vetragsbeginn Los 3.2	0 Wochen	Fre 25.12.26	Fre 25.12.26	68
70		Werk- und Montageplanung ELT Los 3.2	6 Wochen	Mon 28.12.26	Fre 05.02.27	62;68
71		Bautechnische Prüfung ELT Los 3.2	5 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 12.03.27	70
72		BVB Freigabe ELT Los 3.2	2 Wochen	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27	71
73		Planung Hubstraße Los 3.4 (DB SysTech)	6 Wochen	Mon 24.03.25	Mon 05.05.25	
74		LV für Hubstraße Los 3.4 (DB SysTech)	1 Woche	Die 06.05.25	Mon 12.05.25	73
75		Einkauf DB Regio für Los 3.4 (Hubstraße)	22 Wochen	Die 14.10.25	Fre 20.03.26	74EA+22 Wo
76		Vetragsbeginn Los 3.4 (Windhoff)	0 Wochen	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26	75
77		Werk- und Montageplanung Los 3.4 UFHA (Angaben Grubenkubatur / Lastangaben für Los 3.1)	8 Wochen	Mon 23.03.26	Fre 15.05.26	75
78		Anpassung AP IL (Hubstraßenangaben)	10 Wochen	Mon 18.05.26	Fre 24.07.26	77
79		Bautechnische Prüfung Änderung Hubstraßenangaben	4 Wochen	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26	78
80		BVB Freigabe Änderung Hubstraßenangaben	2 Wochen	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26	79
81		Fertigstellung der W+M-Planung Los 3.4 UFHA	9 Wochen	Mon 18.05.26	Fre 17.07.26	77
82		Bautechnische Prüfung UFHA EXC3DB	5 Wochen	Mon 20.07.26	Fre 21.08.26	81
83		BVB Freigabe UFH	2 Wochen	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26	82
84		AP HLS für Los 3.7 (HLS Bahnbaugruppe)	15 Wochen	Die 12.08.25	Mon 24.11.25	30
85		Einkauf DB Regio für Los 3.7 (HLS)	34 Wochen	Die 25.11.25	Fre 24.07.26	84
86		Vetragsbeginn Los 3.7	0 Wochen	Fre 07.08.26	Fre 07.08.26	85EA+2 Wo
87		Werk- und Montageplanung HLS Los 3.7	6 Wochen	Mon 10.08.26	Fre 18.09.26	86
88		EP für Los 3.3 (KAH DSS / OLA)	2 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25	
89		LV für Los 3.3 (KAH DSS / OLA)	6 Wochen	Die 09.09.25	Mon 20.10.25	88EA+22 Wo
90		Einkauf DB Regio für Los 3.3 (KAH) OLA / DSS	23 Wochen	Mon 23.02.26	Fre 31.07.26	89EA+17 Wo
91		Vetragsbeginn Los 3.3 (DSS / OLA RPS)	0 Wochen	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26	90
92		Ausführungsplanung Los 3.3 OLA / DSS Neubau	10 Wochen	Mon 03.08.26	Fre 09.10.26	90;91
93		Prüfung und Freigabe Los 3.3 OLA / DSS Neubau	5 Wochen	Mon 12.10.26	Fre 13.11.26	92
94		Erstellung Betra	4 Wochen	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26	93
95		Bearbeitung Betra (DB)	4 Wochen	Mon 14.12.26	Fre 08.01.27	94
96		Einreichen EbsÜ Änderungsantrag	0 Wochen	Fre 08.01.27	Fre 08.01.27	95
97		LV für Rückbau OLA	6 Wochen	Die 09.09.25	Mon 20.10.25	88EA+22 Wo
98		Einkauf DB Regio für RV Abfrage OLA Rückbau	12 Wochen	Die 21.10.25	Fre 16.01.26	97
99		Vetragsbeginn OLA-Rückbau (SPL)	0 Wochen	Fre 16.01.26	Fre 16.01.26	98
100		Ausführungsplanung OLA Rückbau	8 Wochen	Mon 19.01.26	Fre 13.03.26	99
101		Prüfung und Freigabe OLA Rückbau	3 Wochen	Mon 16.03.26	Fre 03.04.26	100
102		Erstellung Betra	4 Wochen	Mon 06.04.26	Fre 01.05.26	101
103		Bearbeitung Betra (DB)	4 Wochen	Mon 04.05.26	Fre 29.05.26	102
104		Einreichen EbsÜ Änderungsantrag	0 Wochen	Fre 29.05.26	Fre 29.05.26	103
105		Baustart KAH / AWB	0 Wochen	Mit 10.06.26	Mit 10.06.26	104EA+1,5 W
106		Rückbau OLA	7 Tage	Mit 10.06.26	Fre 19.06.26	105
107		Rückbau Gleis / Fassade / Tor	3 Wochen	Don 19.11.26	Mit 09.12.26	106;62
108		Durchbruch AWB Los 3.1	8 Wochen	Mon 28.09.26	Fre 20.11.26	105;47
109		Anheben Vordach (Außenkranbereich)	1 Woche	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	108
110		Rückbau Bodenplatte (und Gleis), Verbau und Durchpressung, Herstellung Gruben / Fundamente / Bodenplatte + KTB / LTB + VA Straße in den beiden Kranbereichen	24 Wochen	Don 10.12.26	Mit 26.05.27	78;107;41;4
111		Verlängerung KAH (Stahlbau / Fasade / Dach) / steitlicher Durchbruch (für Kran) Los 3.6	8 Wochen	Don 27.05.27	Mit 21.07.27	110;62;60;6
112		Gleisbau Hallengleis (656)	3 Wochen	Don 22.07.27	Mit 11.08.27	111
113		Gleisbau Gl. 656 / 657 Los 3.1	2 Wochen	Don 12.08.27	Mit 25.08.27	111;112
114		ELT Los 3.2	7 Wochen	Don 12.08.27	Mit 29.09.27	112;72
115		HLS Los 3.7	7 Wochen	Don 12.08.27	Mit 29.09.27	112;87
116		Zwischenabnahme Los 3.1	0 Wochen	Mit 29.09.27	Mit 29.09.27	115;114
117		Neubau OLA Gl. 656 / 657 Los 3.3	4 Wochen	Don 26.08.27	Mit 22.09.27	113;96EA-1
118		Hubstraße Los 3.4	16 Wochen	Don 30.09.27	Mit 19.01.28	116;83
119		DSS KAH Los 3.3	4 Wochen	Don 20.01.28	Mit 16.02.28	118
120		2x Kran (Brückenkran und Balkenkran) Los 3.5 KAH	2 Wochen	Don 17.02.28	Mit 01.03.28	119;53;109
121		Schlussarbeiten (Bodenbeschichtung / Mängelbeseitigung / Erschließung ELT MTA / Abnahmen) Los 3.1	4 Wochen	Don 02.03.28	Mit 29.03.28	120;118
122		IBN KAH	4 Wochen	Don 30.03.28	Mit 26.04.28	121
123		Fertigstellung KAH / AWB	0 Wochen	Mit 26.04.28	Mit 26.04.28	122
124		Probebetrieb Hubstraße	8 Wochen	Don 27.04.28	Mit 21.06.28	123
125		**Sperrzeiten / Leistungsunterbrechungen**	**98,2 Wochen?**	**Mit 10.06.26**	**Mit 26.04.28**	
126		Baumaßnahme Gl. 609	17,2 Wochen?	Fre 06.11.26	Fre 05.03.27	
127		Baumaßnahme KAH	98,2 Wochen?	Mit 10.06.26	Mit 26.04.28	
128		Sperrung Gl. 655 (Baustraße)	67,2 Wochen?	Mit 10.06.26	Mit 22.09.27	
129		Sperrung Gl. 656 (Hallengleis)	67 Wochen?	Don 19.11.26	Mit 01.03.28	
130		Sperrung Gl. 657 (Verkürzung)	2 Wochen?	Don 12.08.27	Mit 25.08.27
