Erneuerung Sonnenschutz FvS-Haus

Nr.	Vorgan	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	Ressourcennamen
1		**Planung, Vergabe, Werkplanung**	**98 Tage**	**Mi 05.11.25**	**Fr 10.04.26**		
2		Übergabe Ausführungsunterlagen	0 Tage	Mi 05.11.25	Mi 05.11.25		BLB
3		Angebotsbeiziehung, Beauftragung	38 Tage	Mi 05.11.25	Fr 16.01.26	2	BLB
4		Aufmaß	5 Tage	Mo 19.01.26	Fr 23.01.26	3	AN Sonnenschutz
5		Werkplanung	15 Tage	Mo 26.01.26	Fr 13.02.26	4	AN Sonnenschutz
6		Produktion Sonnenschutz	40 Tage	Mo 16.02.26	Fr 10.04.26	5	AN Sonnenschutz
7							
8		**Ausführung**	**85 Tage**	**Mo 12.01.26**	**Fr 08.05.26**		
9		Prüfungstermine, keine Bautätigkeiten zulässig	55 Tage	Mo 26.01.26	Fr 10.04.26		
10		Aufbau Gerüstbau	5 Tage	Mo 12.01.26	Mo 19.01.26	4AE	AN Gerüst
11		Erneuerung Sonnenschutz	15 Tage	Mo 13.04.26	Fr 01.05.26	6	AN Sonnenschutz
12		Abbau Gerüst	5 Tage	Mo 04.05.26	Fr 08.05.26	11	AN Gerüst

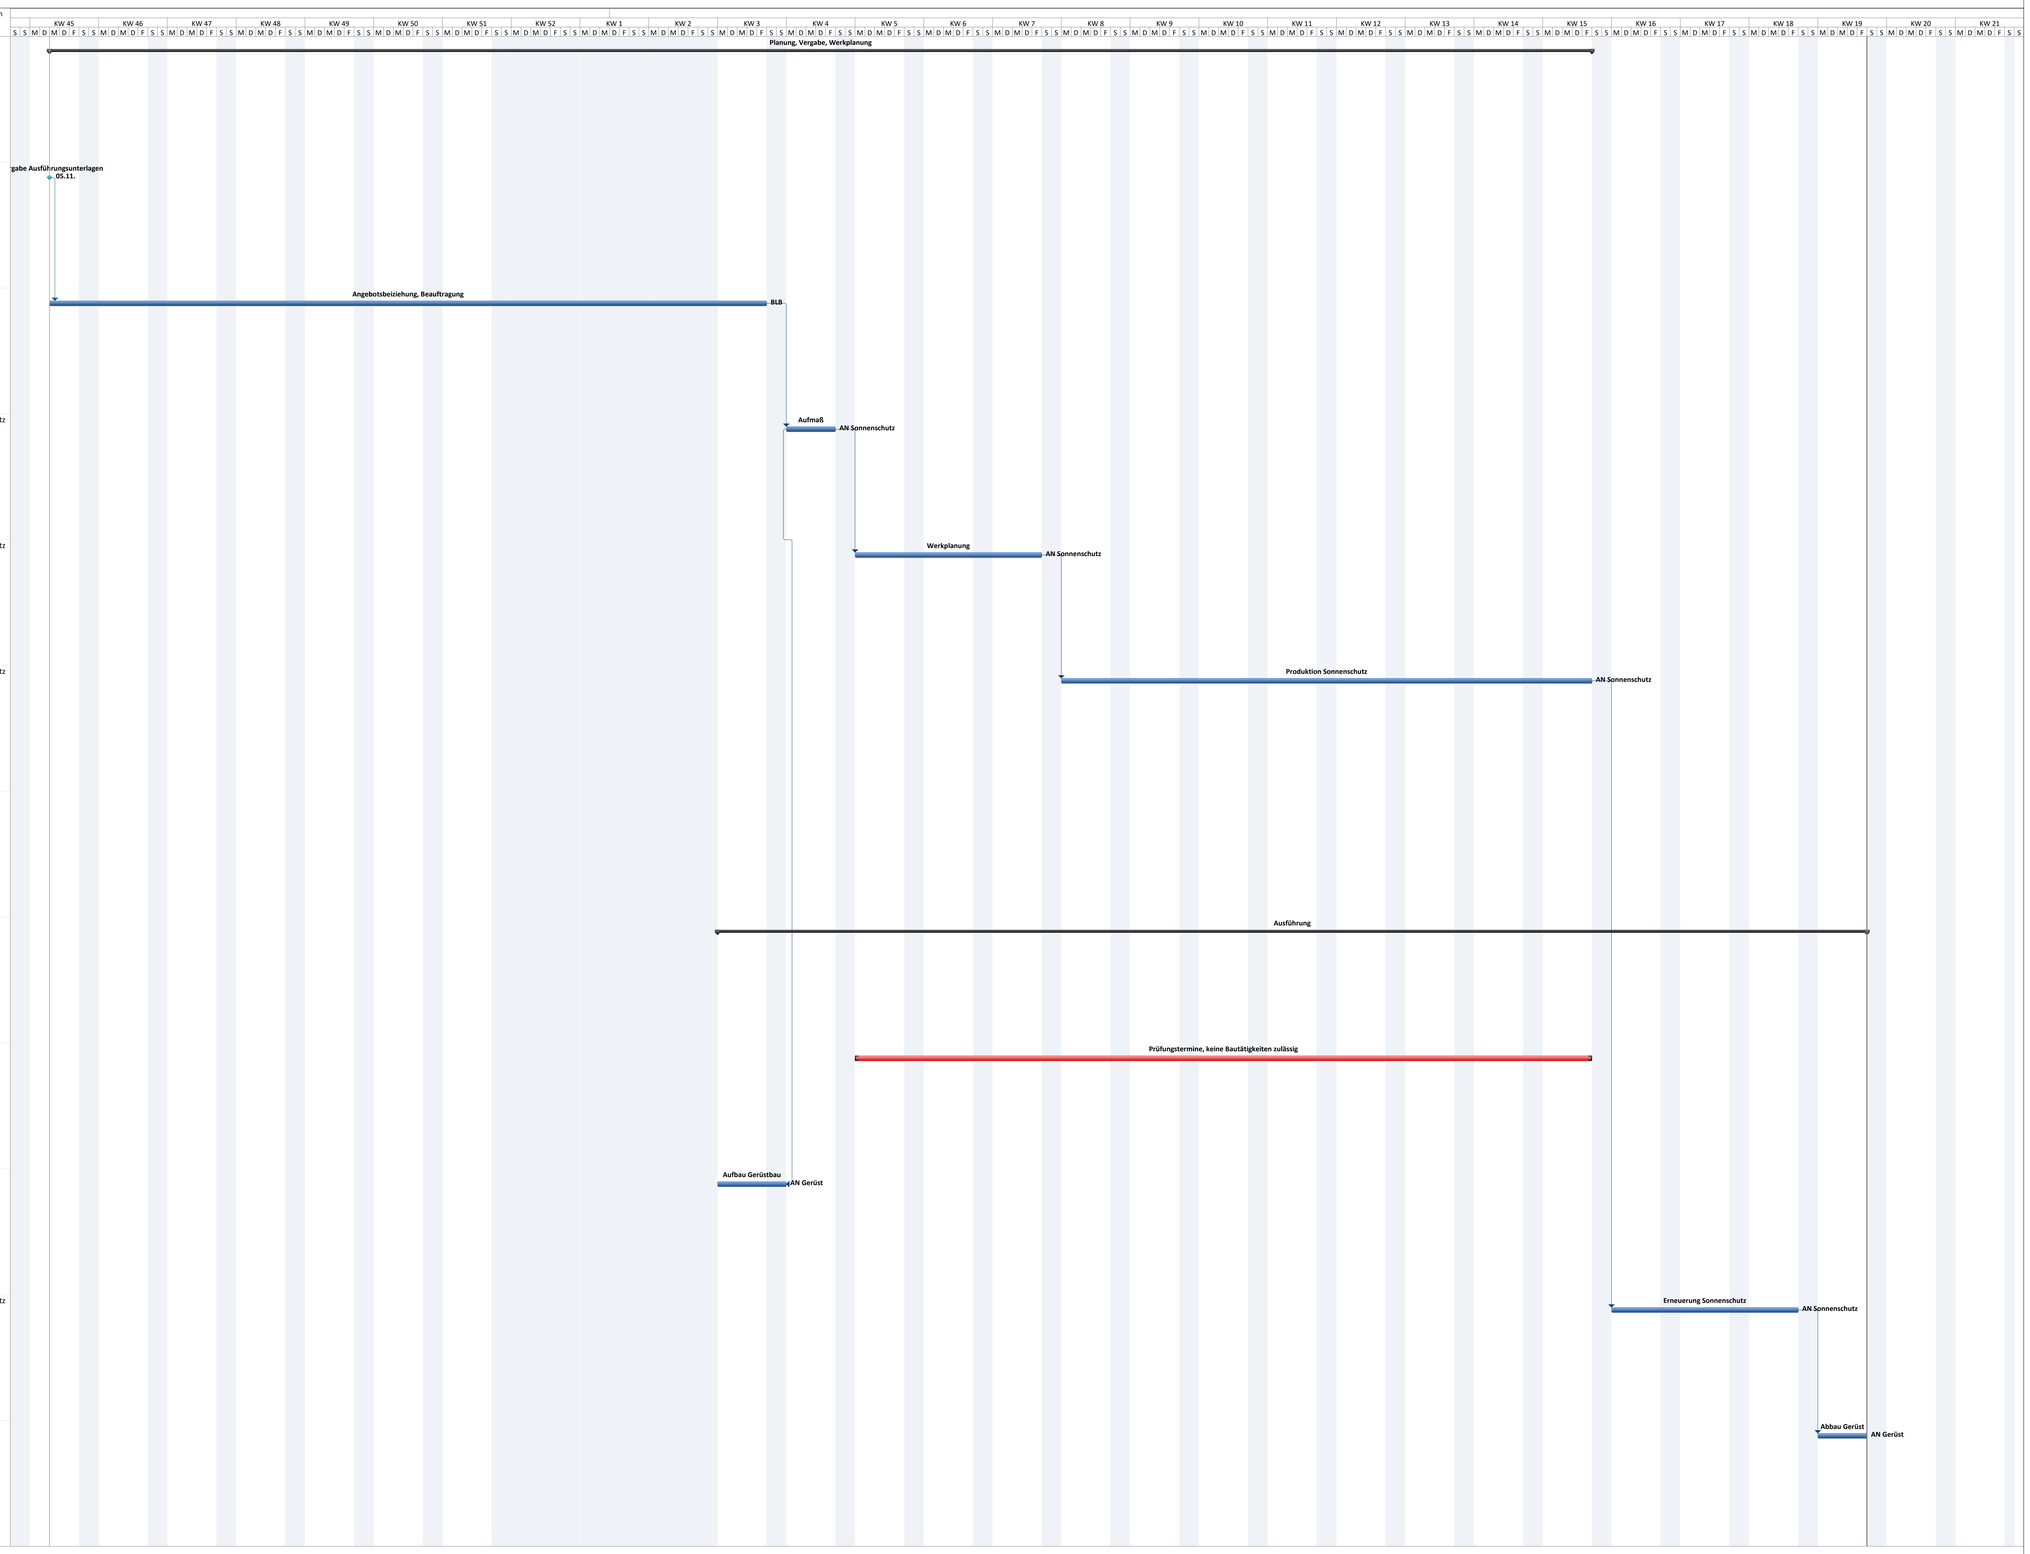

Mi 05.11.25
