Kettentausch OT l. Kammer

Iffezheim

Projektleiter: Andreas Foos

Projektanfang: Mo, 13.4.2026

Anzeigewoche: 1

Feiertag Wochenende

AUFGABE	ZUGEWIESEN AN	FORTSCHRITT	START	ENDE
Phase 1 Kammerleerung				
Tockenlegung	Abz./Bhf	1%	13.4.26	13.4.26
Reinigen Obertor	Abz.	1%	14.4.26	14.4.26
BI Obertor	WSA/Abz.	1%	14.4.26	14.4.26
Absetzen Obertor	Bhf.	1%	15.4.26	15.4.26
Abhäng. Gegengewicht	Bhf.	1%	16.4.26	21.4.26
Reinigen Untertor	Abz.	1%	15.4.26	15.4.26
BI Untertor	WSA/Abz.	1%	16.4.26	16.4.26
Reinigen Kammer	Abz.	1%	16.4.26	17.4.26
Bereitstellung Gerüst	Abz.	1%	15.4.26	4.5.26
Bereitstellung Kran	Fremd	1%	13.4.26	17.4.26
Phase 2 Demontage Kette 1. Seite				
Abhäng. Gegengewicht	Bhf	1%	20.4.26	20.4.26
Demontage Kette	Fremd	1%	20.4.26	21.4.26
Entfernung Ritzel	Fremd	1%	21.4.26	21.4.26
Überholung Ritzel	Bhf	1%	21.4.26	23.4.26
Seitenwechsel Kran	Fremd	1%	21.4.26	21.4.26
Phase 3 Ent-/ Beschichten Kettenanschlag Tor 1. Seite				
Entschichtung	Fremd	1%	22.4.26	23.4.26
Säubern/ Grundbeschichtung	Fremd	1%	24.4.26	24.4.26
Deckbeschichtung	Fremd	1%	27.4.26	27.4.26
Phase 4 Demontage Kette 2. Seite				
Abhäng. Gegengewicht	Bhf	1%	22.4.26	22.4.26
Demontage Kette	Fremd	1%	22.4.26	23.4.26
Entfernung Ritzel	Fremd	1%	23.4.26	23.4.26
Überholung Ritzel	Bhf	1%	23.4.26	27.4.26
Einbau überhol. Ritzel	Fremd	1%	24.4.26	24.4.26
Phase 5 Ent-/ Beschichten Kettenanschlag Tor 2. Seite				
Entschichtung	Fremd	1%	27.4.26	29.4.26
Säubern/ Grundbeschichtung	Fremd	1%	30.4.26	30.4.26
Deckbeschichtung	Fremd	1%	4.5.26	4.5.26
Phase 6 Montage Kette 2. Seite				
Montage Kette	Fremd	1%	27.4.26	28.4.26
Anhängen Gegengew.	Bhf	1%	28.4.26	29.4.26
Seitenwechsel Kran	Fremd	1%	30.4.26	30.4.26

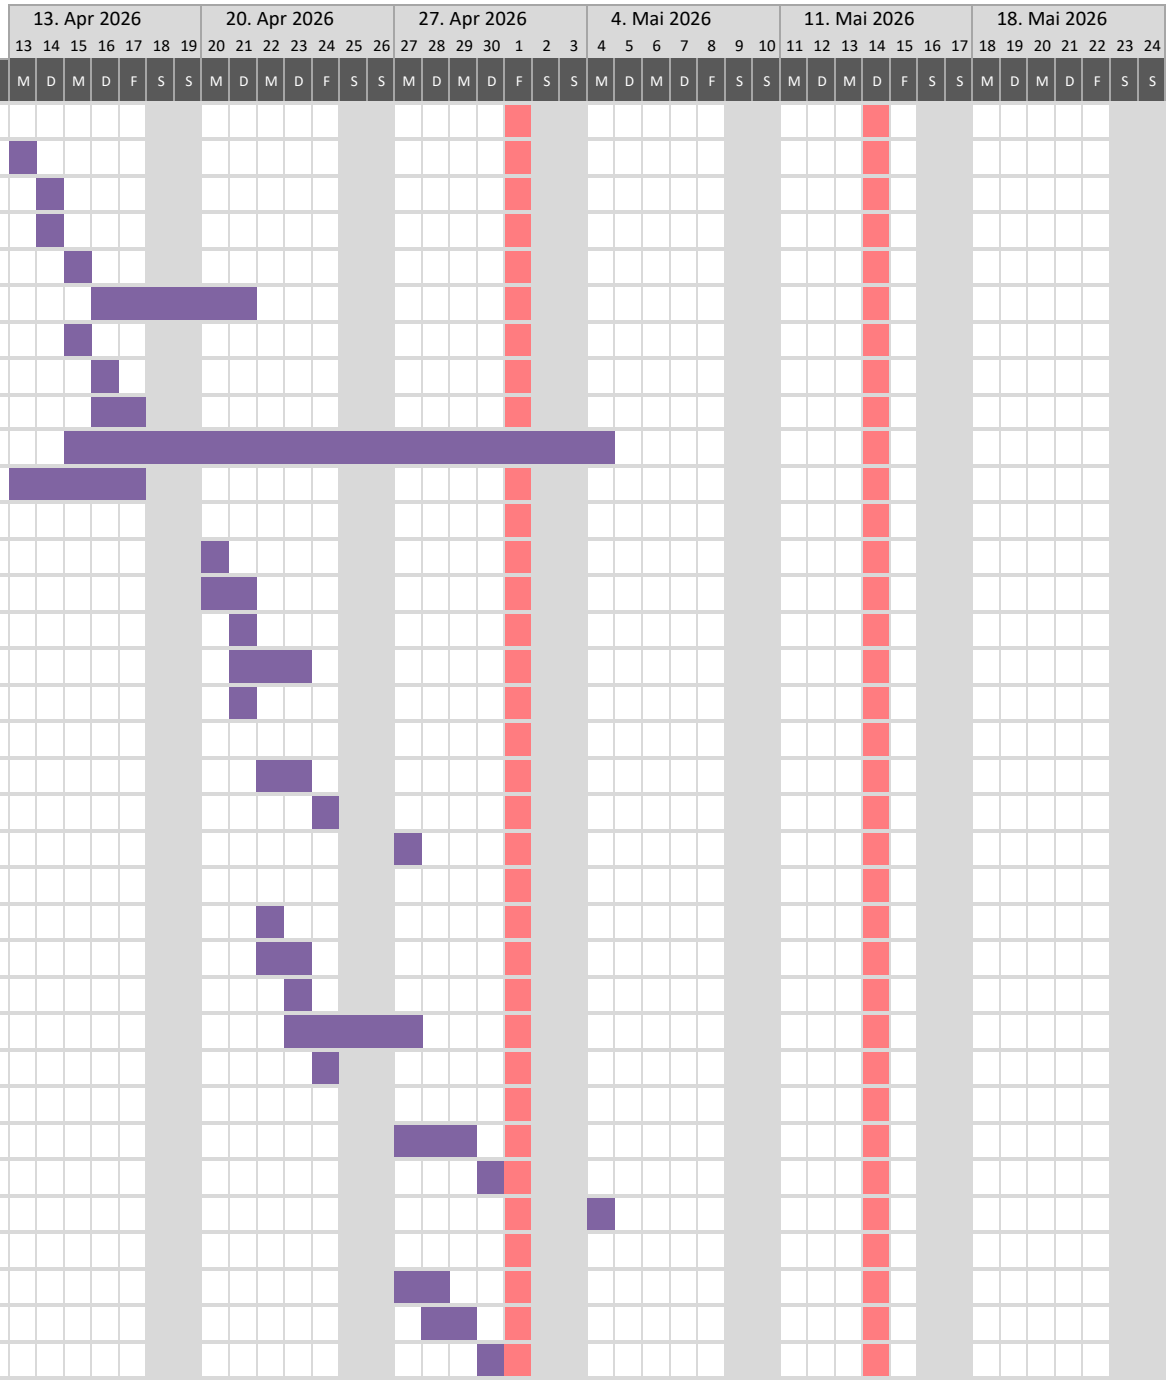

Anzeigewoche: 1
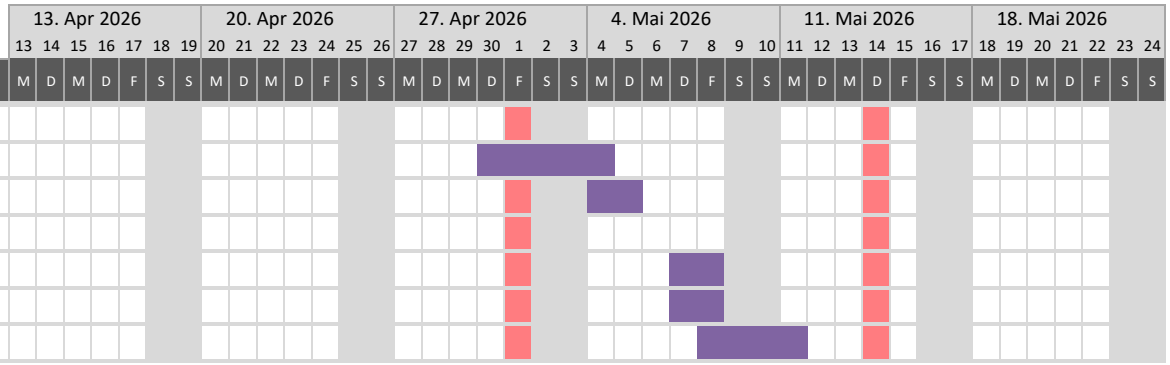
AUFGABE	ZUGEWIESEN AN	FORTSCHRITT	START	ENDE
Phase 7 Montage Kette 1. Seite				
Montage Kette	Fremd	1%	30.4.26	4.5.26
Anhängen Gegengew.	Bhf	1%	4.5.26	5.5.26
Phase 8 Kammerflutung				
Kammerflutung	Bhf	1%	7.5.26	8.5.26
Bereitstellung Kran	Fremd	1%	7.5.26	8.5.26
Probelauf	Abz.	1%	8.5.26	11.5.26
