Erweiterung Hort Sudenburg

Nr.	Vorga	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**Realisierung**	**240 Tage**	**23.02.26**	**12.02.27**
2		**LOS 02 Erweiterter Rohbau**	**144 Tage**	**23.02.26**	**17.09.26**
3		BE-Einrichtung	2 Tage	23.02.26	24.02.26
4		Pflasteraufnahme/ Erdarbeiten/ Grundleitungen	10 Tage	23.02.26	06.03.26
5		Fundamente/ Bodenplatte/ Wände/ Decke/ Attika	67 Tage	02.03.26	09.06.26
6		Gerüst	115 Tage	07.04.26	17.09.26
7		**LOS 03 Dachbauarbeiten**	**125 Tage**	**10.06.26**	**01.12.26**
8		Dampfsperre/ B-Abdichtung/ Attika-Bohle	10 Tage	10.06.26	23.06.26
9		Dämmung/ Abdichtung/ Sprengler/ PV UK Rahmen/ Begrünung	85 Tage	24.06.26	01.12.26
10		**ELT**	**231 Tage**	**02.03.26**	**08.02.27**
11		Erdungsanlage	5 Tage	02.03.26	06.03.26
12		RI Starkstrom Schlitzen	90 Tage	01.07.26	03.11.26
13		RI Schwachstrom Schlitzen	90 Tage	01.07.26	03.11.26
14		FI Starkstrom	36 Tage	26.10.26	14.12.26
15		FI Schwachstrom	36 Tage	26.10.26	14.12.26
16		Leuchtenmontage	5 Tage	23.12.26	12.01.27
17		Montage Brandmelder (nach Bodenleger)	5 Tage	21.12.26	08.01.27
18		Messungen, Prüfungen, Inbetriebnahmen, Probebetrieb	11 Tage	25.01.27	08.02.27
19		Blitzschutz, PV-Module	15 Tage	05.10.26	23.10.26
20		**HLS**	**128 Tage**	**29.07.26**	**05.02.27**
21		RI HLS	60 Tage	29.07.26	20.10.26
22		FI HLS	60 Tage	26.10.26	29.01.27
23		Vorbereitung TW/HZ Anschluss Schule	15 Tage	31.08.26	18.09.26
24		Verlegung TW/HZ Hort-Schule (Herbstferien Sachsen-Anhalt)	10 Tage	21.09.26	02.10.26
25		Prüfungen, Inbetriebnahmen, Probebetrieb	5 Tage	01.02.27	05.02.27
26		**LOS 04 PVC Fenster**	**49 Tage**	**20.04.26**	**30.06.26**
27		Aufmaß, Produktion	5 Tage	20.04.26	24.04.26
28		Montage Fenster	5 Tage	24.06.26	30.06.26
29		**LOS 6 Fassadenarbeiten (WDVS)**	**50 Tage**	**01.07.26**	**08.09.26**
30		LOS 05 WDVS-Fassade	50 Tage	01.07.26	08.09.26
31		LOS 06 Platten-Fassade	50 Tage	01.07.26	08.09.26
32		**LOS 02 Putzarbeiten**	**10 Tage**	**29.07.26**	**11.08.26**
33		Innenputz	10 Tage	29.07.26	11.08.26
34		**LOS 07 Schlosser Alu-Türen, Geländer**	**77 Tage**	**27.04.26**	**14.08.26**
35		Aufmaß, Montage Türen	42 Tage	27.04.26	26.06.26
36		Aufmaß, Montage Geländer	30 Tage	06.07.26	14.08.26
37		**LOS 10 Trockenbau**	**130 Tage**	**08.07.26**	**19.01.27**
38		Trockenbau 1-seitige Beplankung, Abstellung	15 Tage	08.07.26	28.07.26
39		Deckenraster	15 Tage	02.11.26	20.11.26
40		Trockenbau 2. Beplankung, Q2 Spachteln	10 Tage	26.10.26	06.11.26
41		Rasterdecke komplettieren	10 Tage	23.12.26	19.01.27
42		**LOS 11 Tischler**	**111 Tage**	**12.08.26**	**27.01.27**
43		Aufmaß Türen	5 Tage	12.08.26	18.08.26
44		Montage Zargen/Türblätter	18 Tage	09.11.26	27.01.27
45		**LOS 08 Estricharbeiten + FuBoHzg**	**58 Tage**	**12.08.26**	**30.10.26**
46		Dämmung	5 Tage	12.08.26	18.08.26
47		FuBoHzg Gewerk HLS	15 Tage	24.08.26	11.09.26
48		Estricharbeiten + Trocknung	20 Tage	05.10.26	30.10.26
49		**LOS 09 Fliesen**	**20 Tage**	**02.11.26**	**27.11.26**
50		Fliesenarbeiten	20 Tage	02.11.26	27.11.26
51		**LOS 13 Maler-/ Bodenbelagsarbeiten**	**50 Tage**	**26.10.26**	**15.01.27**
52		Malerarbeiten	30 Tage	26.10.26	04.12.26
53		Bodenbelagsarbeiten	30 Tage	23.11.26	15.01.27
54		**LOS 15 Reinigung**	**123 Tage**	**10.08.26**	**10.02.27**
55		Zwischenreinigung vor Estrich	2 Tage	10.08.26	11.08.26
56		Zwischenreinigung vor Bodenbelag	2 Tage	19.11.26	20.11.26
57		Endreinigung	3 Tage	08.02.27	10.02.27
58		**Aussenanlagen**	**95 Tage**	**20.07.26**	**27.11.26**
59		SW-Anschluss SWM / Erdarbeiten	12 Tage	20.07.26	04.08.26
60		FW/ Kabelgraben zum Bestandsgebäude	10 Tage	03.08.26	14.08.26
61		Aussenanlagen	50 Tage	21.09.26	27.11.26
62		**LOS 14 Beschilderung**	**5 Tage**	**16.12.26**	**22.12.26**
63		Beschilderung	5 Tage	16.12.26	22.12.26
64		**Abnahme**	**15 Tage**	**25.01.27**	**12.02.27**
65		Technische Abnahme/ Vorbegehung	10 Tage	25.01.27	05.02.27
66		Mängelbeseitigung	10 Tage	25.01.27	05.02.27
67		Gesamtabnahme	1 Tag	08.02.27	08.02.27
68		**Gesamtfertigstellung**	**0 Tage**	**12.02.27**	**12.02.27**

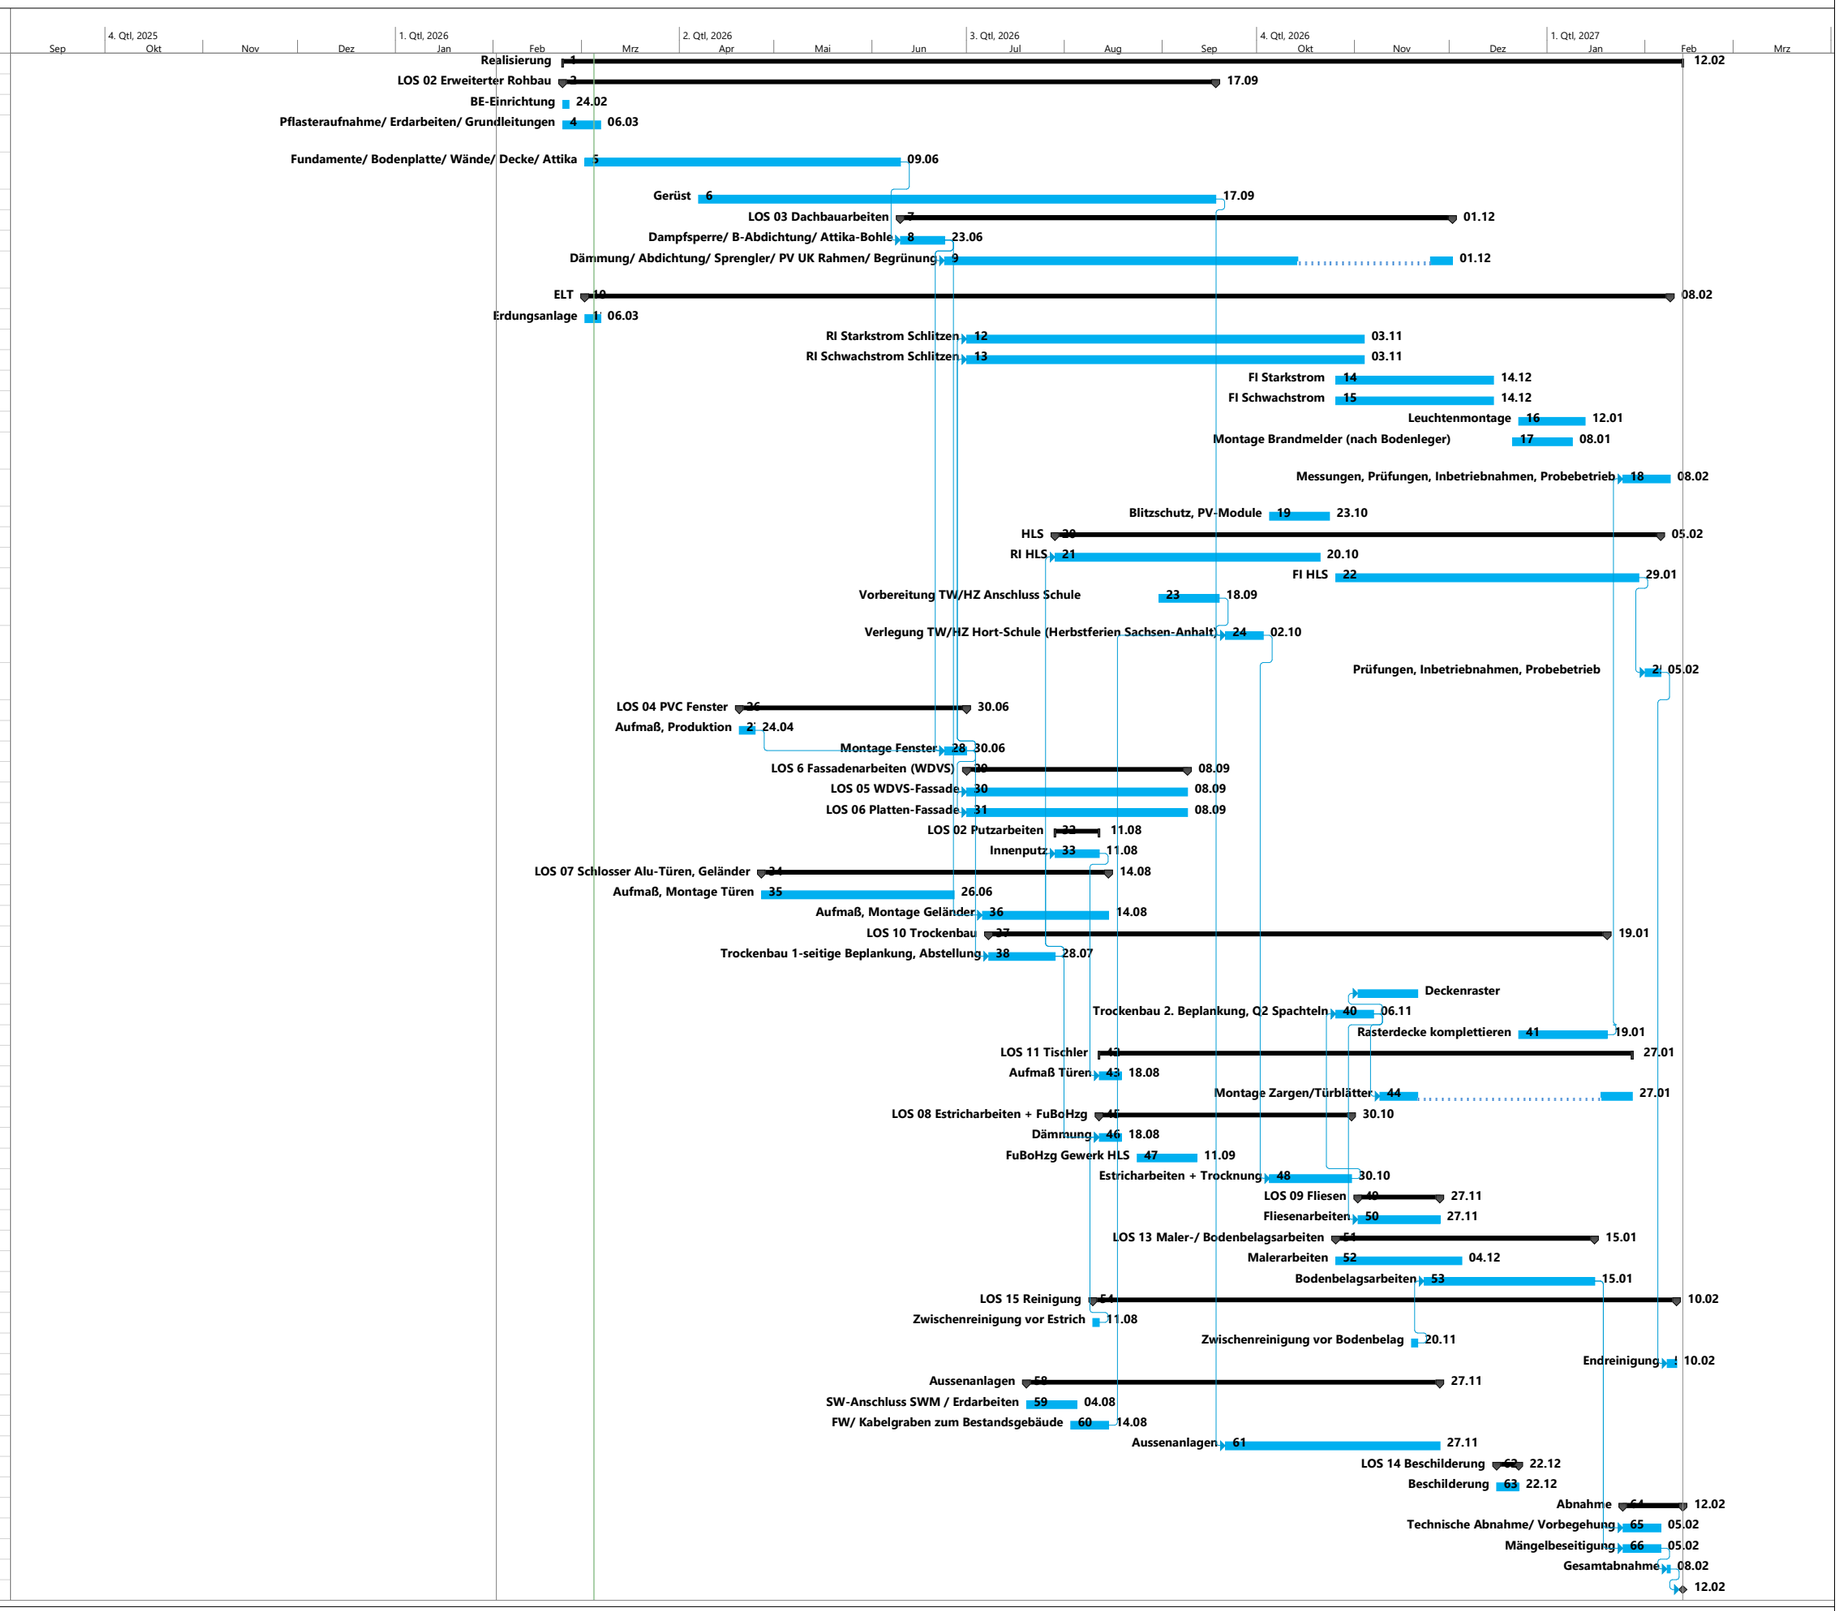

05.03.26
