Planverteilerliste

Datum	Index	Bauherr	Projektsteuerer	**Fachplaner**	Tragwerksplaner	HLSK-Planer	ELT-Planer	Brandschutzplaner	Bauphysiker	Freianlagenplaner	Bodengutachter	SiGeKo	Schadstoff+Abbruchplaner	**Gewerke**	Schadstoffsanierung	Baumeister	Fassadenbau Anbau	Trockenbauer Anbau	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1	Gewerk 1
23.12.2022	**VA**				☒	☒	☒	☒																															
21.03.2023	**VA**									☒																													
23.03.2023	**VA**									☒																													
26.06.2023	**VA**					☒																																	
26.06.2023	**VA**									☒																													
19.02.2024	**VA**					☒			☒																														

Zeichen- / Beschriftungslegende

Schraffuren	BESTAND	NEUBAU
Stahlbeton	▨	▨
Stahlbetonfertigteil	▦	▦
Beton, unbewehrt	▨	▨
Mauerwerkswand	▨	▨
Leichte Trennwand	▨	▨
Holz	▤	▤
Brettschichtholz BSH	▨	▨
Mineralische Dämmung (Steinwolle)	▨	▨
Synthetische Dämmung (Schaumstoffe EPS/XPS)	▩	▩
Dämmelemente (HWL-Platten)	▥	▥
vorgehängte Fassade, Unterkonstuktion, Dämmung	▨	▨
Kies	▨	▨
Boden	▨	▨
Gitterroste	▦	▦
Vorwand	▬	▬
WC-Trennwand	▬	▬

Brandschutz	
Allgemein	
feuerbeständig	F90 (fb)
hochfeuerhemmend	F60 (hfh)
feuerhemmend	F30 (fh)
Brandwand	BW
Wand in Bauart einer Brandwand	BBW
rauchdichte Wand	RDW
aus nicht brennbaren Baustoffen	-A (A1, A2)
in wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen	-AB
aus schwer entflammbaren Baustoffen	-B1
Türen	
feuerbeständige Tür	T90 (fb)
feuerhemmende Tür	T30 (fh)
Rauchschutztür, rauchdicht, selbstschließend DIN 18095	RS
vollwandig, dicht- und selbstschließende Tür	vdsT
vollwandig dichte Tür	dT
nicht abschließbar	N
Tür mit Panikfunktion	P
Qualifizierung der Panikfunktion	B, C, D, E
Türöffnungsrichtung Panik; e=einwärts, a=auswärts	e, bzw. a
Tür Gewerk Fassade	FA
Tür Gewerk Innentüren	IT
Tür Gewerk Metallbau / Rohrrahmentüren	MB
Brandschutzverglasungen	
Glas mit Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb	F30 / F90
Glas ohne Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb	G30 / G90
Sonstiges	
nichttragende Wände/Vorhangfassaden, Installationskanäle, -schächte. Feuerwiderstand geprüft nach DIN EN 1634-1	EI30

Schallschutz	
Türen: **Rw,P** Angabe des Prüfschalldämmwertes Wände: **Rw,R** Angabe Schallschutz-Rechenwert	**dB** *Angabe in Dezibel*

Beschriftungen / Kürzel	
Oberkante	OK
Unterkante	UK
Vorderkante	VK
Außenkante	AK
Innenkante	IK
Rohdecke	RD
abgehängte Decke	AD
Fertigfußboden	FFB
Rohfußboden	RFB
Rohkote	▼
Fertigkote	▽
Überzug	UEZ
Unterzug	UZ
Sturz	STZ
Sturz Trockenbau	STZ-TB
Brüstung	BR
lichte Raumhöhe über OK FFB	LRH
lichter Durchgang	LD
Installationsschacht	INST-S
Bodeneinlauf (Gully) mit Gefälle - min. 2 %	⌧
Bodeneinlauf (Gully) ohne Gefälle	☐
Regenfallrohr	RR
Elektroverteiler	UV
Feuerlöscher	FeuL
Notausgang	NA
notwendige Rauchableitung	NRA

Beschriftungen / Kürzel / Zeichen		
Deckendurchbruch	DD	◩
Deckenaussparung	DA	◩
Bodendurchbruch	BD	◩
Bodenaussparung	BA	◩
Unterzugsdurchbruch	UZD	⧓
Wanddurchbruch	WD	⧓
Wandaussparung	WA	◩
Wandschlitz	WS	◩
Elektrik	E	
Heizung	H	
Lüftung	L	
Sanitär	S	
Revisionsklappe / Reinigungsöffnung	RV / RÖ	

Wand- und Deckenoberflächen	
Fliesen	FL
Gipsputz	GPU
Kalkzementputz	KZPU
Stahlbeton Lasiert	SB-L
Beton zusätzliche Anford. an die Schalhaut	SB-0
Beton erhöhte Anforderung an Ebenheit	SB-SP
Sichtbeton Klasse SB2	SB2
Anstrich	AS
Spachtelung	SP
Holzverkleidung	HV

Planinhalt	Bauteil		Phase		Verfas.		Planart		Ebene		Planinhalt		Plann.		Index		Status
Nordwest Ansicht Neubaumaßnahmen	A1	-	5	-	A	-	AN	-	NW	-	AG	-	01	-		-	V

Index	Datum	Änderungen

VORABZUG

ZU BEACHTENDE HINWEISE

Sämtliche Angaben und Maße sind von den ausführenden Firmen vor Arbeitsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.

Für die Richtigkeit der Maße haftet der Auftragnehmer.

Bei Maßdifferenzen, Abweichungen zu Plänen des Statikers, bzw. statischen Berechnungen und Abweichungen bzgl. Aussparungen sind der Architekt und die Bauleitung unverzüglich zu verständigen.

Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche erfolgen nach Schal-/Bewehrungsplänen des Statikers. s.hierzu auch Werkpläne

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im Plan angegebenen Detailplänen vollständig.

Die Montagepläne der Elektro- und HLS-Projektanten sind für alle einzubetonierende Installationsteile vor Baubeginn zu beachten.

Alle tragenden Bauteile nach statischer Berechnung.

Schließen der Vorsatzschalen, sowie die komplette Schließung der leichten Trennwände darf erst nach erfolgten Installationen und nach Freigabe der Bauleitung erfolgen.

Tür- und Fensterhöhenangaben beziehen sich auf ±0,00.
Angabe Öffnungsmaße von Türen:
von OK FFB bis UK Sturz

PROJEKTBEZEICHNUNG
Generalinstandsetzung und Erweiterung Rupprecht Gymnasium
Altbau, Anbau, Brücke - Rupprecht Gymnasium südlich der Albrecht-Strasse - mit Abbruch Turnhalle und Brücke

PROJEKTKÜRZEL
RUP

GEBÄUDESCHEMA

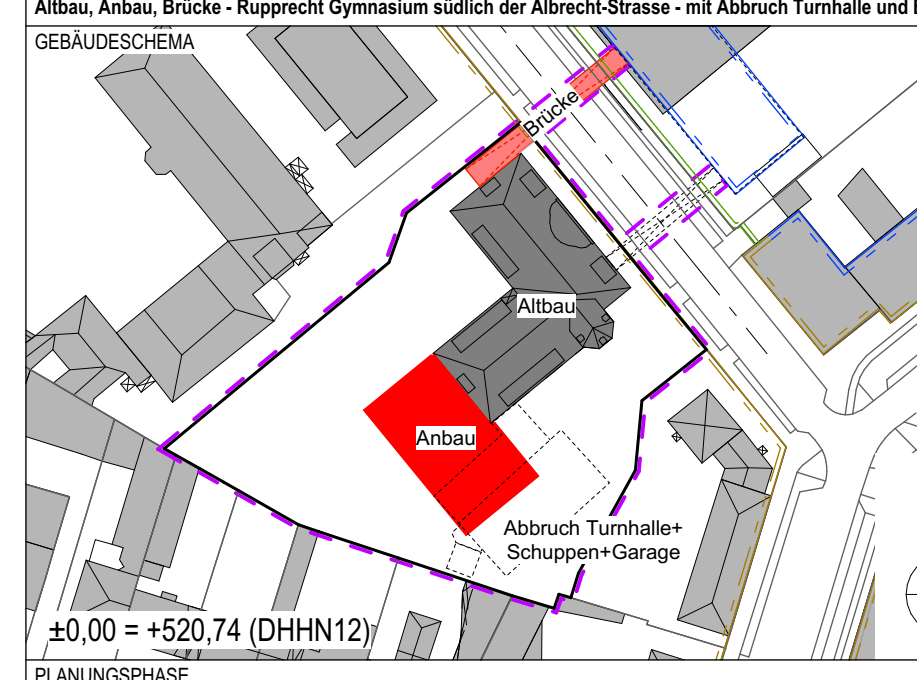

ORT DES BAUVORHABENS
Albrechtstrasse 7
80636 München

BAUHERR
Landeshauptstadt München
Baureferat Hochbau 63
Berg-am-Laim-Str. 47
81673 München

PLANUNGSPHASE
Werkplanung

PLANINHALT
Nordwest Ansicht Neubaumaßnahmen

Druckdatum: 12.12.2025

STAND	GEZ. V.
PLANGRÖSSE	165,0 x 84,1 = 1,40 m²
DATEI	RUP_Altbau
MASZSTAB	1:50

RUP-A1-5-A-AN-NW-AG-01- -V
