SPP Schüttauf und Persike Planungsgesellschaft mbH

WE 187/ 188 Stierstraße 20-21 in 12159 Berlin
Stand: 26.11.2025
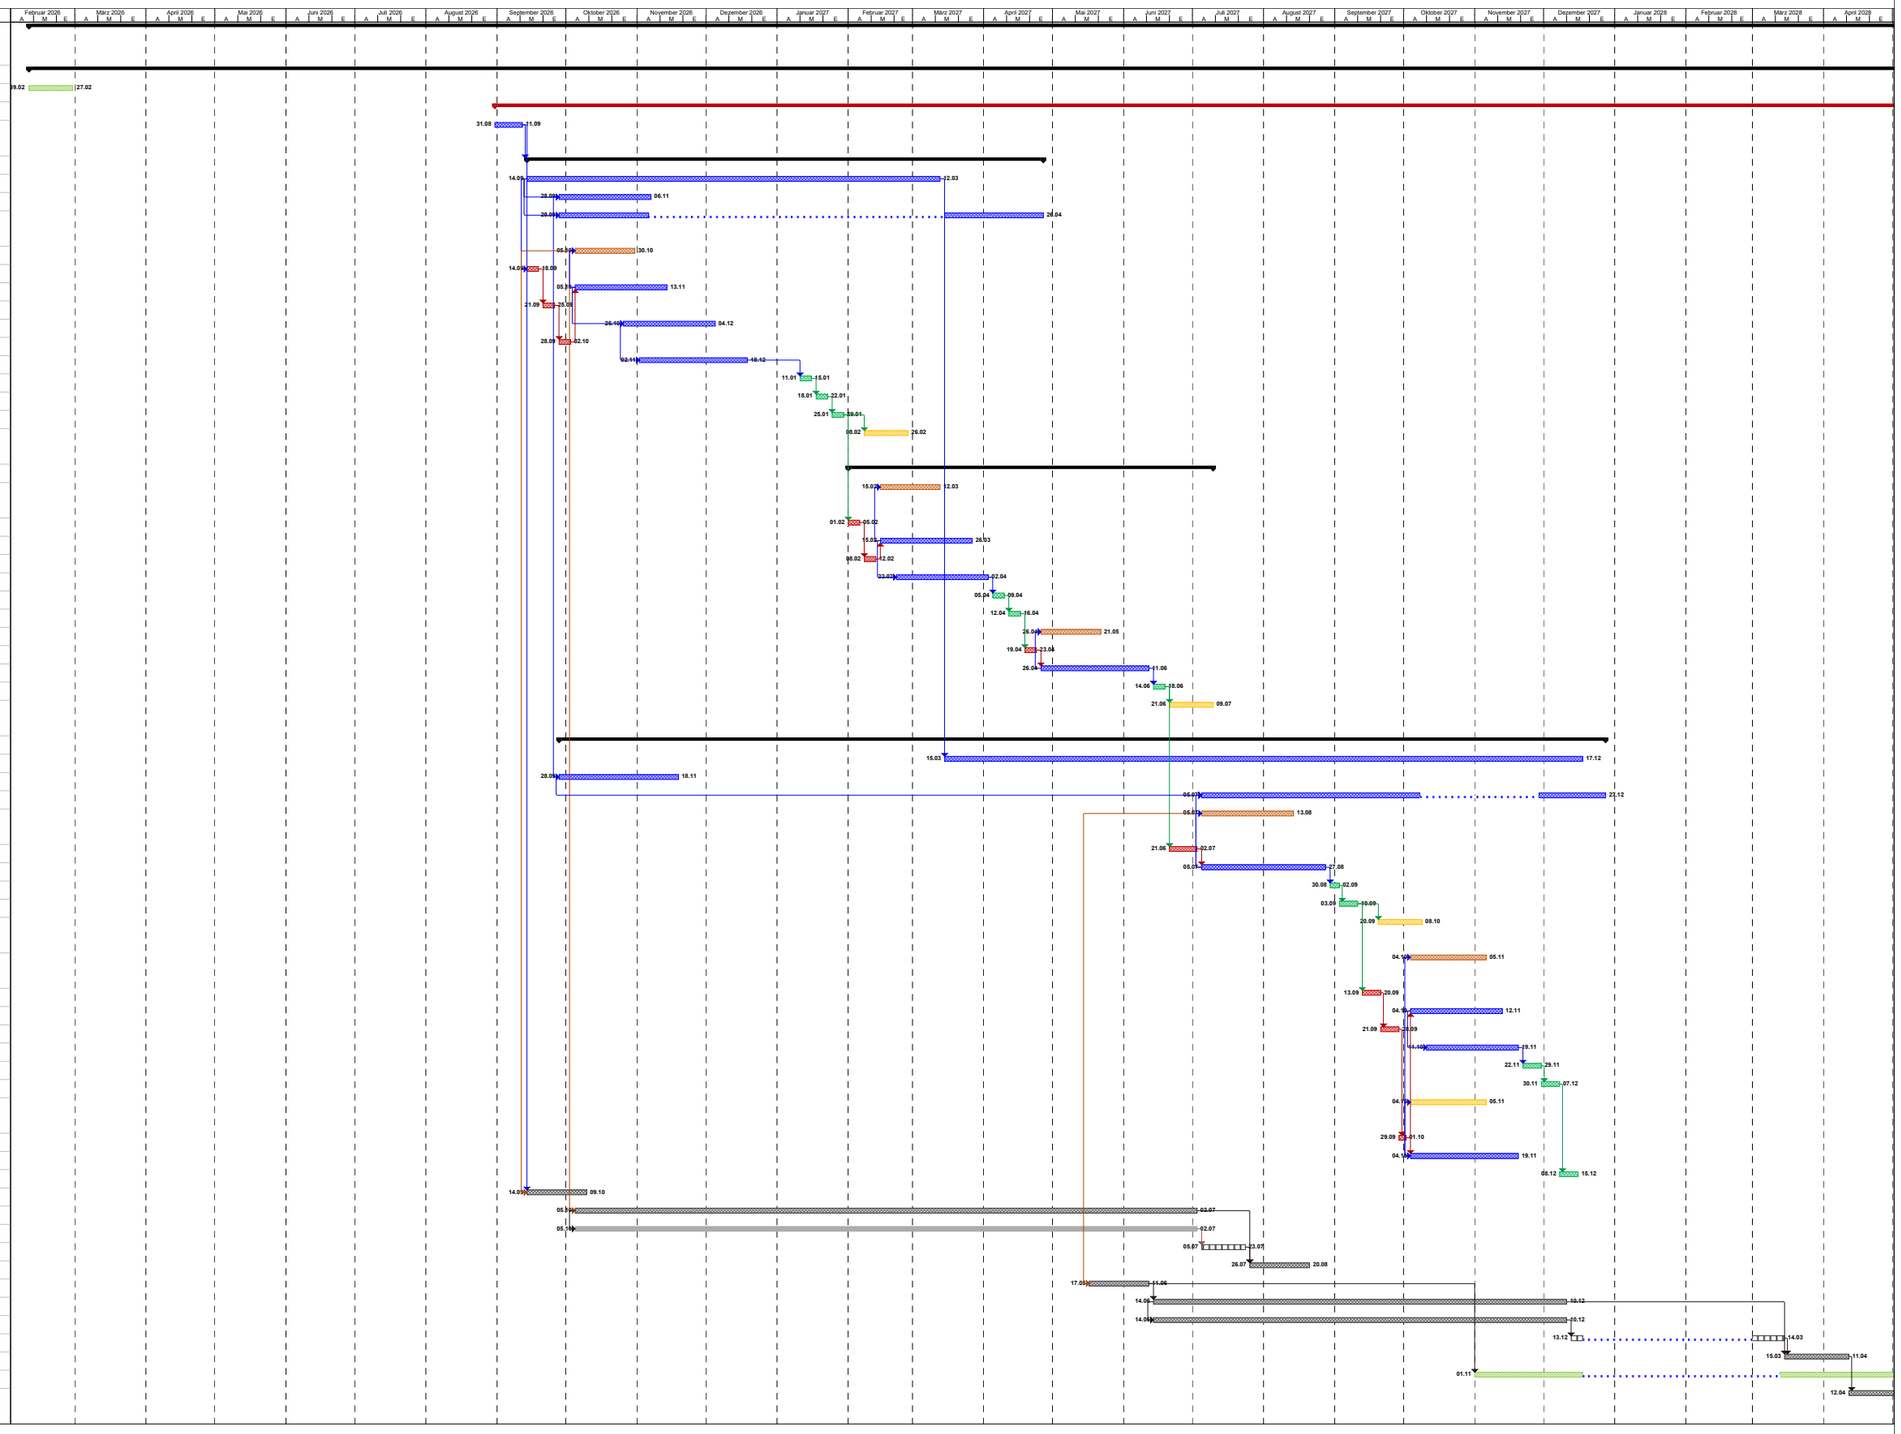
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	**WE 187/ 188, Stierstraße 20-21 in 12159 Berlin**	**615 Tage**	**Mon 09.02.26**	**Fre 16.06.28**		
2	**LP 8 Objektüberwachung**	**615 Tage**	**Mon 09.02.26**	**Fre 16.06.28**		
3	Baufreimachung/ Rückschnitt	15 Tage	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26		
4	**Baubeginn Mod-Inst**	**470 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 16.06.28**		
5	vorbereitende Maßnahmen/BE Strasse/Hof	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26		
6	**Gartenhaus Nr. 20**	**161 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Mon 26.04.27**	5	
7	Kellerleitungen GH Nr. 20-21, VH	130 Tage	Mon 14.09.26	Fre 12.03.27		
8	Kellerabdichtung GH Nr. 20-21	30 Tage	Mon 28.09.26	Fre 06.11.26	7AA+10 Tage	
9	Sanierung Kellerdecken, KDD GH Nr.20-21	60 Tage	Mon 28.09.26	Mon 26.04.27	7AA+10 Tage	
10	Fensterrerneuerung GH Nr. 20	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26	12AA	
11	Freizug Strang 20-2	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	7AA	4 WE 100187--03, 08, 09, 12
12	Strang 20-2	30 Tage	Mon 05.10.26	Fre 13.11.26	15	
13	Freizug Strang 20-1	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26	11	4 WE 100187--04, 06, 11, 13
14	Strang 20.1	30 Tage	Mon 26.10.26	Fre 04.12.26	12AA+15 Tage	
15	Freizug Strang 20-3.0/3.1	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	13	4 WE 100187--05, 07, 10, 14
16	Strang 20-3.0/3.1	35 Tage	Mon 02.11.26	Fre 18.12.26	14AA+5 Tage	4 WE
17	Rückzug Strang 20-2	5 Tage	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27	16	4 WE 100187--03, 08, 09, 12
18	Rückzug Strang 20-1	5 Tage	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	17	4 WE 100187--04, 08, 09, 12
19	Rückzug Strang 20-3.0/3.1	5 Tage	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27	18	4 WE 100187--05, 07, 10, 14
20	Treppenhaus GH Nr.20, Fenster, Hauseingang, Reinigung	15 Tage	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27	19EA+5 Tage	
21	**Gartenhaus Nr. 21**	**115 Tage**	**Mon 01.02.27**	**Fre 09.07.27**		
22	Fensterrerneuerung GH Nr 21 Strang 21-1	20 Tage	Mon 15.02.27	Fre 12.03.27	24AA	4 WE
23	Freizug Strang 21-1	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27	19	4 WE 100188--06, 12, 17, 23
24	Strang 21-1	30 Tage	Mon 15.02.27	Fre 26.03.27	25	4 WE
25	Freizug Strang 21-2	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27	23	4 WE 100188--04, 09, 18, 25
26	Strang 21-2	30 Tage	Mon 22.02.27	Fre 02.04.27	24AA+5 Tage	4 WE
27	Rückzug Strang 21-1	5 Tage	Mon 05.04.27	Fre 09.04.27	26	4 WE 100188--06, 12, 17, 23
28	Rückzug Strang 21-2	5 Tage	Mon 12.04.27	Fre 16.04.27	27	4 WE 100188--04, 09, 18, 25
29	Fensterrerneuerung Strang 21-3.(	20 Tage	Mon 26.04.27	Fre 21.05.27	31AA	4 WE
30	Freizug Strang 21-3.0/3.1	5 Tage	Mon 19.04.27	Fre 23.04.27	28	4 WE 100188--05, 11, 16, 24
31	Strang 21-3.0/3.1	35 Tage	Mon 26.04.27	Fre 11.06.27	30	4 WE
32	Rückzug Strang 21-3.0/3.1	5 Tage	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	31	4 WE 100188--05, 11, 16, 24
33	Treppenhaus GH Nr.21, Fenster, Hauseingang, Reinigung	15 Tage	Mon 21.06.27	Fre 09.07.27	32	
34	**Vorderhaus Nr. 21**	**326 Tage**	**Mon 28.09.26**	**Mon 27.12.27**		
35	Kellerleitungen VH	200 Tage	Mon 15.03.27	Fre 17.12.27	7	
36	Kellerabdichtung VH Nr 21	38 Tage	Mon 28.09.26	Mit 18.11.26	8AA	
37	Sanierung Kellerdecken, KDD VH	90 Tage	Mon 05.07.27	Mon 27.12.27	36AA;40AA	
38	Fensterrerneuerung Strang 21-1, 21-4, 21-5	30 Tage	Mon 05.07.27	Fre 13.08.27	40AA	6 WE
39	Freizug Strang 21-1, 21-4, 21-6	10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27	32	6 WE 100188--02, 07, 10, 14, 19, 20, 26
40	Strang 21-1, 21-4, 21-6	40 Tage	Mon 05.07.27	Fre 27.08.27	39	6 WE
41	Rückzug Strang 21-1	4 Tage	Mon 30.08.27	Don 02.09.27	40	6 WE
42	Rückzug Strang 21-1, 21-4, 21-6	6 Tage	Fre 03.09.27	Fre 10.09.27	41	6 WE 100188--02, 07, 10, 14, 19, 20, 26
43	Treppenhaus SF/ VH Nr.21, Fenster, Hauseingang, Reinigung	15 Tage	Mon 20.09.27	Fre 08.10.27	42EA+5 Tage	
44	Fensterrerneuerung Strang 21-2, 21-3, 21-7, 21-4	25 Tage	Mon 04.10.27	Fre 05.11.27	46AA	4 WE
45	Freizug Strang 21-2, 21-3	6 Tage	Mon 13.09.27	Mon 20.09.27	42	4 WE 100188--01, 15, 22, 27
46	Strang 21-2, 21-3	30 Tage	Mon 04.10.27	Fre 12.11.27	52	4 WE
47	Freizug Strang 21-5, 21-7	6 Tage	Die 21.09.27	Die 28.09.27	45	3 WE 100188--03, 13, 21
48	Strang 21-5, 21-7	30 Tage	Mon 11.10.27	Fre 19.11.27	46AA+5 Tage	3WE
49	Rückzug Strang 21-2, 21-3	6 Tage	Mon 22.11.27	Mon 29.11.27	48	4 WE 100188--01, 15, 22, 27
50	Rückzug Strang 21-5, 21-7	6 Tage	Die 30.11.27	Die 07.12.27	49	3 WE 100188--03, 13, 21
51	Fensterrerneuerung Strang 21-5, 21-7, 21-3, 21-2	25 Tage	Mon 04.10.27	Fre 05.11.27	53AA	1 GE
52	Freizug Strang 21-5, 21-7, 21-3,	3 Tage	Mit 29.09.27	Fre 01.10.27	47	1 GE
53	Strang 21-5, 21-7, 21-3, 21-2	35 Tage	Mon 04.10.27	Fre 19.11.27	46AA;52	1 GE
54	Rückzug Strang 21-5, 21-7, 21-3	6 Tage	Mit 08.12.27	Mit 15.12.27	50	
55	Gerüstaufbau GH	20 Tage	Mon 14.09.26	Fre 09.10.26	10AA-20 Tage;5	
56	Fassaden GH, Giebel Nr. 22	195 Tage	Mon 05.10.26	Fre 02.07.27	10AA	
57	Dach GH	195 Tage	Mon 05.10.26	Fre 02.07.27	56AA	
58	Errichtung PV	15 Tage	Mon 05.07.27	Fre 23.07.27	57	
59	Gerüstabbau GH	20 Tage	Mon 26.07.27	Fre 20.08.27	56;58	
60	Gerüstaufbau SF, VH	20 Tage	Mon 17.05.27	Fre 11.06.27	38AA-35 Tage	
61	Fassaden SF, VH	130 Tage	Mon 14.06.27	Fre 10.12.27	60	
62	Dach SF, VH	130 Tage	Mon 14.06.27	Fre 10.12.27	61AA	
63	Errichtung PV	15 Tage	Mon 13.12.27	Die 14.03.28	62	
64	Gerüstabbau SF, VH	20 Tage	Mit 15.03.28	Die 11.04.28	61;63	
65	Wiederherstellung Außenanlagen	105 Tage	Mon 01.11.27	Fre 16.06.28	60EA+100 Tage	
66	Restleistungen, Sonstiges, Abnahmen etc.	48 Tage	Mit 12.04.28	Fre 16.06.28	64
