Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Planungsphase**	**1601 Tage**	**Mon 20.06.22**	**Don 16.11.28**
354				
355	**Bauphase Campusgebäude**	**869 Tage**	**Die 17.03.26**	**Mit 12.09.29**
356	**Erdarbeiten (VE 301)**	**319 Tage**	**Die 17.03.26**	**Die 29.06.27**
384	**Baustrom und Baubeleuchtung (VE 490)**	**763 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 27.07.29**
394	**Baustelleneinrichtung (VE 302)**	**823 Tage**	**Mit 27.05.26**	**Mit 12.09.29**
403	**Baumeisterarbeiten (VE303)**	**444 Tage**	**Mit 29.07.26**	**Mon 15.05.28**
404	**Werkszeichnung / Planung / Vorlauf**	**55 Tage**	**Mit 29.07.26**	**Die 13.10.26**
405	Planung AN	25 Tage	Mit 29.07.26	Die 01.09.26
406	Vorlage Werkszeichnung	0 Tage	Die 01.09.26	Die 01.09.26
407	Prüfung Werkszeichnung	15 Tage	Mit 02.09.26	Die 22.09.26
408	Vorlauf bis Ausführung	15 Tage	Mit 23.09.26	Die 13.10.26
409	**Ausführungszeitraum**	**444 Tage**	**Mit 29.07.26**	**Mon 15.05.28**
410	Baustelle einrichten	10 Tage	Mit 29.07.26	Die 11.08.26
411	Baustelle räumen	10 Tage	Mit 08.12.27	Die 21.12.27
412	**Nutzung Kräne Folgegewerke**	**72 Tage**	**Mon 30.08.27**	**Die 07.12.27**
415	**Vorhaltung Kräne Folgegewerke**	**100 Tage**	**Die 07.12.27**	**Mon 15.05.28**
418	**Untergeschoss und Tiefgarage**	**159 Tage**	**Mit 12.08.26**	**Die 06.04.27**
419	**UG Bereich A**	**60 Tage**	**Mit 12.08.26**	**Die 03.11.26**
420	Feinplanie - Bereich A	5 Tage	Mit 12.08.26	Die 18.08.26
421	Sauberkeitsschicht - Bereich A	5 Tage	Mit 19.08.26	Die 25.08.26
422	Bodenplatte - Bauteil A	15 Tage	Mit 26.08.26	Die 15.09.26
423	Wände UG - Bereich A	25 Tage	Mit 16.09.26	Die 20.10.26
424	Decke über UG - Bereich A	10 Tage	Mit 21.10.26	Die 03.11.26
425	Probewand Sichtbeton	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
426	**UG / TG Bereich B - Abschnitt 1**	**50 Tage**	**Mit 19.08.26**	**Die 27.10.26**
427	Feinaushub Fundamente - Bereich B	10 Tage	Mit 19.08.26	Die 01.09.26
428	Sauberkeitsschichten - Bereich B	5 Tage	Mit 02.09.26	Die 08.09.26
429	Fundamente - Bereich B	15 Tage	Mit 09.09.26	Die 29.09.26
430	Bodenplatten - Bereich B	10 Tage	Mit 30.09.26	Die 13.10.26
431	Wände/Stützen/Unterzüge - Bereich B	10 Tage	Mit 14.10.26	Die 27.10.26
432	**UG / TG Bereich B - Abschnitt 2**	**50 Tage**	**Mit 02.09.26**	**Die 10.11.26**
433	Feinaushub Fundamente - Bereich B	10 Tage	Mit 02.09.26	Die 15.09.26
434	Sauberkeitsschichten - Bereich B	5 Tage	Mit 16.09.26	Die 22.09.26
435	Fundamente - Bereich B	15 Tage	Mit 23.09.26	Die 13.10.26
436	Bodenplatten - Bereich B	10 Tage	Mit 14.10.26	Die 27.10.26
437	Wände/Stützen/Unterzüge - Bereich B	10 Tage	Mit 28.10.26	Die 10.11.26
438	**UG / TG Bereich B - Abschnitt 3**	**50 Tage**	**Mit 16.09.26**	**Die 24.11.26**
439	Feinaushub Fundamente - Bereich B	10 Tage	Mit 16.09.26	Die 29.09.26
440	Sauberkeitsschichten - Bereich B	5 Tage	Mit 30.09.26	Die 06.10.26
441	Fundamente - Bereich B	15 Tage	Mit 07.10.26	Die 27.10.26
442	Bodenplatten - Bereich B	10 Tage	Mit 28.10.26	Die 10.11.26
443	Wände/Stützen/Unterzüge - Bereich B	10 Tage	Mit 11.11.26	Die 24.11.26
444	**UG / TG Bereich B - Abschnitt 4**	**50 Tage**	**Mit 30.09.26**	**Die 08.12.26**
445	Feinaushub Fundamente - Bereich B	10 Tage	Mit 30.09.26	Die 13.10.26
446	Sauberkeitsschichten - Bereich B	5 Tage	Mit 14.10.26	Die 20.10.26
447	Fundamente - Bereich B	15 Tage	Mit 21.10.26	Die 10.11.26
448	Bodenplatten - Bereich B	10 Tage	Mit 11.11.26	Die 24.11.26
449	Wände/Stützen/Unterzüge - Bereich B	10 Tage	Mit 25.11.26	Die 08.12.26
450	**UG / TG Bereich B - Abschnitt 5**	**50 Tage**	**Mit 14.10.26**	**Die 22.12.26**
451	Feinaushub Fundamente - Bereich B	10 Tage	Mit 14.10.26	Die 27.10.26
452	Sauberkeitsschichten - Bereich B	5 Tage	Mit 28.10.26	Die 03.11.26
453	Fundamente - Bereich B	15 Tage	Mit 04.11.26	Die 24.11.26
454	Bodenplatten - Bereich B	10 Tage	Mit 25.11.26	Die 08.12.26
455	Wände/Stützen/Unterzüge - Bereich B	10 Tage	Mit 09.12.26	Die 22.12.26
456	**UG / TG Decken Bereich B**	**94 Tage**	**Mit 11.11.26**	**Die 06.04.27**
457	Tiefgaragendecke - Bereich B	30 Tage	Mit 11.11.26	Die 22.12.26
458	Decken über UG - Bereich B	37 Tage	Mit 09.12.26	Die 06.04.27
459	**Bauteil A (EG - 5.OG)**	**204 Tage**	**Mit 04.11.26**	**Die 31.08.27**
460	Wände + Decke EG	25 Tage	Mit 04.11.26	Die 08.12.26
461	Wände + Decke 1.OG	27 Tage	Mit 09.12.26	Die 23.03.27
462	Wände + Decke 2.OG	25 Tage	Mit 24.03.27	Die 27.04.27
463	Wände + Decke 3.OG	25 Tage	Mit 28.04.27	Die 01.06.27
464	Wände + Decke 4.OG	25 Tage	Mit 02.06.27	Die 06.07.27
465	Wände + Decke 5.OG	25 Tage	Mit 07.07.27	Die 10.08.27
466	Aufbauten Dach	15 Tage	Mit 11.08.27	Die 31.08.27
467	**Bauteil B (EG - 4.OG)**	**140 Tage**	**Mit 07.04.27**	**Die 19.10.27**
468	Wände + Decke EG	25 Tage	Mit 07.04.27	Die 11.05.27
469	Wände + Decke 1.OG	25 Tage	Mit 12.05.27	Die 15.06.27
470	Wände + Decke 2.OG	25 Tage	Mit 16.06.27	Die 20.07.27
471	Wände + Decke 3.OG	25 Tage	Mit 21.07.27	Die 24.08.27
472	Wände + Decke 4.OG	25 Tage	Mit 25.08.27	Die 28.09.27
473	Aufbauten Dach	15 Tage	Mit 29.09.27	Die 19.10.27
474	**Verbindungsbereich Bt A zu BT B / Schwindgassen**	**95 Tage**	**Mit 09.06.27**	**Die 19.10.27**
475	TG Rampe	10 Tage	Mit 25.08.27	Die 07.09.27
476	Schwindgasse Wände + Decke über EG	15 Tage	Mit 09.06.27	Die 29.06.27
477	Schwindgasse Wände + Decke über 1.OG	15 Tage	Mit 28.07.27	Die 17.08.27
478	Schwindgasse Wände + Decke über 2.OG	15 Tage	Mit 15.09.27	Die 05.10.27
479	Aufbauten Dach	10 Tage	Mit 06.10.27	Die 19.10.27
480	**Sonstiges**	**75 Tage**	**Mit 25.08.27**	**Die 07.12.27**
481	Auffüllung im UG	10 Tage	Mit 24.11.27	Die 07.12.27
482	Maschinenfundamente	24 Tage	Mit 25.08.27	Die 28.09.27
483	**Gerüststellung (VE 304)**	**421 Tage**	**Mit 28.04.27**	**Don 11.01.29**
506	**Gebäudehülle**	**430 Tage**	**Mit 24.03.27**	**Die 05.12.28**
593	**Gebäudetechnik ELT**	**384 Tage**	**Mit 20.10.27**	**Die 15.05.29**
595	**Gebäudetechnik HLS**	**384 Tage**	**Mit 20.10.27**	**Die 15.05.29**
597	**Innenausbau**	**320 Tage**	**Mit 08.12.27**	**Mit 04.04.29**
617	**Fertigstellung**	**70 Tage**	**Don 05.04.29**	**Mit 11.07.29**
619				
620	**Freianlagen**	**400 Tage**	**Mon 13.03.28**	**Die 09.10.29**
624				
625	**Straßenbaumaßnahme**	**328 Tage**	**Mon 03.04.28**	**Fre 20.07.29**
637				
638	**Betriebsaufnahme**	**50 Tage**	**Don 05.07.29**	**Mit 12.09.29**

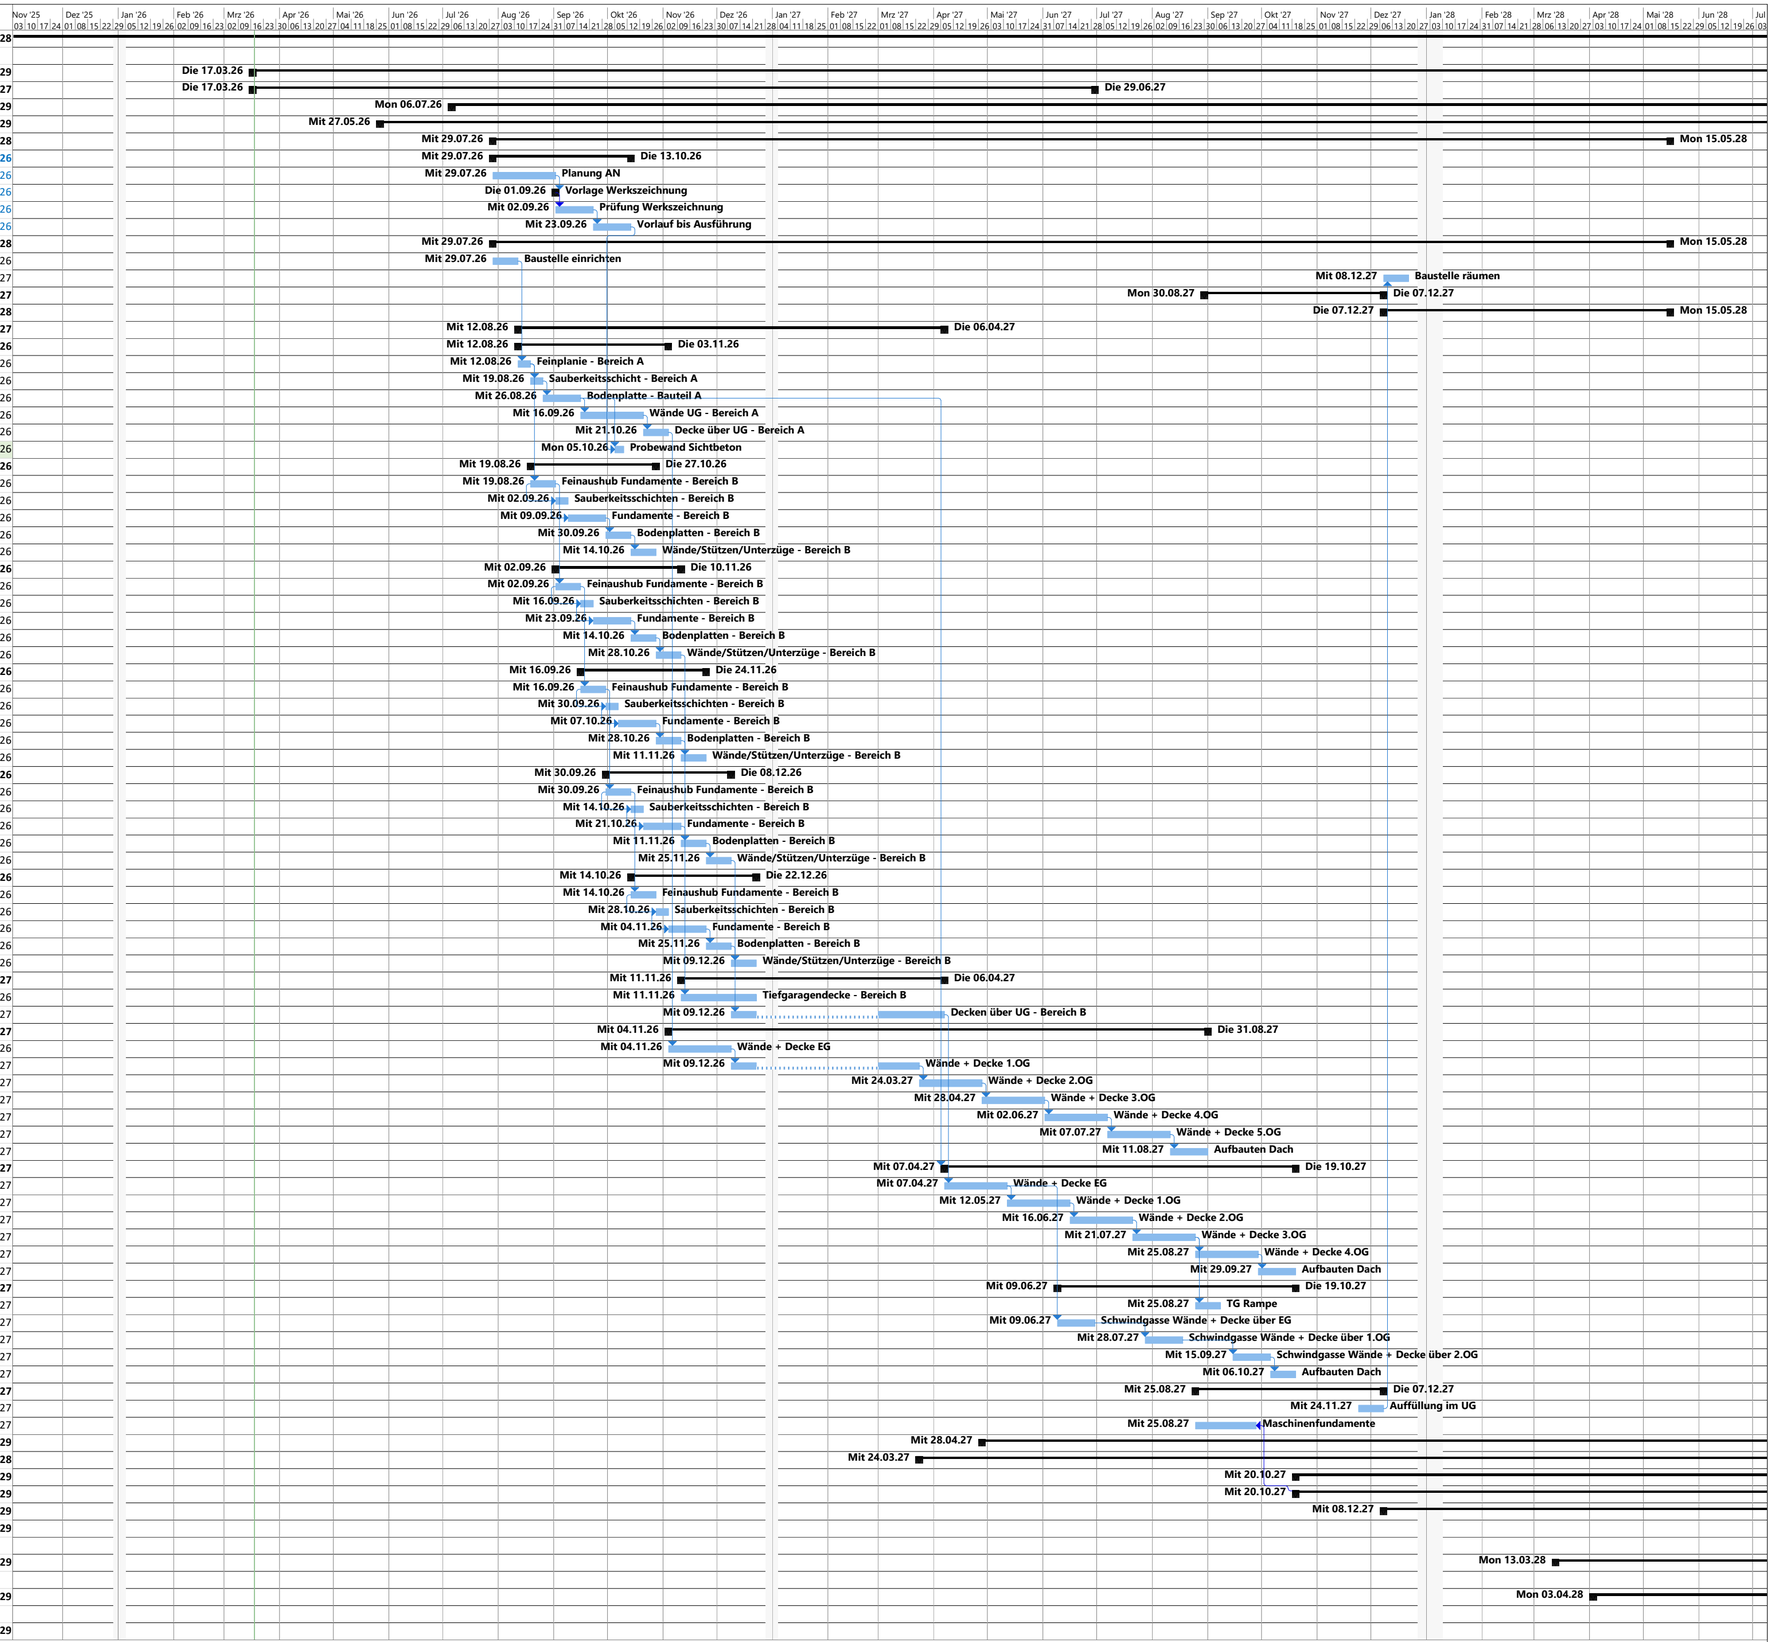

Projekt: Terminplanstandard / Datum: Mit 18.03.26

Vorgang · Meilenstein · Projektsammelvorgang · Inaktiver Meilenstein · Manueller Vorgang · Manueller Sammelrollup · Nur Anfang · Externe Vorgänge · Stichtag · Manueller Fortschritt
Unterbrechung · Sammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Sammelvorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Nur Ende · Externer Meilenstein · In Arbeit
