Projekt: HMT Neubau Pop- und Weltmusik einschl. Cafeteria / Mensa

BAUABLAUFKONZEPT

	Name	Anfang	Ende
1	HMT	30.01.20, 08:00	15.04.27, 1
2	Planung	30.01.20, 08:00	02.04.27, 1
604	LPh 8	03.08.22, 08:00	15.04.27, 1
605	**Bauausführung**	**03.08.22, 08:00**	**15.01.27, 1**
606	Belegung Kranstandort Nordseite	03.03.25, 08:00	05.09.25, 1
610	H1 Vorbereitende Maßnahmen	03.08.22, 08:00	26.02.24, 1
652	H2 Hochbau	20.03.23, 08:00	25.04.25, 1
705	H3 Hülle	12.08.24, 08:00	11.12.26, 17
846	H4 Ausbau	07.07.25, 08:00	15.01.27, 17
847	H4.01 Schlosserarbeiten	21.07.25, 08:00	06.03.26, 1
856	H4.04 Putzarbeiten	07.07.25, 08:00	04.11.25, 17
869	H4.03 Trockenbau	29.09.25, 08:00	24.07.26, 1
870	Wände Vorsatzschalen 2.OG Sanitärräume	29.09.25, 08:00	01.10.25, 17
871	Wände Vorsatzschalen 1.OG Sanitärräume	02.10.25, 08:00	07.10.25, 1
872	Wände Vorsatzschalen ZG Sanitärräume	08.10.25, 08:00	10.10.25, 17
873	Wände Vorsatzschalen EG Sanitärräume	13.10.25, 08:00	15.10.25, 17
874	Verschluss W+VS, 2.OG Sanitärräume	30.10.25, 08:00	03.11.25, 17
875	Verschluss W+VS, 1.OG Sanitärräume	27.11.25, 08:00	02.12.25, 1
876	Verschluss W+VS, ZG Sanitärräume	05.01.26, 08:00	07.01.26, 1
877	Verschluss W+VS, EG Sanitärräume	22.01.26, 08:00	26.01.26, 1
878	Wände 2.OG UK + 1 Seite	17.10.25, 08:00	03.11.25, 17
879	Wände 1.OG UK + 1 Seite	04.11.25, 08:00	14.11.25, 17
880	Wände ZG UK + 1 Seite	17.11.25, 08:00	28.11.25, 17
881	Wände EG UK + 1 Seite	01.12.25, 08:00	08.12.25, 1
882	Wände 2.OG 2. Seite, Vorsatzschalen	05.12.25, 08:00	25.12.25, 1
883	Wände 1.OG 2. Seite, Vorsatzschalen	05.01.26, 08:00	20.03.26, 1
884	Wände ZG 2. Seite, Vorsatzschalen	30.01.26, 08:00	02.04.26, 1
885	Wände EG 2. Seite, Vorsatzschalen	02.03.26, 08:00	01.05.26, 1
886	GK-Decke 2. OG, UK + Bepl.	06.05.26, 08:00	07.05.26, 1
887	Schallschutz-GK-Decke 1. OG, UK + Bepl.	19.05.26, 08:00	29.05.26, 1
888	Schallschutz-GK-Decke ZG, UK + Bepl.	11.06.26, 08:00	23.06.26, 1
889	Schallschutz-GK-Decke EG, UK + Bepl.	06.07.26, 08:00	13.07.26, 1
890	Akustikdecke 2. OG, UK + Beplankung	25.05.26, 08:00	12.06.26, 1
891	Akustikdecke 1. OG, UK + Beplankung	15.06.26, 08:00	02.07.26, 1
892	Akustikdecke ZG, UK + Beplankung	24.06.26, 08:00	15.07.26, 1
893	Akustikdecke EG, UK + Beplankung	14.07.26, 08:00	24.07.26, 1
894	Metalldecke Küche 2. OG, UK + Bepl.	16.06.26, 08:00	06.07.26, 1
895	Rasterdecke Küche 2. OG	07.07.26, 08:00	20.07.26, 1
896	H4.05 Estrich	03.03.26, 08:00	07.08.26, 1
897	Doppelboden Lüftungszentrale	03.03.26, 08:00	23.03.26, 1
898	Abdichtung 2.OG	23.03.26, 08:00	06.04.26, 1
899	Estrich 2.OG	30.03.26, 08:00	17.04.26, 1
900	Estrich 2.OG Trocknung	20.04.26, 08:00	05.06.26, 1
901	Estrich 1.OG	20.04.26, 08:00	12.05.26, 1
902	Estrich 1.OG Trocknung	13.05.26, 08:00	30.06.26, 1
903	Estrich ZG	13.05.26, 08:00	01.06.26, 1
904	Estrich ZG Trocknung	02.06.26, 08:00	20.07.26, 1
905	Abdichtung EG	04.05.26, 08:00	22.05.26, 1
906	Estrich EG	02.06.26, 08:00	19.06.26, 1
907	Estrich EG Trocknung	22.06.26, 08:00	07.08.26, 1
908	H4.02 Innentüren	01.06.26, 08:00	01.01.27, 17
909	Innentüren 2.OG Holzzarge	01.06.26, 08:00	12.06.26, 1
910	Innentüren 1.OG Holzzarge	15.06.26, 08:00	26.06.26, 1
911	Innentüren ZG Holzzarge	29.06.26, 08:00	10.07.26, 1
912	Innentüren EG Holzzarge	14.07.26, 08:00	27.07.26, 1
913	Innentüren 2.OG Türblatt	31.08.26, 08:00	04.09.26, 1
914	Innentüren 1.OG Türblatt	07.09.26, 08:00	11.09.26, 1
915	Innentüren ZG Türblatt	18.09.26, 08:00	24.09.26, 1
916	Innentüren EG Türblatt	25.09.26, 08:00	01.10.26, 1
917	Innentüren Endkomplettierung	28.12.26, 08:00	01.01.27, 17
918	H4.06 Fliesen	11.05.26, 08:00	11.08.26, 1
919	Fliesen 2.OG Wand	11.05.26, 08:00	05.06.26, 1
920	Fliesen 2.OG Boden	08.06.26, 08:00	15.06.26, 1
921	Fliesen 1.OG Wand	29.06.26, 08:00	06.07.26, 1
922	Fliesen 1.OG Boden	07.07.26, 08:00	08.07.26, 1
923	Fliesen ZG Wand	13.07.26, 08:00	21.07.26, 1
924	Fliesen ZG Boden	22.07.26, 08:00	23.07.26, 1
925	Fliesen EG Wand	28.07.26, 08:00	07.08.26, 1
926	Fliesen EG Boden	10.08.26, 08:00	11.08.26, 1
927	H4.10 Bodenbelag Beschichtung	01.06.26, 08:00	12.06.26, 1
928	Beschichtung EG	01.06.26, 08:00	12.06.26, 1
929	H4.07 Maler	15.06.26, 08:00	07.08.26, 1
930	Maler 2.OG Wand	15.06.26, 08:00	26.06.26, 1
931	Maler 1.OG Wand	29.06.26, 08:00	10.07.26, 1
932	Maler ZG Wand	13.07.26, 08:00	24.07.26, 1
933	Maler EG Wand	27.07.26, 08:00	07.08.26, 1
934	H4.08 Bodenbelag Parkett	29.06.26, 08:00	23.09.26, 1
935	Parkett 2.OG, 195 qm	29.06.26, 08:00	24.07.26, 1
936	Verlegung Team 1	29.06.26, 08:00	14.07.26, 1
937	Schleifen	15.07.26, 08:00	21.07.26, 1
938	Ölen	22.07.26, 08:00	24.07.26, 1
939	Parkett 1.OG, 450 qm	15.07.26, 08:00	01.09.26, 1
940	Verlegung Team 1	15.07.26, 08:00	07.08.26, 1
941	Verlegung Team 2	15.07.26, 08:00	07.08.26, 1
942	Schleifen	10.08.26, 08:00	24.08.26, 1
943	Ölen	25.08.26, 08:00	01.09.26, 1
944	Parkett ZG, 270 qm	10.08.26, 08:00	17.09.26, 1
945	Verlegung Team 1	10.08.26, 08:00	02.09.26, 1
946	Schleifen	03.09.26, 08:00	11.09.26, 1
947	Ölen	14.09.26, 08:00	17.09.26, 1
948	Parkett EG, 320 qm	10.08.26, 08:00	23.09.26, 1
949	Verlegung Team 2	10.08.26, 08:00	07.09.26, 1
950	Schleifen	08.09.26, 08:00	17.09.26, 1
951	Ölen	18.09.26, 08:00	23.09.26, 1
952	H4.18 Bühnenboden	20.07.26, 08:00	28.08.26, 1
953	Abdichtung	20.07.26, 08:00	24.07.26, 1
954	Einbau Probebühne EG	27.07.26, 08:00	07.08.26, 1
955	Einbau Anlieferung EG	10.08.26, 08:00	21.08.26, 1
956	Schleifen + Ölen	24.08.26, 08:00	28.08.26, 1
957	H4.09 Bodenbelag Linoleum + Teppich	10.08.26, 08:00	08.10.26, 1
958	Linoleum/Teppich 2.OG	10.08.26, 08:00	28.08.26, 1
959	Linoleum/Teppich 1.OG	02.09.26, 08:00	15.09.26, 1
960	Linoleum/Teppich ZG	18.09.26, 08:00	08.10.26, 1
961	H4.11 Tischlerarbeiten	31.08.26, 08:00	23.10.26, 1
962	Einbaumöbel 2.OG	31.08.26, 08:00	15.09.26, 1
963	Einbaumöbel 1.OG	16.09.26, 08:00	01.10.26, 1
964	Einbaumöbel ZG	02.10.26, 08:00	13.10.26, 1
965	Einbaumöbel EG	14.10.26, 08:00	23.10.26, 1
966	H4.12 Sanitärtrennwände	12.08.26, 08:00	25.08.26, 1
967	Sanitärtrennwände	12.08.26, 08:00	25.08.26, 1
968	H4.13 Beschilderung	19.10.26, 08:00	30.10.26, 1
969	Beschilderung	19.10.26, 08:00	30.10.26, 1
970	H5.01 Blendschutz	19.10.26, 08:00	30.10.26, 1
971	Blendschutz	19.10.26, 08:00	30.10.26, 1
972	H4.15 Schließanlage	04.01.27, 08:00	15.01.27, 17
974	H4.16 Endreinigung	04.01.27, 08:00	15.01.27, 17
976	HLSE	12.08.24, 08:00	19.03.27, 1
1035	Übergabe /Inbetriebnahme	29.07.26, 08:00	22.03.27, 1

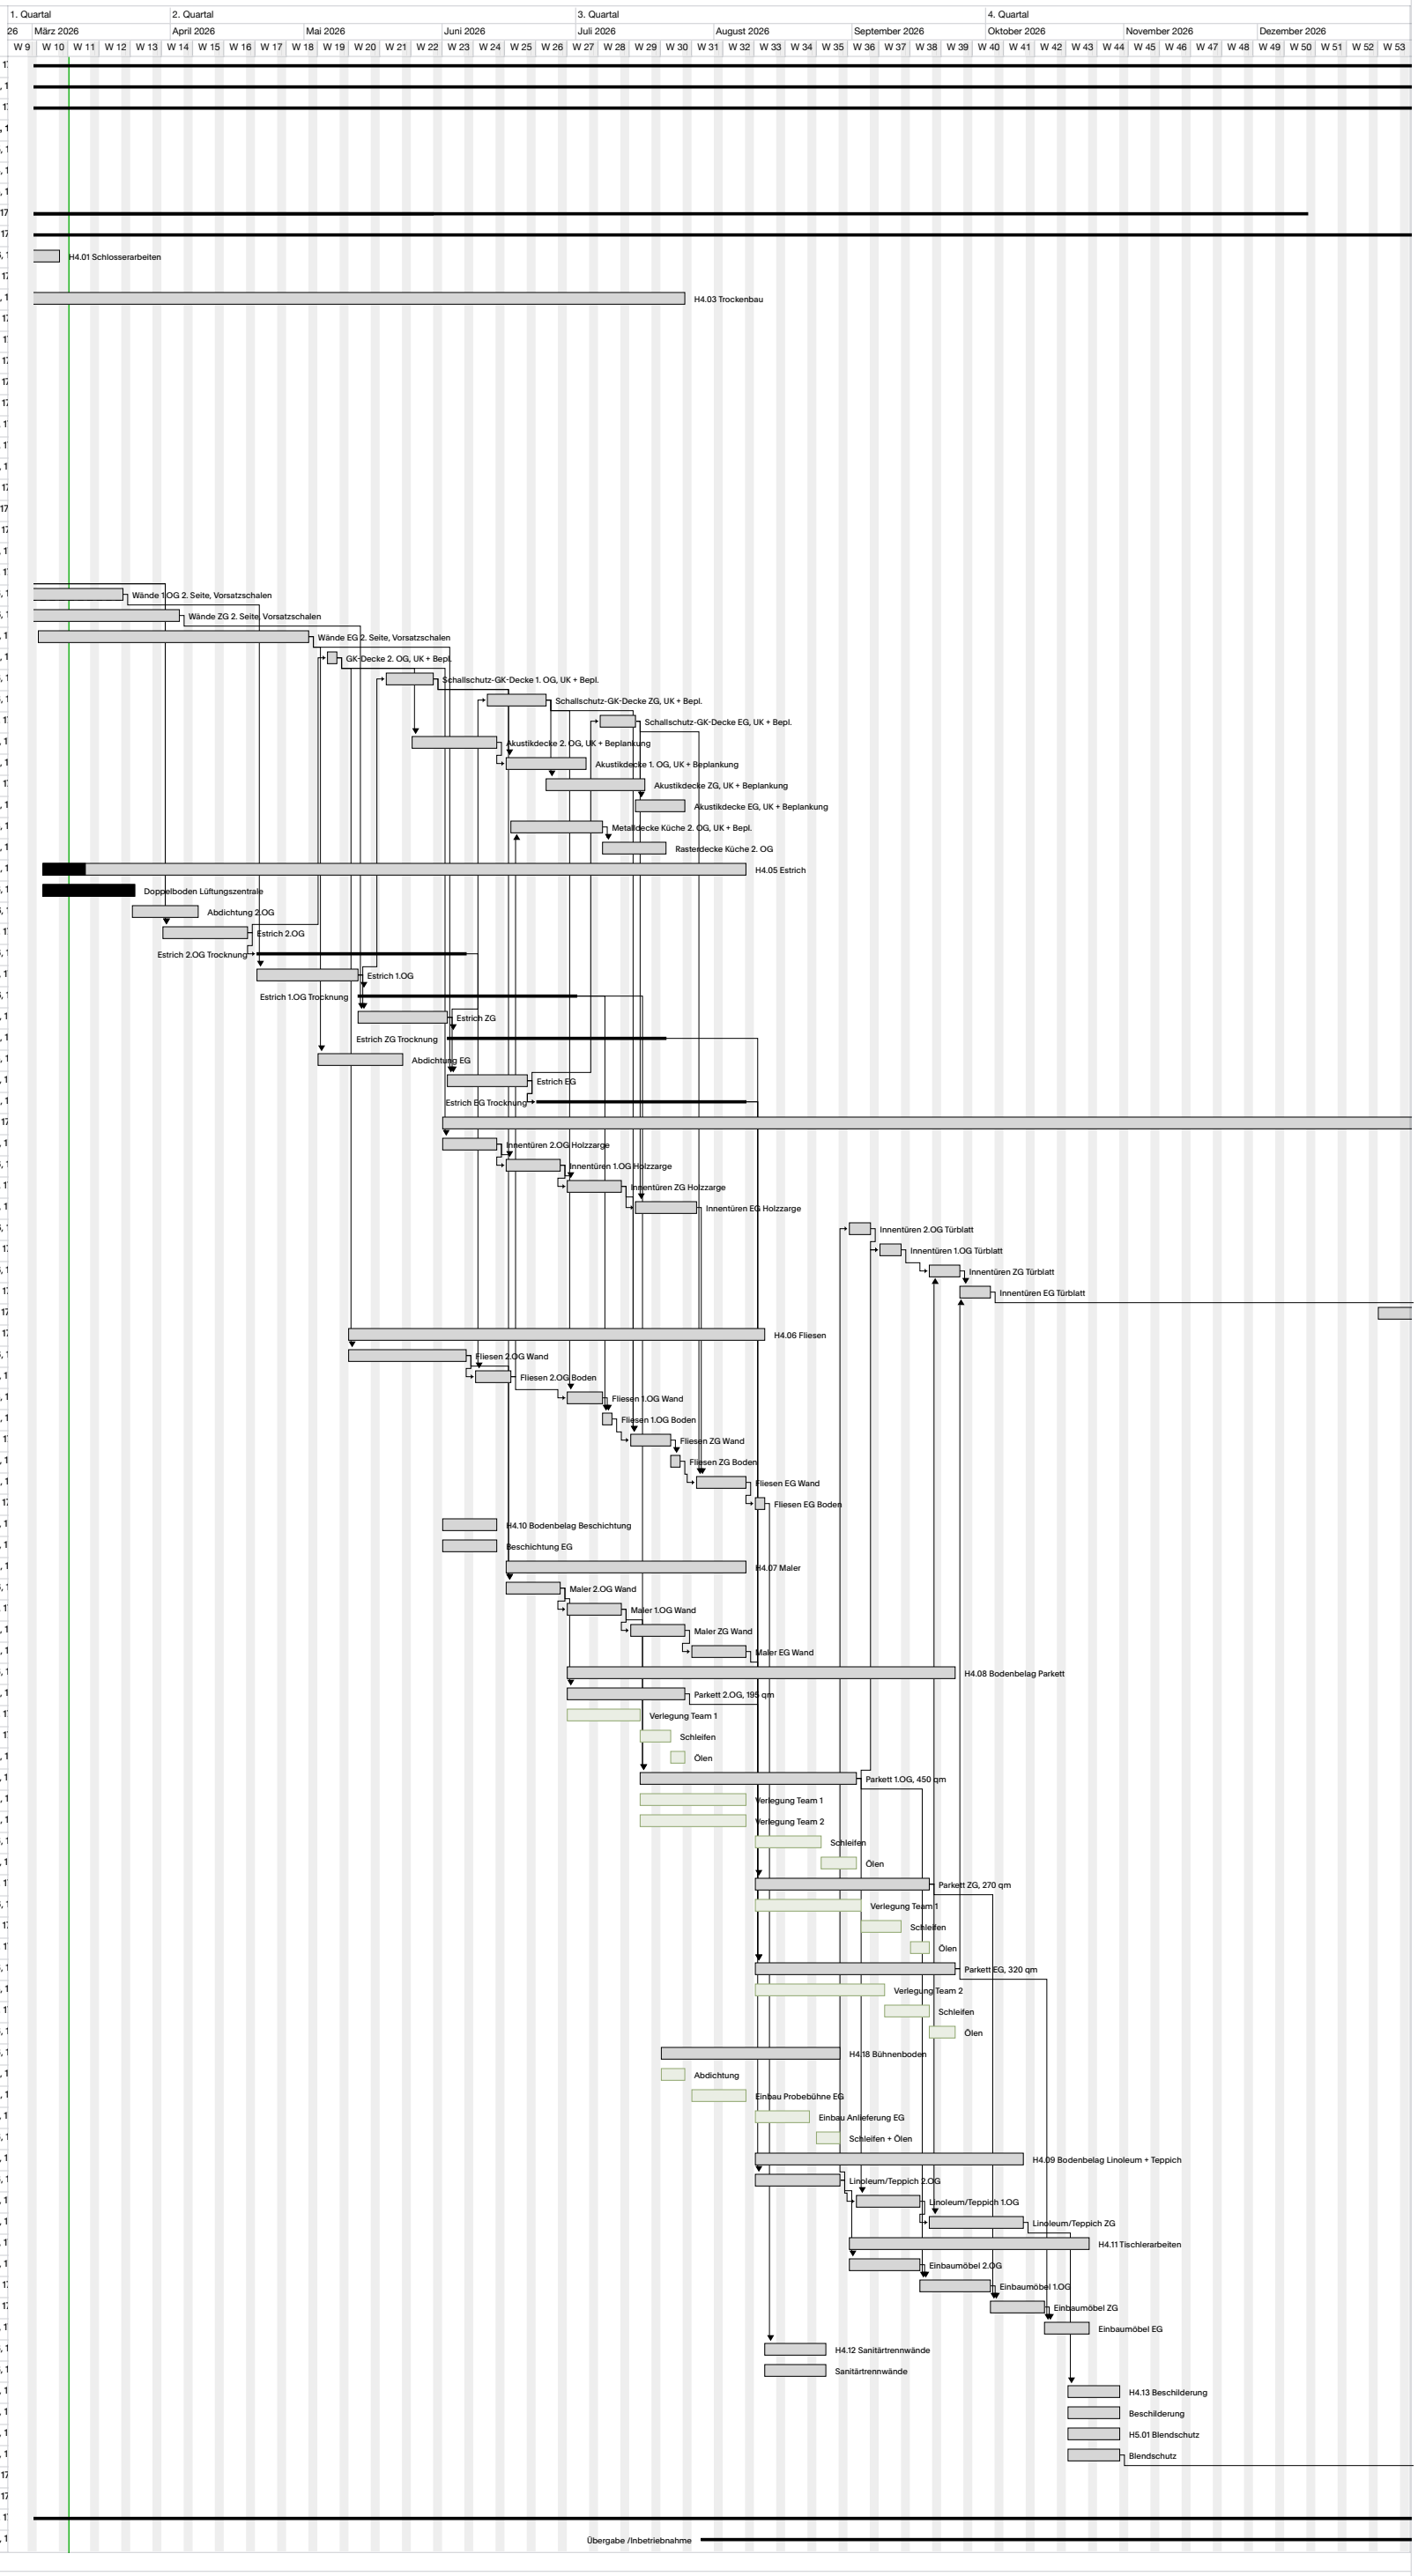

Stand: 09.03.26
