Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Zur Ahrensdorfer Heide	311 d	Mon 09.03.26	Fre 04.06.27
2	Erdbau	53 d	Mon 09.03.26	Die 26.05.26
3	Erdbau	53 d	Mon 09.03.26	Die 26.05.26
4	Baustelleneinrichtung	5 d	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26
5	Vorbereitenden Arbeiten, Baugrubenaushub, Übergabe Planum	10 d	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26
6	Erdbau für Regenentwässerungsanlagen	10 d	Mon 30.03.26	Die 14.04.26
7	Bauwerk Verfüllung inkl. Drainage	10 d	Mon 11.05.26	Die 26.05.26
8	Gebäudehülle	201 d	Mon 16.03.26	Fre 08.01.27
9	Rohbau	133 d	Mon 16.03.26	Die 22.09.26
10	Baustelleneinrichtung	10 d	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26
11	Grundleitungen	8 d	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26
12	Fundamente, Bodenplatte Achse A-C	20 d	Mon 13.04.26	Fre 08.05.26
13	Fundamente, Bodenplatte Achse C-D	23 d	Mon 30.03.26	Fre 01.05.26
14	Stb.-Wände und Attika Achse C-D	48 d	Mon 27.04.26	Fre 03.07.26
15	Stb.-Wände EG Achse A-C	23 d	Mon 04.05.26	Fre 05.06.26
16	Decke über EG Achse A-C	15 d	Mon 01.06.26	Fre 19.06.26
17	Stb.-Wände 1.OG Achse A-C	15 d	Mon 22.06.26	Fre 10.07.26
18	Decke über 1. OG Achse A-C	15 d	Mon 06.07.26	Fre 24.07.26
19	Mauerwerksarbeiten	15 d	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26
20	Attika Achse A-C	15 d	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26
21	Einbau Schornstein	5 d	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26
22	Wand EG - Schließen Krandurchfahrt	2 d	Mon 21.09.26	Die 22.09.26
23	Abbau Fassadengerüst	1 W	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26
24	Zimmerer/ Dachtragwerk	70 d	Mon 15.06.26	Fre 18.09.26
25	Herstellung Binder	50 d	Mon 15.06.26	Fre 21.08.26
26	BSH-Bindermontage komplett inkl. Druckstreben, Spannstähle usw.	10 d	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
27	Trapezblech	10 d	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
28	Dachdecker/Dachklempner	85 d	Mon 31.08.26	Fre 08.01.27
29	Funktionstrakt	85 d	Mon 31.08.26	Fre 08.01.27
30	Voranstrich	5 d	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26
31	Dampfsperre	10 d	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
32	Dämmung und 1. und 2.Abdichtungslage	20 d	Mon 21.09.26	Fre 16.10.26
33	Attika dämmen und abdichten	10 d	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
34	Attikaabdeckung	10 d	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26
35	Restleistungen	10 d	Mon 14.12.26	Fre 08.01.27
36	Halle	65 d	Mon 14.09.26	Fre 11.12.26
37	Einbau Dachfenster RWA	5 d	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
38	Sickendämmung und Dampfsperre	15 d	Mon 14.09.26	Fre 02.10.26
39	Dämmung und 1. und 2.Abdichtungslage	15 d	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26
40	Attika dämmen und abdichten	15 d	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26
41	Attikaabdeckung	10 d	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26
42	Abdichtung Bodenplatte Funktionstrakt	5 d	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
43	Abdichtung Bodenplatte Halle	10 d	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26
44	Fenster, Außentüren	71 d	Don 21.05.26	Fre 28.08.26
45	Erstellung und Übergabe WMP	10 d	Don 21.05.26	Fre 05.06.26
46	Prüfung und Freigabe WMP	5 d	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26
47	Montage Fenster EG	5 d	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
48	Montage Fenster 1.OG	10 d	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
49	Montage Profilbauglas	15 d	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26
50	Fensterbänke innen Profilbauglas	5 d	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26
51	Pfosten Riegel Fassade	79 d	Mon 18.05.26	Fre 04.09.26
52	Erstellung und Übergabe WMP	15 d	Mon 18.05.26	Die 09.06.26
53	Prüfung und Freigabe WMP	9 d	Die 09.06.26	Fre 19.06.26
54	Montage PRF - ohne Türblätter	10 d	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
55	Montage PRF - Türblätter	5 d	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26
56	Fassadenarbeiten	65 d	Mon 31.08.26	Fre 27.11.26
57	Vorbereiten/Schützen/Ausgleichen	10 d	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26
58	Dämmung	20 d	Mon 14.09.26	Fre 09.10.26
59	Fensterbänke	10 d	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
60	Armierung inkl. Eckwinkel etc.	15 d	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26
61	Verolithprofil	10 d	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26
62	Putzen	10 d	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
63	Klinkerriemchen	20 d	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26
64	Farbbeschichtung Fassade	10 d	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26
65	Innenausbau	273 d	Don 26.03.26	Fre 30.04.27
66	Metallbau, Schlosser	75 d	Mon 26.10.26	Fre 19.02.27
67	Erstellung und Übergabe WMP	10 d	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26
68	Treppengeländer	10 d	Mon 07.12.26	Mon 04.01.27
69	Abdeckung Technikgrube	2 d	Mon 25.01.27	Die 26.01.27
70	Dachaufstiegsleiter	3 d	Mon 14.12.26	Mit 16.12.26
71	Geländer - Tribüne - UK	10 d	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26
72	Glasgeländer Endmontage	5 d	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27
73	Innenputz	20 d	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26
74	Vorbereitung, Bauteilschutz, Eckschutzschiene	5 d	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
75	Innenputz EG	5 d	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26
76	Innenputz 1.OG	10 d	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
77	Trockenbau	90 d	Mon 28.09.26	Fre 12.02.27
78	UK inkl. Einseitiges Beplanken EG	5 d	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
79	UK inkl. Einseitiges Beplanken 1.OG	10 d	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
80	Schließen Wände EG	5 d	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26
81	Schließen Wände 1.OG	10 d	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26
82	Spachteln Wände EG und OG	10 d	Mon 01.02.27	Fre 12.02.27
83	Nacharbeiten	5 d	Mon 04.01.27	Fre 08.01.27
84	TGA	258 d	Don 26.03.26	Fre 09.04.27
85	HLS	180 d	Mon 20.07.26	Fre 09.04.27
86	Erstellung WMP	19 d	Mon 20.07.26	Fre 14.08.26
87	Prüfung u. Freigabe WMP	9 d	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
88	Baustelleneinrichtung u. Vorbereitung	4 d	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
89	Regenentwässerung Hallenseite	5 d	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
90	Regenentwässerung Funktionstrakt	10 d	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
91	Montage Stränge, Hauptverteilung, Vorwan	15 d	Mon 12.10.26	Fre 30.10.26
92	Unterverteilung, (Freigabe Schließung GK-W	15 d	Mon 09.11.26	Fre 27.11.26
93	Montage Lüftung Halle	15 d	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26
94	Montage Heizzentrale	20 d	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26
95	Verlegung Fußbodenheizung EG	5 d	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26
96	Verlegung Fußbodenheizung OG	5 d	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27
97	Inbetriebnahme Heizung	5 d	Mon 04.01.27	Fre 08.01.27
98	Objektmontage, Heizkörper, Luftauslässe	20 d	Mon 15.03.27	Fre 09.04.27
99	Elektro	190 d	Mon 22.06.26	Fre 26.03.27
100	Erstellung WMP	15 d	Mon 22.06.26	Mon 13.07.26
101	Prüfung u. Freigabe WMP	10 d	Mon 13.07.26	Mon 27.07.26
102	Baustelleneinrichtung u. Vorbereitung	4 d	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26
103	Schlitzarbeiten/Leerrohre in KS-Wänden u.	4 d	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26
104	Leitungsverlegung Aussenwände vor Dämm	4 d	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
105	Trassenmontage, Leitungen Funktionstrakt	15 d	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26
106	Leitungsverlegung auf Rohfußboden, im Be	20 d	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26
107	Lampenmontage und Trassen in Halle	15 d	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26
108	PV-Anlage	20 d	Mon 09.11.26	Fre 04.12.26
109	Objektmontage (Bestückung/Verteilung)	20 d	Mon 18.01.27	Fre 12.02.27
110	Komplettierung/Beschriftung	15 d	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27
111	Inbetriebnahme	10 d	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27
112	Aufzug	193 d	Don 26.03.26	Fre 08.01.27
113	Erstellung, Prüfung u. Freigabe WMP	5 d	Don 26.03.26	Don 02.04.26
114	Übergabe Einbauschiene u. -Anker an Rohb	1 d	Mon 13.04.26	Mon 13.04.26
115	Montage	15 d	Mon 07.12.26	Fre 08.01.27
116	Estrich	43 d	Mit 02.12.26	Fre 12.02.27
117	Estrichwinkel	3 d	Mit 02.12.26	Mon 07.12.26
118	Verlegung Dämmung EG	5 d	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26
119	Verlegung Dämmung 1.OG	5 d	Mon 04.01.27	Fre 08.01.27
120	Estricheinbau EG	5 d	Mon 04.01.27	Fre 08.01.27
121	Abbinden Estrich/Belegreife EG	15 d	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27
122	Verlegung Dämmung 1.OG	5 d	Mon 04.01.27	Fre 08.01.27
123	Estricheinbau 1.OG	5 d	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27
124	Abbinden Estrich/Belegreife 1.OG	15 d	Mon 25.01.27	Fre 12.02.27
125	Maler	144 d	Mon 28.09.26	Fre 30.04.27
126	Anstrich Technikräume	5 d	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
127	Vorbereitung, Vlies, 1.Anstrich EG	20 d	Mon 18.01.27	Fre 12.02.27
128	Vorbereitung, Vlies, 1.Anstrich 1.OG	20 d	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27
129	Endanstrich	10 d	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27
130	Nacharbeiten	9 d	Mon 19.04.27	Fre 30.04.27
131	Innentüren	85 d	Mon 12.10.26	Fre 19.02.27
132	Erstellung und Übergabe WMP	15 d	Mon 12.10.26	Fre 30.10.26
133	Montage EG	10 d	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27
134	Montage 1.OG	10 d	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27
135	Fliesen	30 d	Mon 01.02.27	Fre 12.03.27
136	Vorbereitung u. Abdichtung EG	5 d	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27
137	Fliesenverlegung EG	10 d	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27
138	Vorbereitung u. Abdichtung 1.OG	5 d	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27
139	Fliesenverlegung 1.OG	15 d	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27
140	Bodenbelag	25 d	Mon 08.02.27	Fre 12.03.27
141	Ausgleich EG	5 d	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27
142	Bodenbelag EG	5 d	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27
143	Ausgleich 1.OG	5 d	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27
144	Bodenbelag 1.OG	10 d	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27
145	Tischler	60 d	Mon 18.01.27	Fre 09.04.27
146	Erstellung und Übergabe WMP	10 d	Mon 01.02.27	Fre 12.02.27
147	Tribüne	10 d	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27
148	Teeküche	10 d	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27
149	Sitzbänke - Umkleide	10 d	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27
150	Mobile Trennwand	10 d	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27
151	Fensterbänke - Innen	5 d	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27
152	Sportboden	135 d	Mon 17.08.26	Fre 05.03.27
153	Erstellung und Übergabe WMP	9 d	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
154	Prüfung und Freigabe WMP	6 d	Fre 28.08.26	Fre 04.09.26
155	Lieferzeit	59 d	Mon 31.08.26	Fre 20.11.26
156	Unterbau	20 d	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26
157	Belag	15 d	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27
158	Finish und Markierungen	10 d	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27
159	Prallwand	125 d	Mon 05.10.26	Fre 09.04.27
160	Erstellung und Übergabe WMP	10 d	Mon 05.10.26	Mon 19.10.26
161	Prüfung und Freigabe WMP	5 d	Mon 19.10.26	Mon 26.10.26
162	Lieferzeit	60 d	Mon 26.10.26	Mon 01.02.27
163	Montage UK	15 d	Mon 18.01.27	Fre 05.02.27
164	Montage Prallwand	15 d	Mon 01.02.27	Fre 19.02.27
165	Verkleidung Besprechungsraum	10 d	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27
166	Verleistung	10 d	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27
167	Sportgeräte	161 d	Mon 03.08.26	Mon 29.03.27
168	Erstellung und Übergabe WMP	10 d	Mon 03.08.26	Mon 17.08.26
169	Prüfung und Freigabe WMP	5 d	Mon 17.08.26	Mon 24.08.26
170	Lieferzeit	60 d	Mon 24.08.26	Mon 16.11.26
171	Bodenhülsen	5 d	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26
172	UK Sportgeräte	10 d	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27
173	Sportgeräte: Liefern und Montieren	15 d	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27
174	Abnahme	1 d	Mon 29.03.27	Mon 29.03.27
175	Trennvorhang und Ballfangnetz	90 d	Mon 09.11.26	Fre 26.03.27
176	Erstellung und Übergabe WMP	10 d	Mon 09.11.26	Mon 23.11.26
177	Prüfung und Freigabe WMP	5 d	Mon 23.11.26	Mon 30.11.26
178	Lieferzeit	60 d	Mon 30.11.26	Mon 08.03.27
179	Trennvorhang	10 d	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27
180	Ballfangnetz	5 d	Mon 22.03.27	Fre 26.03.27
181	Möblierung / Ausstattung	80 d	Mon 07.12.26	Fre 09.04.27
182	Erstellung und Übergabe WMP	10 d	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26
183	Lieferung	60 d	Mon 04.01.27	Mon 29.03.27
184	Montage und Aufbau	10 d	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27
185	Beschilderung	50 d	Mon 18.01.27	Fre 26.03.27
186	Erstellung und Übergabe WMP	10 d	Mon 18.01.27	Mon 01.02.27
187	Montage Beschilderung	10 d	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27
188	Schließanlage	45 d	Mon 01.03.27	Fre 30.04.27
189	Erstellung Schließplan	10 d	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27
190	Abstimmung Schließplan	10 d	Mon 15.03.27	Mon 29.03.27
191	Lieferung, Einbau, Montage	5 d	Mon 26.04.27	Fre 30.04.27
192	Reinigung	35 d	Mon 15.03.27	Fre 30.04.27
193	Grobreinigung	10 d	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27
194	Baufeinreinigung	15 d	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27
195	Abnahme / Übergabe an AG	25 d	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27
196	Bauabnahmen u. Mängelbeseitigung	15 d	Mon 03.05.27	Fre 21.05.27
197	Prüfungen	10 d	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27
198	öfft rechtl. Abnahmen	10 d	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27
199	Übergabe an den AG	5 d	Mon 31.05.27	Fre 04.06.27

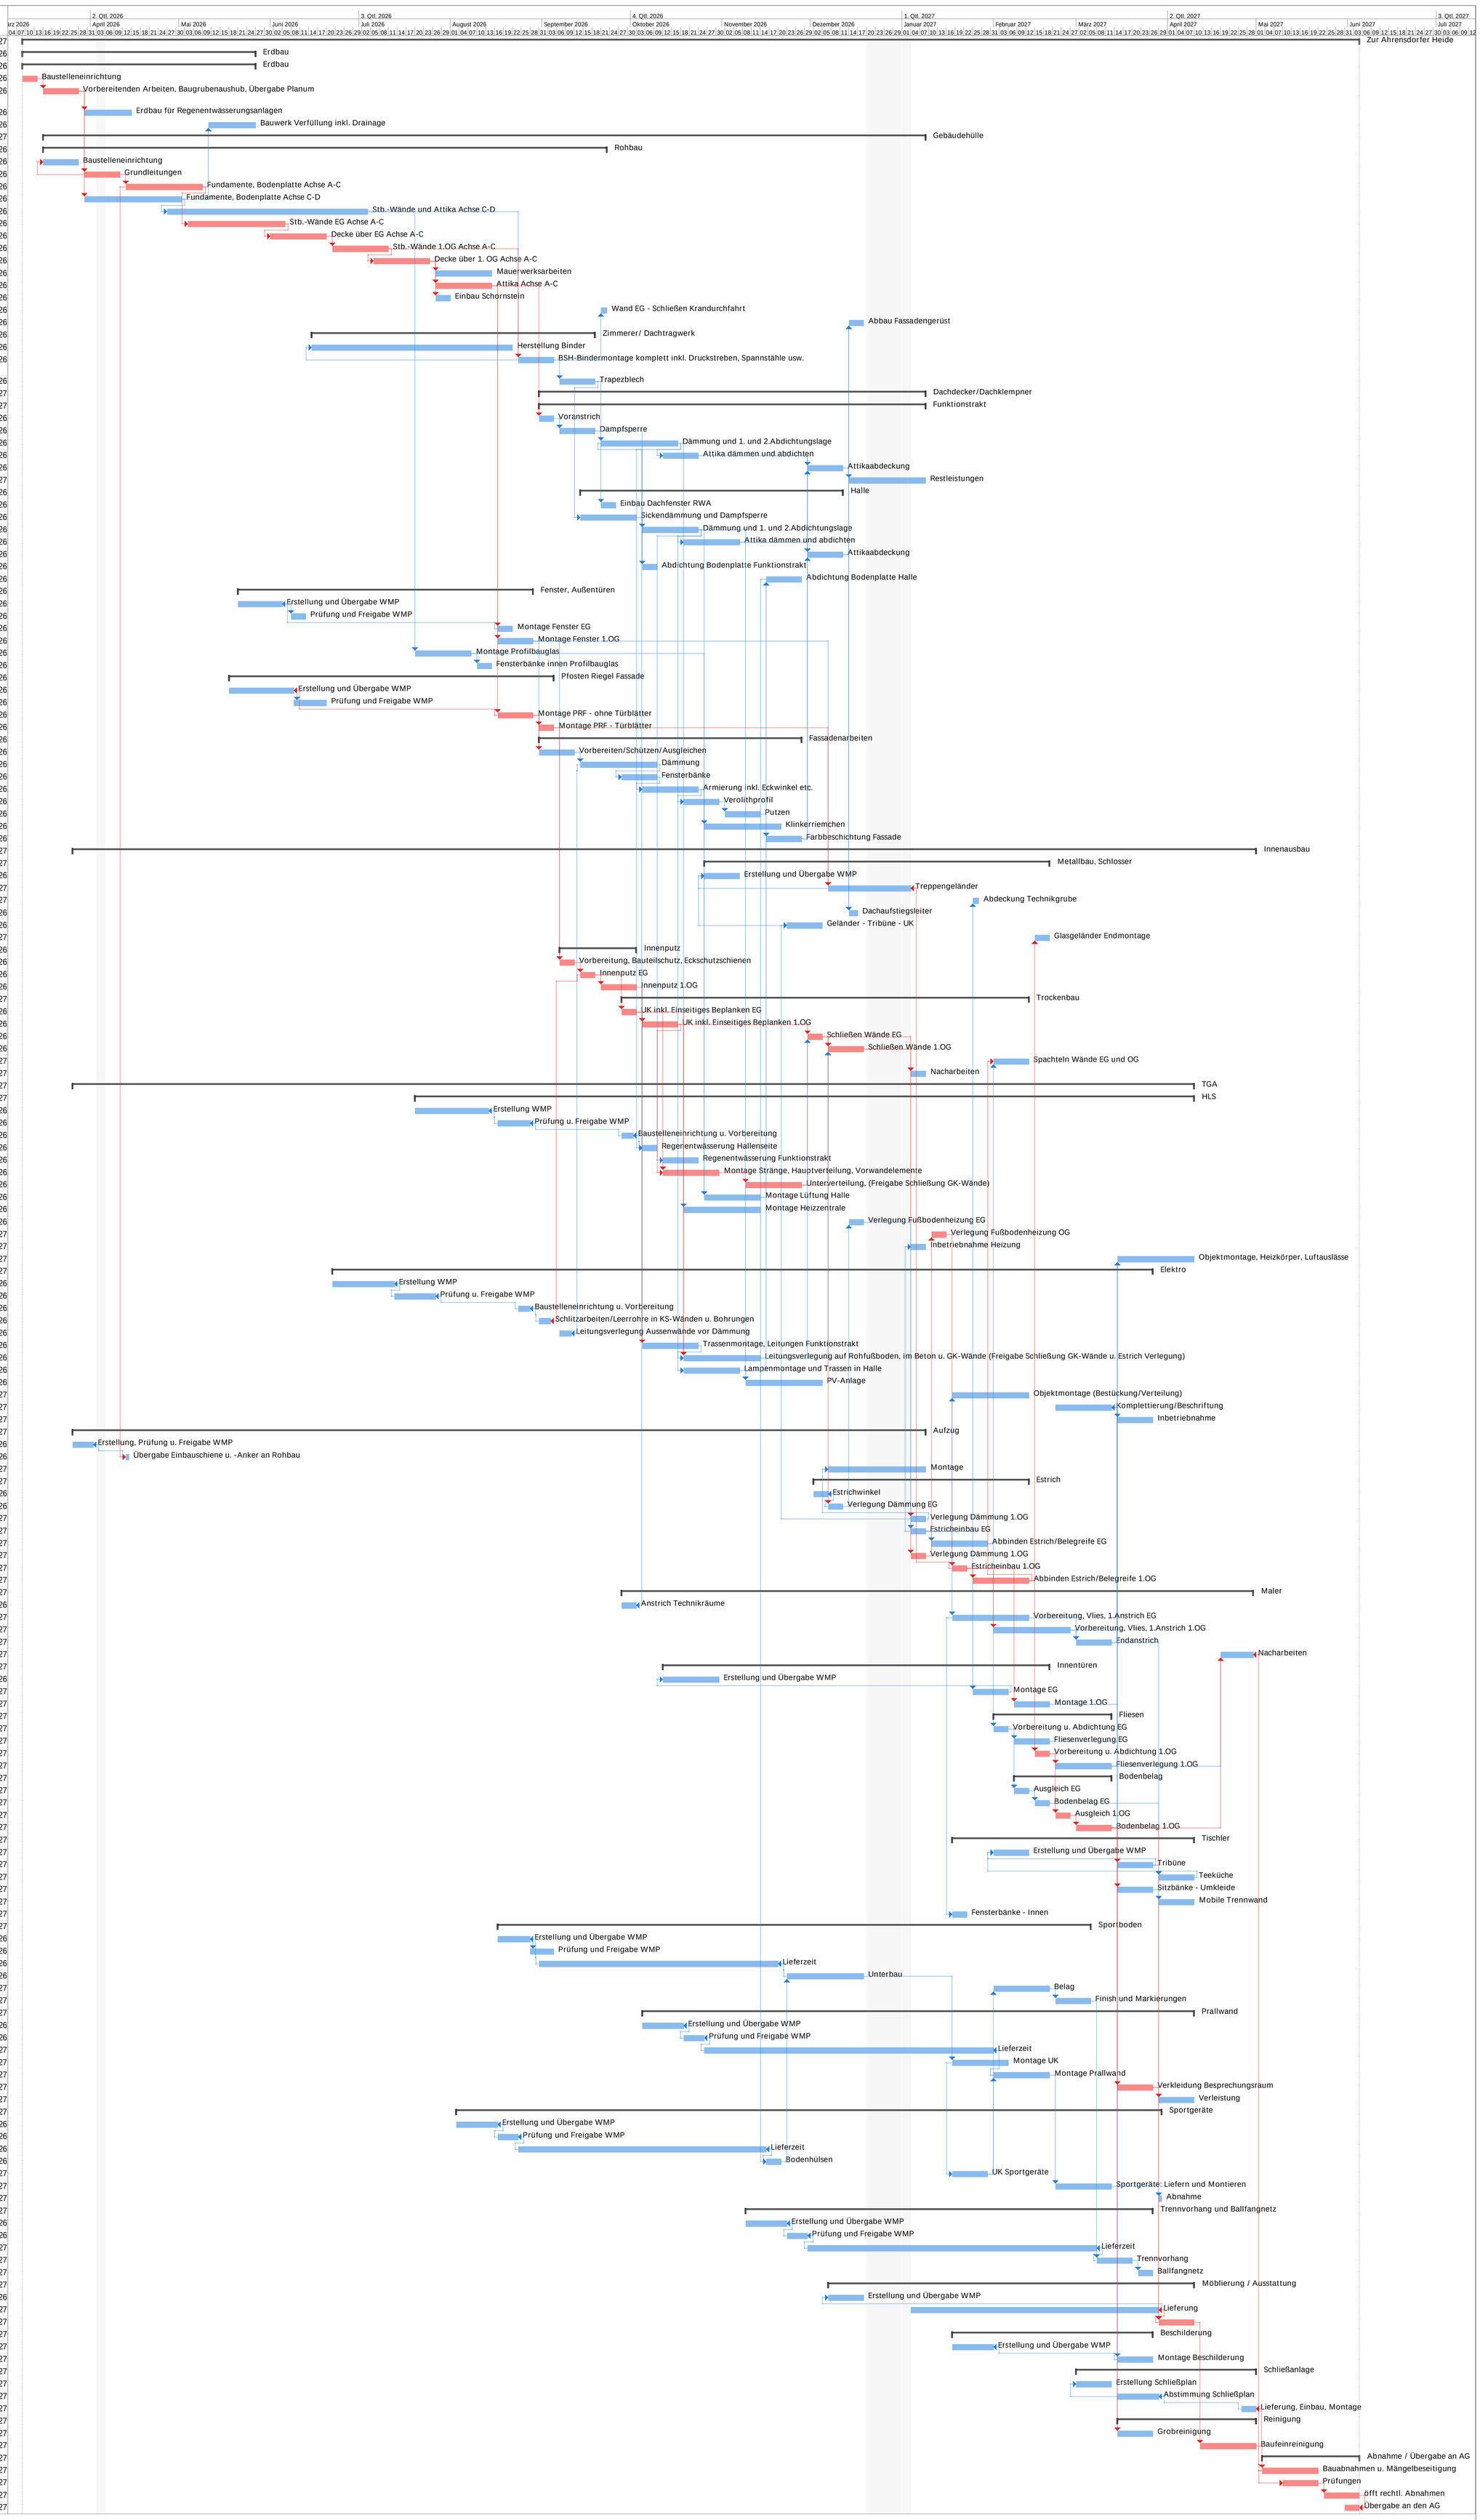

Projekt: Neubau einer Sportha
Datum: Don 22.01.26

Vorgang · Meilenstein · Projektsammelvorgang · Inaktiver Meilenstein · Manueller Vorgang · Manueller Sammelrollup · Nur Anfang · Externe Vorgänge · Stichtag · Kritische Unterbrechung · Manueller Fortschritt
Unterbrechung · Sammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Sammelvorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelvorgang · Nur Ende · Externer Meilenstein · Kritisch · In Arbeit
