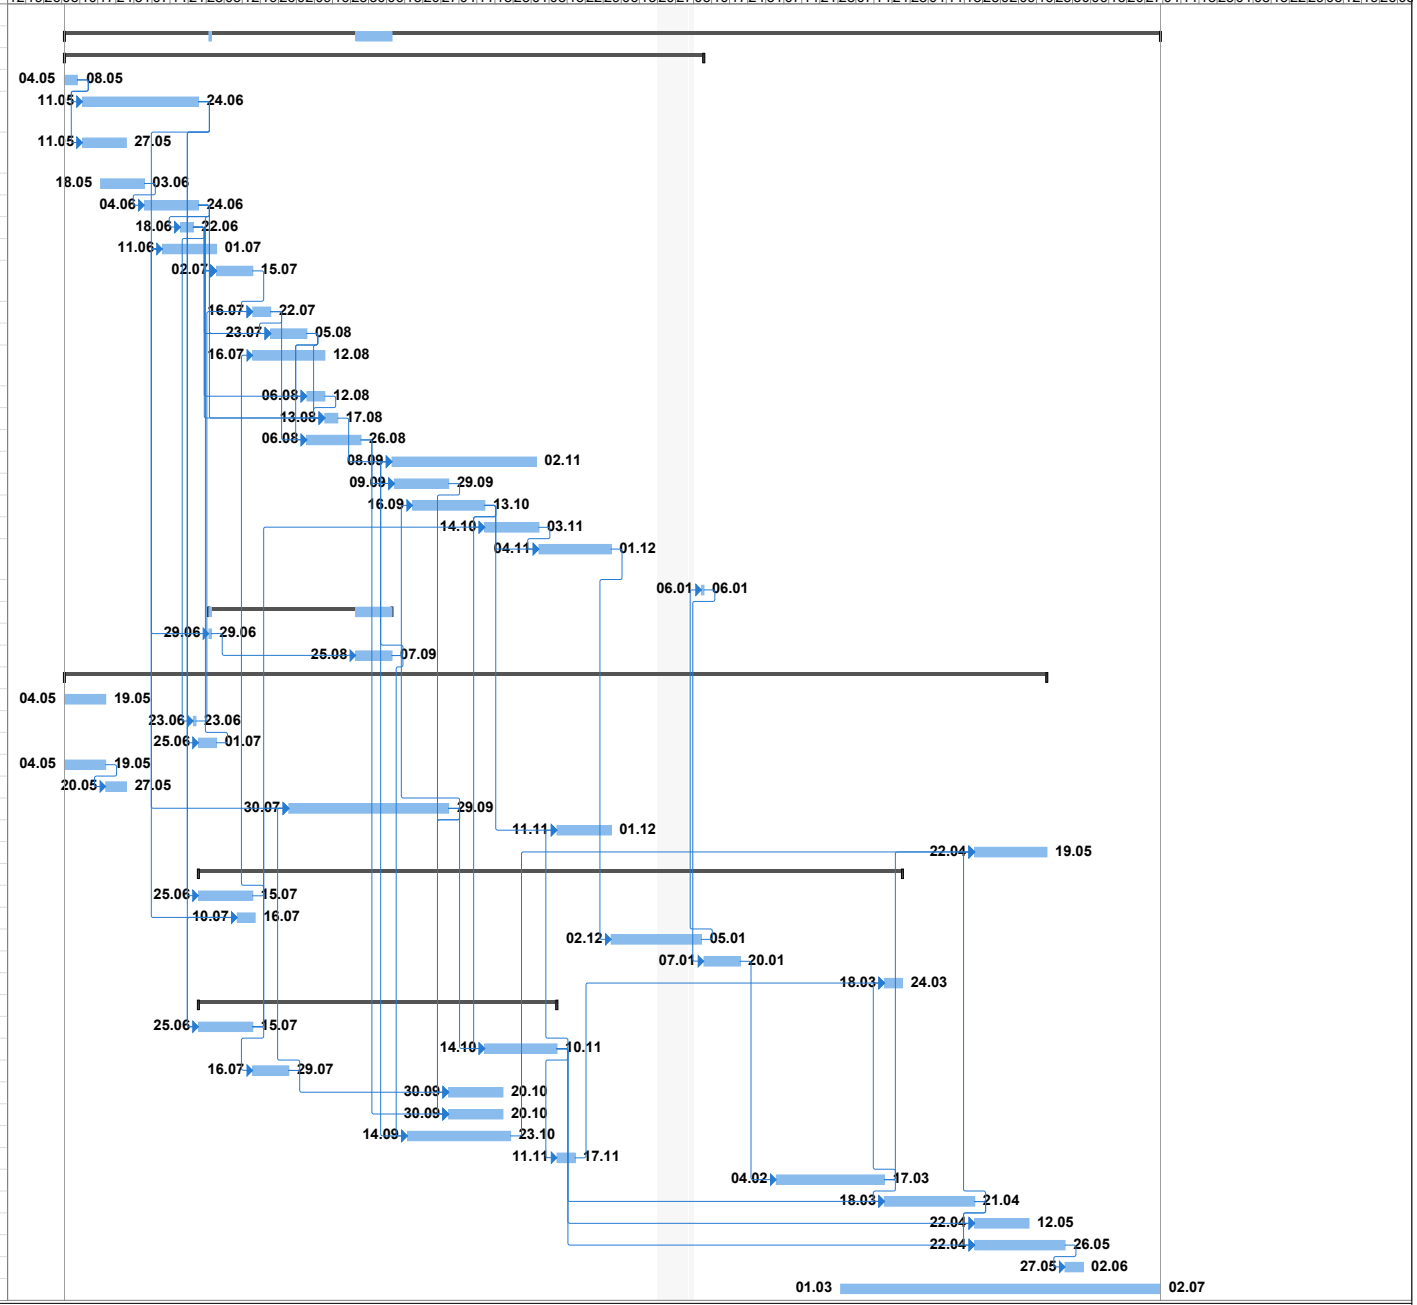Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1				
2	**Gesamtausführungzeit**	**292 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Fre 02.07.27**
3	**erweiterter Rohbau**	**165 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Mit 06.01.27**
4	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26
5	Abriss / Demontage / Räumung KG + EG	30 Tage	Mon 11.05.26	Mit 24.06.26
6	Beräumung Gelände / freimachen außen	10 Tage	Mon 11.05.26	Mit 27.05.26
7	Fernwärme	12 Tage	Mon 18.05.26	Mit 03.06.26
8	Erdarbeiten Anbau / Freilegen Gel	15 Tage	Don 04.06.26	Mit 24.06.26
9	Hauseinführungen	3 Tage	Don 18.06.26	Mon 22.06.26
10	Maurer-/ Betonarbeiten EG	15 Tage	Don 11.06.26	Mit 01.07.26
11	Fundamente Anbauten / Schacht KG - Verbau Erdarbeiten	10 Tage	Don 02.07.26	Mit 15.07.26
12	Bodenplatte Anbau	5 Tage	Don 16.07.26	Mit 22.07.26
13	Abdichtungsarbeiten / Sockeldämr	10 Tage	Don 23.07.26	Mit 05.08.26
14	Maurer-/ Betonarbeiten / WD Decke - KG	20 Tage	Don 16.07.26	Mit 12.08.26
15	Grundleitungen; Regen, SW	5 Tage	Don 06.08.26	Mit 12.08.26
16	Verfüllung Gebäude	3 Tage	Don 13.08.26	Mon 17.08.26
17	Zimermann Anbauten	15 Tage	Don 06.08.26	Mit 26.08.26
18	Gerüstarbeiten	40 Tage	Die 08.09.26	Mon 02.11.26
19	Dach-/Klempnerarbeiten	15 Tage	Mit 09.09.26	Die 29.09.26
20	Innenputz_1 (schliessen)	20 Tage	Mit 16.09.26	Die 13.10.26
21	Innenputz_2 (schlämmen)	15 Tage	Mit 14.10.26	Die 03.11.26
22	Estrich - Vorarbeiten, Unterbau FB-Heizung	20 Tage	Mit 04.11.26	Die 01.12.26
23	Estrich	1 Tag	Mit 06.01.27	Mit 06.01.27
24	**Fenster**	**51 Tage**	**Mon 29.06.26**	**Mon 07.09.26**
25	Aufmass	1 Tag	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26
26	Einbau	10 Tage	Die 25.08.26	Mon 07.09.26
27	**Elektro**	**260 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Mit 19.05.27**
28	Baustrom / Demontage	10 Tage	Mon 04.05.26	Die 19.05.26
29	Hauseinführung	1 Tag	Die 23.06.26	Die 23.06.26
30	Fundamenterder	5 Tage	Don 25.06.26	Mit 01.07.26
31	PV-Anlage	10 Tage	Mon 04.05.26	Die 19.05.26
32	Blitzschutzanlage	5 Tage	Mit 20.05.26	Mit 27.05.26
33	Grobinstallation	44 Tage	Don 30.07.26	Die 29.09.26
34	Feininstallation	15 Tage	Mit 11.11.26	Die 01.12.26
35	Bestückung	20 Tage	Don 22.04.27	Mit 19.05.27
36	**HLS**	**185 Tage**	**Don 25.06.26**	**Mit 24.03.27**
37	Grobinstallation KG	15 Tage	Don 25.06.26	Mit 15.07.26
38	Grobinstallation EG	5 Tage	Fre 10.07.26	Don 16.07.26
39	FB-Heizung	15 Tage	Mit 02.12.26	Die 05.01.27
40	Aufheizen	10 Tage	Don 07.01.27	Mit 20.01.27
41	Objektmontage	5 Tage	Don 18.03.27	Mit 24.03.27
42	**Trockenbauarbeiten**	**99 Tage**	**Don 25.06.26**	**Die 10.11.26**
43	Ständerwerk / einseite Beplankung	15 Tage	Don 25.06.26	Mit 15.07.26
44	beidseite Beplankung	20 Tage	Mit 14.10.26	Die 10.11.26
45	Unterkonstruktion Decke	10 Tage	Don 16.07.26	Mit 29.07.26
46	Schallschutz Decken	15 Tage	Mit 30.09.26	Die 20.10.26
47	Faserzementplatten außen	15 Tage	Mit 30.09.26	Die 20.10.26
48	**WDVS**	30 Tage	Mon 14.09.26	Fre 23.10.26
49	**Fliesenarbeiten**	5 Tage	Mit 11.11.26	Die 17.11.26
50	**Malerarbeiten**	30 Tage	Don 04.02.27	Mit 17.03.27
51	**Bodenbeläge**	25 Tage	Don 18.03.27	Mit 21.04.27
52	**Innentüren**	15 Tage	Don 22.04.27	Mit 12.05.27
53	**Einrichtung / Küchen**	25 Tage	Don 22.04.27	Mit 26.05.27
54	**Bauendreinigung**	5 Tage	Don 27.05.27	Mit 02.06.27
55	**Außenanlagen**	90 Tage	Mon 01.03.27	Fre 02.07.27
