Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	Baubeginn gem. LBO	Mon 01.12.25	Mon 01.12.25
2	**OÜ (LPH 8) Objektüberwachung**	**Mon 24.11.25**	**Mit 06.01.27**
3	Baustart	Mon 24.11.25	Mon 24.11.25
4	**Los 01 Baustelleeinrichtung / vorgz.Mn.**	**Mon 08.12.25**	**Fre 04.12.26**
5	TW- / SW-Anschluss herstellen	Mon 15.12.25	Fre 19.12.25
6	Bauwasser verfügbar	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25
7	BE herrichten (inkl. Bauzaun, Schotttragschicht)	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25
8	Kablegräben + ELT Kabel herstellen (inkl. Aufmaß)	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25
9	Weihnachten / Neujahr (Verschluss Baustelle)	Mon 22.12.25	Fre 02.01.26
10	Erdbohrung ELT Kabel	Mon 05.01.26	Fre 09.01.26
11	ELT Anschluss Bestandstrafo	Mon 05.01.26	Fre 09.01.26
12	Bereitstellen Sanitärcontainer + Baustromverteiler	Mon 05.01.26	Fre 09.01.26
13	Baustrom verfügbar	Mon 12.01.26	Mon 12.01.26
14	Rückbau BE (Bauzaun, Container, etc.)	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26
15	**Los 02 Rohbauarbeiten**	**Mon 19.01.26**	**Fre 13.03.26**
16	Baugrube herstellen	Mon 19.01.26	Fre 23.01.26
17	Kranplatz herstellen	Mon 26.01.26	Mit 28.01.26
18	Grundleitungen einbringen (inkl. Aufmaß)	Mon 26.01.26	Fre 30.01.26
19	Bodenplatte herstellen	Mon 02.02.26	Fre 20.02.26
20	Wände Mauerwerk herstellen	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26
21	Wände StB herstellen	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26
22	**Aufmaß amtl. Vermesser**	Fre 20.02.26	Fre 20.02.26
23	**Los 04 Geothermie**	**Mon 16.03.26**	**Fre 10.04.26**
24	Bohrungen herstellen	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26
25	Schacht / Kabelgräben herstellen	Mon 30.03.26	Fre 10.04.26
26	**Los 03 Bauphase Holzbau (inkl. Vorfertigung)**	**Don 29.01.26**	**Fre 28.08.26**
27	Auftragserteilung	Don 29.01.26	Don 29.01.26
28	Anlaufberatung	Mon 02.02.26	Mon 02.02.26
29	Erstellung WMP	Mon 16.02.26	Fre 20.03.26
30	Prüfung WMP	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26
31	Vorfertigung Werksseitig	Mon 06.04.26	Fre 22.05.26
32	Montage BA 1-3 (Wand, Träger, Dach)	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26
33	Montage BA 4-5 (Wand, Träger, Dach)	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26
34	Montage BA 5-7 (Wand, Träger, Dach)	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26
35	Fassadenarbeiten	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26
36	Fertigstellung Holzbauarbeiten	Fre 28.08.26	Fre 28.08.26
37	**Los 05 Gerüstarbeiten**	**Don 30.04.26**	**Fre 09.10.26**
38	Auftragserteilung	Don 30.04.26	Don 30.04.26
39	Anlaufberatung	Fre 01.05.26	Fre 01.05.26
40	Gerüstaufbau für Fenster / Fassadenmontage (AN Los 03 / AN Los 06)	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26
41	Standzeit	Mon 18.05.26	Fre 17.07.26
42	Gerüstumbau für Dacharbeiten	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26
43	Standzeit	Mon 10.08.26	Fre 02.10.26
44	Gerüst Rückbau	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
45	**Los 06 Dach /Klempnerarbeiten**	**Don 30.04.26**	**Fre 02.10.26**
46	Auftragserteilung	Don 30.04.26	Don 30.04.26
47	Anlaufberatung	Fre 08.05.26	Fre 08.05.26
48	Erstellung WMP AN	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26
49	Freigabe WMP IL	Mon 25.05.26	Fre 29.05.26
50	Dämmung, inkl. Abdichtungen	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26
51	Herstellung Gründach	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26
52	Dachrinnen	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
53	Installationen, Sekuranten etc.	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
54	**Los 07 Fenster / Außentüren / Sonnenschutz / Tore**	**Don 30.04.26**	**Fre 31.07.26**
55	Auftragserteilung	Don 30.04.26	Don 30.04.26
56	Anlaufberatung	Fre 01.05.26	Fre 01.05.26
57	Rohbauaufmaß / WMP	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26
58	Freigabe WMP IL	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26
59	Bestellfrist Fenster / Türen	Mon 25.05.26	Fre 17.07.26
60	Einbau Fenster	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26
61	Einbau Türen	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
62	Einbau Tore	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26
63	**Gebäudehülle Dicht**	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26
64	Blower-Door-Test	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26
65	Auswertung Blower-Door-Test	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
66	**Los 08 Fassadenarbeiten Klinkerriemchen**	**Don 28.05.26**	**Fre 21.08.26**
67	Auftragserteilung	Don 28.05.26	Don 28.05.26
68	Anlaufberatung	Fre 05.06.26	Fre 05.06.26
69	Erstellung WMP, Bemusterung mit AG, Bestellfristen	Mon 08.06.26	Fre 26.06.26
70	WDVS Innenhof	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26
71	WDVS Garage	Mon 06.07.26	Fre 31.07.26
72	WDVS Sockelbereich	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
73	**Baustart TGA**	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26
74	**Los 09 H / L / S**	**Don 30.04.26**	**Fre 20.11.26**
75	Auftragserteilung (HLS)	Don 30.04.26	Don 30.04.26
76	Anlaufberatung	Mit 06.05.26	Mit 06.05.26
77	Erstellung WMP AN	Don 07.05.26	Mit 27.05.26
78	Prüfung WMP IL	Don 28.05.26	Mit 10.06.26
79	Beginn Grobinstallation (Sanitär)	Mon 24.08.26	Fre 25.09.26
80	Feininstallation (Sanitär)	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
81	Beginn Grobinstallation (Lüftung)	Mon 03.08.26	Fre 04.09.26
82	Feininstallation (Lüftung)	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
83	Installation Lüftungsanlage auf Gründach	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
84	Beginn Grobinstallation (Heizung)	Mon 03.08.26	Fre 04.09.26
85	Installation FB-Heizung (inkl. Trittschalldä.)	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26
86	FBH baufreiheit für Estrich	Fre 21.08.26	Fre 21.08.26
87	Belegreif heizen FBH	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
88	**Los 10 ELT / EMA / ZUKO (GA)**	**Don 30.04.26**	**Fre 23.10.26**
89	Auftragserteilung	Don 30.04.26	Don 30.04.26
90	Anlaufberatung	Mit 06.05.26	Mit 06.05.26
91	Erstellung WMP	Don 07.05.26	Mit 27.05.26
92	Prüfung WMP	Don 28.05.26	Mit 03.06.26
93	Beginn Grobinstallation ELT	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26
94	Feininstallationen ELT	Mon 05.10.26	Fre 23.10.26
95	Beginn Kabelzug EMA +Zuko	Don 04.06.26	Mit 17.06.26
96	Feininstallationen EMA + ZuKo	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
97	**Los 11 PV-Anlage**	**Don 30.04.26**	**Fre 02.10.26**
98	Anlaufberatung	Don 30.04.26	Don 30.04.26
99	Erstellung WMP	Mit 06.05.26	Die 26.05.26
100	Prüfung WMP	Mit 27.05.26	Die 02.06.26
101	Vorbereitende Arbeiten	Mit 03.06.26	Fre 11.09.26
102	Herstellung PV auf Gründach	Mon 14.09.26	Fre 02.10.26
103	**Los 12 Trockenbau**	**Don 30.04.26**	**Fre 16.10.26**
104	Auftragserteilung	Don 30.04.26	Don 30.04.26
105	Anlaufberatung	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
106	Ständerwerk Trockenbau	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26
107	Verschluss Wände Trockenbau	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
108	UK Abhangdecke Trockenbau	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
109	Verschluss Abhangdecke inkl. Reviklappen	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
110	Wand-, Deckenoberflächen herstellen (Spachteln, Schleifen)	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
111	**Los 13 Innentüren**	**Don 09.07.26**	**Fre 06.11.26**
112	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
113	Anlaufberatung	Fre 10.07.26	Fre 10.07.26
114	Rohbauaufmaß Türen	Mon 13.07.26	Die 14.07.26
115	Erstellung WMP (Türen) AN	Mit 15.07.26	Die 21.07.26
116	Prüfung WMP IL	Mit 22.07.26	Die 28.07.26
117	Bestellfrist / Lieferzeit (Türen)	Mit 29.07.26	Die 06.10.26
118	Einbau Türen	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26
119	**Los 14 Estricharbeiten**	**Don 09.07.26**	**Fre 25.09.26**
120	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
121	Anlaufberatung	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26
122	Erstellung WMP; Bestellfristen	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26
123	Estrich einbringen (keine parallelen Arbeiten möglich)	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26
124	Estrich begehbar	Fre 18.09.26	Fre 18.09.26
125	Estrich belegreif heizen (HZG)	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
126	**Los 15 Fliesen / Plattenarbeiten**	**Don 09.07.26**	**Fre 18.09.26**
127	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
128	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Mon 27.07.26
129	Bemusterung mit AG	Die 28.07.26	Mon 10.08.26
130	Fliesen Boden, Wände	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
131	**Los 16 Malerarbeiten**	**Don 09.07.26**	**Fre 04.12.26**
132	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
133	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Die 14.07.26
134	Malerarbeiten Wände, Decken	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26
135	Malerarbeiten Restleistungen	Mon 09.11.26	Fre 04.12.26
136	**Los 17 Bodenbelagsarbeiten**	**Don 09.07.26**	**Fre 23.10.26**
137	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
138	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Die 14.07.26
139	Bemusterung, Bestellfristen	Die 14.07.26	Mon 17.08.26
140	Bodenbelag Büroräume (Textilbelag)	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
141	Bodenbelag Flure, etc. (Linoleum)	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
142	**Los 18 Tischlerarbeiten**	**Don 09.07.26**	**Fre 20.11.26**
143	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
144	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Die 14.07.26
145	Erstellung WMP AN	Die 14.07.26	Mon 03.08.26
146	Prüfnung WMP IL	Die 04.08.26	Mon 17.08.26
147	Vorfertigung Werksseitig	Die 18.08.26	Mon 07.09.26
148	Einbau Fensterbänke, Sitznischen,etc.	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
149	**Los 19 Freianlagen**	**Don 09.07.26**	**Fre 13.11.26**
150	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
151	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Die 14.07.26
152	Erstellung WMP	Die 14.07.26	Mon 27.07.26
153	Freigabe WMP (IL)	Die 28.07.26	Mon 03.08.26
154	Beginn Freianlagen	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26
155	Anschluss TW-SW herstellen	Die 04.08.26	Mon 10.08.26
156	Freiflächen herstellen	Die 11.08.26	Mon 31.08.26
157	Pflasterarbeiten	Die 01.09.26	Mon 28.09.26
158	Pflanzarbeiten	Die 29.09.26	Mon 19.10.26
159	Herstellung Traufstreifen, Restleistungen	Mon 12.10.26	Fre 13.11.26
160	**Los 20 Schließanlage / Beschilderung**	**Don 09.07.26**	**Fre 20.11.26**
161	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
162	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Die 14.07.26
163	Erstellung WMP	Die 14.07.26	Mon 27.07.26
164	Freigabe WMP	Die 28.07.26	Mon 03.08.26
165	Einbau Schließanlage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
166	Einbau Beschilderung Büroräume	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
167	**Los 21 Gebäudereinigung**	**Don 09.07.26**	**Mit 30.12.26**
168	Auftragserteilung	Don 09.07.26	Don 09.07.26
169	Anlaufberatung	Die 14.07.26	Die 14.07.26
170	Grobreinigung	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26
171	Feinreinigung	Don 17.12.26	Mit 23.12.26
172	2.Feinreinigung	Don 24.12.26	Mit 30.12.26
173	**Abnahmen / Inbetriebnahmen**	**Mon 23.11.26**	**Mit 23.12.26**
174	Brandschutz	Mon 30.11.26	Mon 30.11.26
175	IBN Abklatschprobe	Mon 23.11.26	Fre 11.12.26
176	Sachverständigen Abnahme Lüftung	Mon 23.11.26	Mon 23.11.26
177	VOB Abnahmen Lüftung / Sanitär	Die 01.12.26	Die 01.12.26
178	VOB Abnahmen Elektro / GA	Mit 02.12.26	Mit 02.12.26
179	Restleistungen	Don 03.12.26	Mit 23.12.26
180	Anzeige zur Nutzungsaufnahme	Don 10.12.26	Mit 23.12.26
181	**Überagbe an AG**	**Mit 23.12.26**	**Mit 06.01.27**
182	Übergabe an AG	Mit 23.12.26	Mit 23.12.26
183	Möblierung AG	Don 24.12.26	Mit 06.01.27
184	Einbau Küche AG	Don 24.12.26	Mit 06.01.27

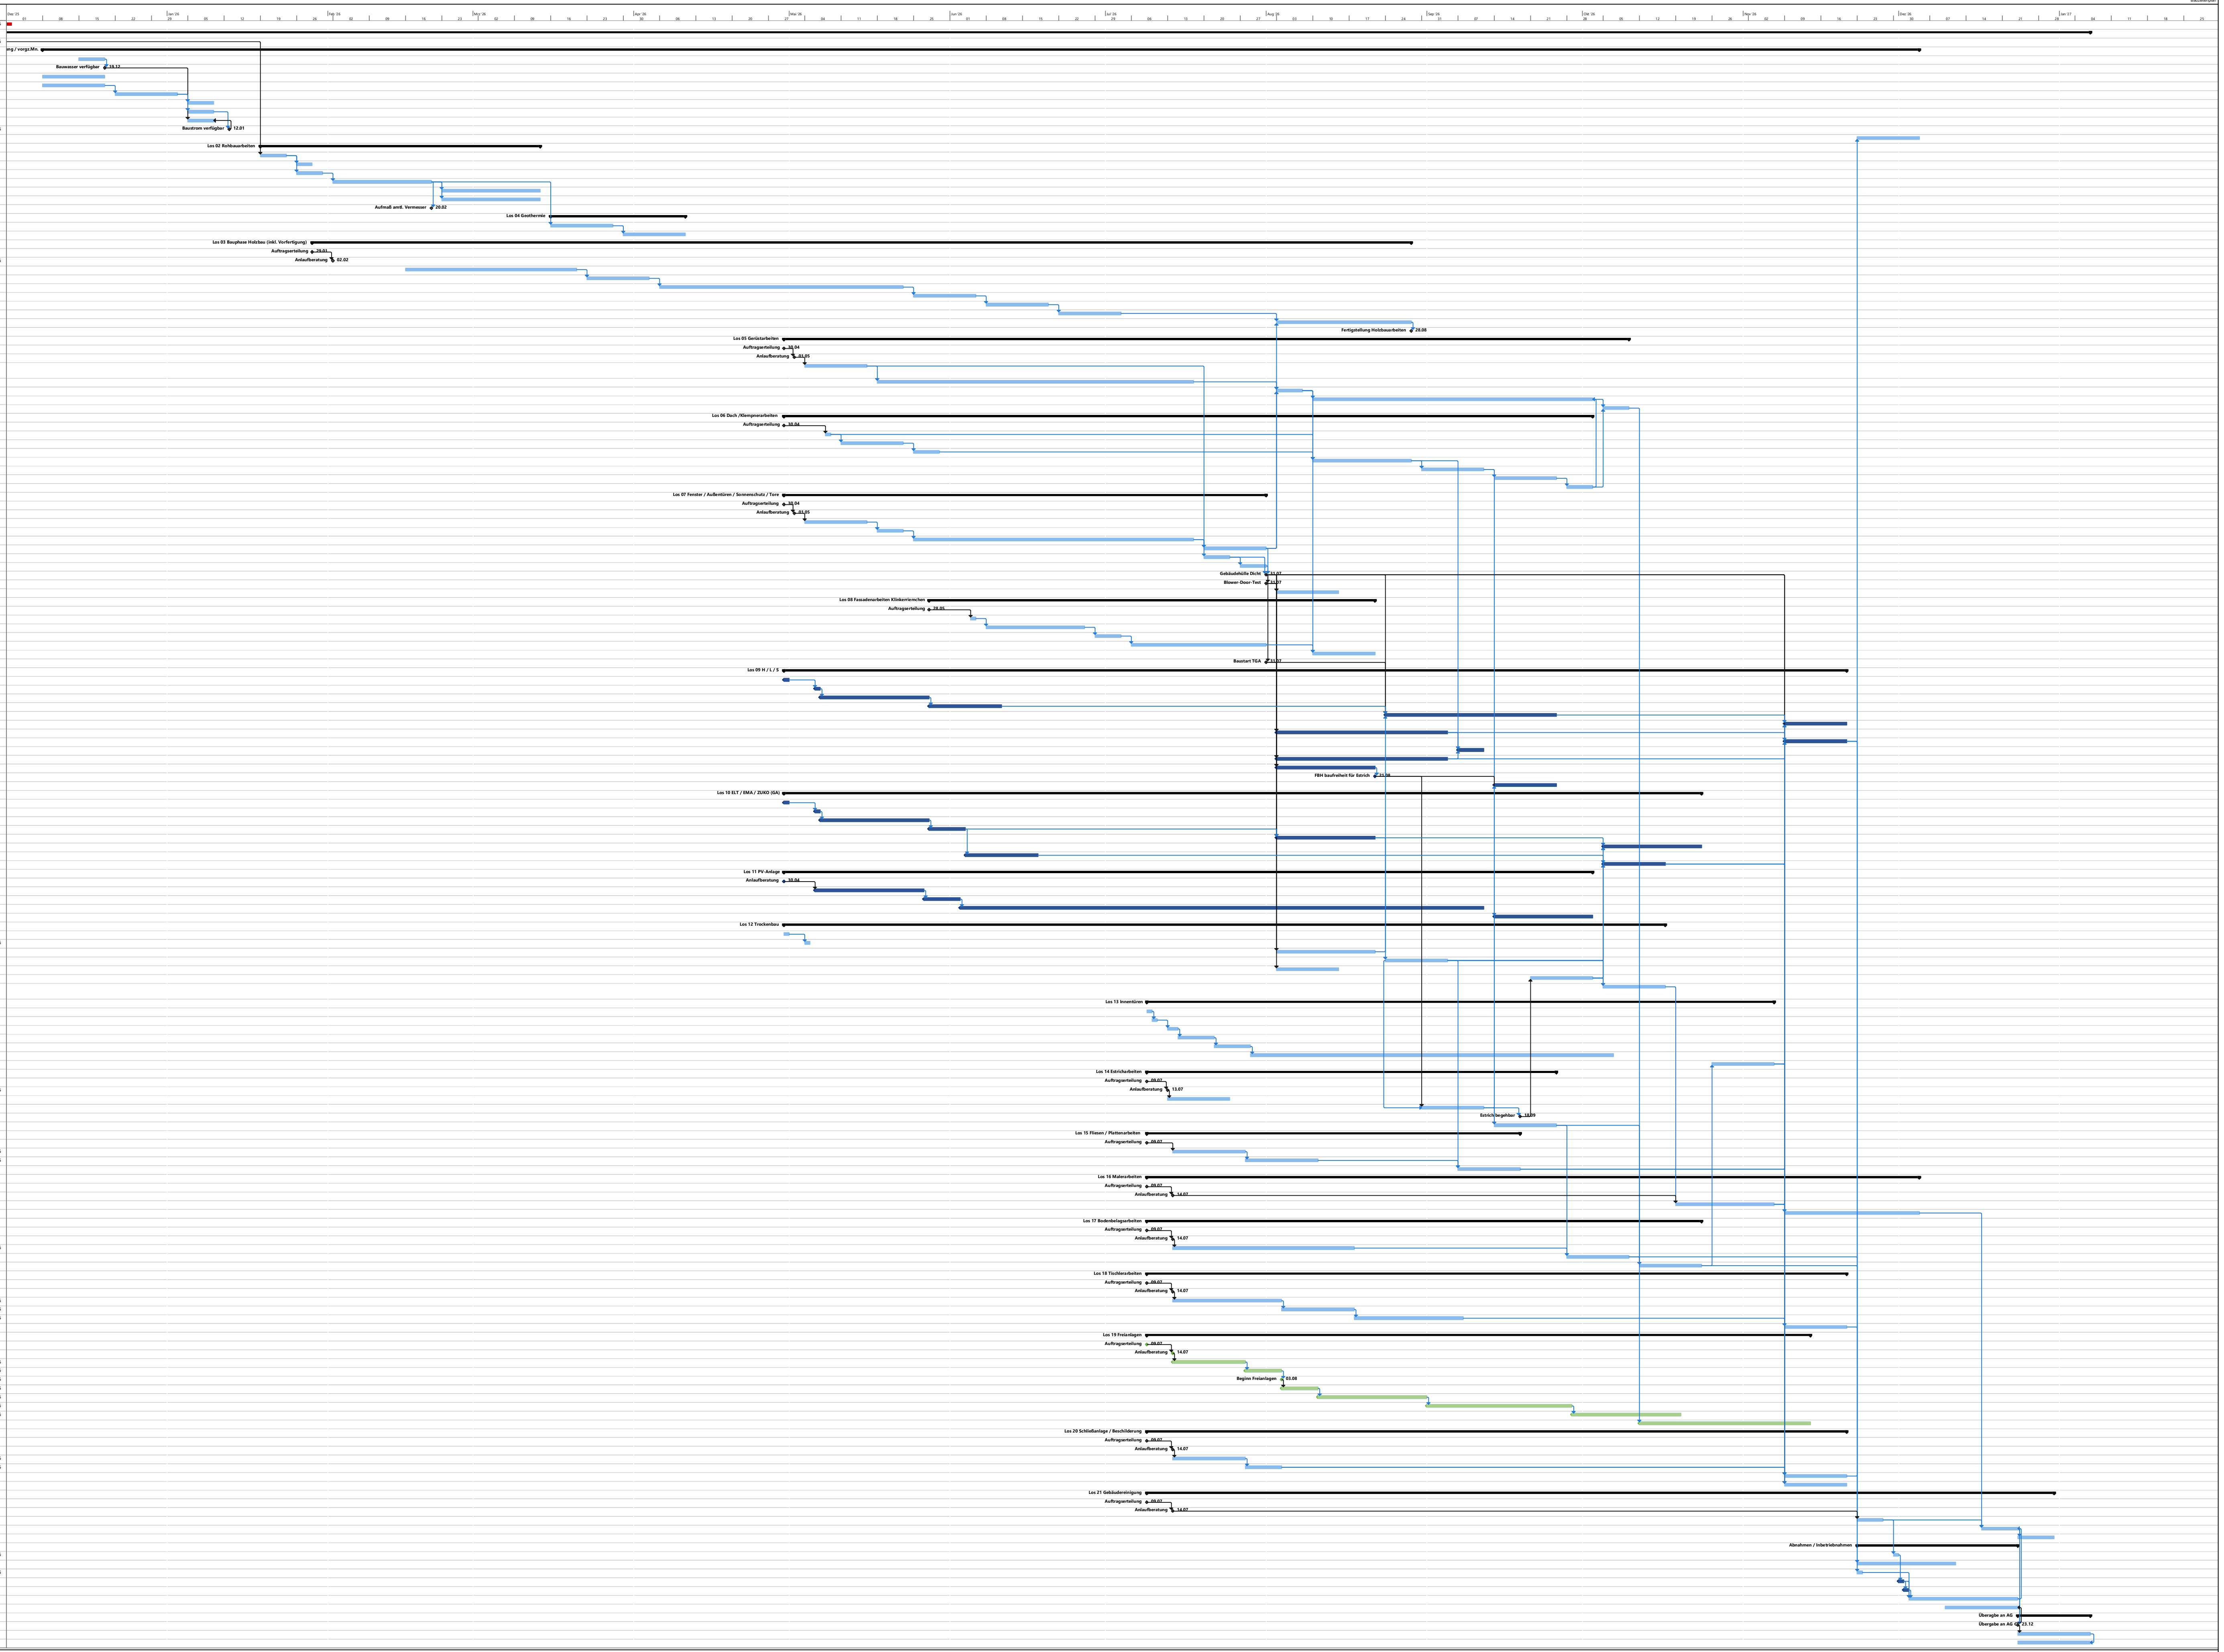

Projekt: AEV Freienhufen
Datum: Don 05.03.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt | IL-Vorgang | IL-Meilenstein | Extern1-Vorgang | Extern1-Meilenstein | Extern2-Vorgang | Extern2-Meilenstein | Extern3-Vorgang | Extern3-Meilenstein | Extern4-Vorgang | Extern4-Meilenstein | Nicht Vergeben
