Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1		Projektstart	0 Tage	Mit 03.01.24	Mit 03.01.24		
2		**LP 1 - Grundlagenermittlung**	**32 Tage**	**Mit 03.01.24**	**Don 15.02.24**		
4		**LP 2 - Vorplanung**	**42 Tage**	**Fre 16.02.24**	**Mon 15.04.24**		
10		**LP 3 - Entwurfsplanung**	**66 Tage**	**Mon 01.04.24**	**Mon 01.07.24**		
17		**LP 4 - Genehmigungsplanung**	**80 Tage**	**Die 02.07.24**	**Mon 21.10.24**		
20		**LP 5 - Ausführungsplanung**	**284 Tage**	**Die 30.07.24**	**Fre 29.08.25**		
24		**LP 6 Erstellen Leistungsverzeichnisse**	**250 Tage**	**Mon 03.03.25**	**Fre 13.02.26**		
84		**LPH 7 Veröffentlichung u. Vergabe**	**349 Tage**	**Mon 24.03.25**	**Don 23.07.26**		
115		**LP 8 - Bauausführung**	**952 Tage**	**Mit 03.01.24**	**Don 26.08.27**		
116		64.2 Bemusterung Leuchten 1. OG	25 Tage	Fre 13.06.25	Don 17.07.25	86	
117		16c Natursteinarbeiten Musterfläche herstellen	5 Tage	Die 15.07.25	Mon 21.07.25	45	43
118		Bemusterung Leuchte, Natursteinfläche mit Denkmalpflege 01.09.2025	1 Tag	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25		
119		Auszug UBS bis 16.01.2026	0 Tage	Fre 16.01.26	Fre 16.01.26		120
120		Baubeginn	0 Tage	Mon 19.01.26	Mon 19.01.26	119	121;130;134;136;138
121		1 Kunstwerk Sicherung	2 Tage	Mon 19.01.26	Die 20.01.26	120;85	122
122		2 Interim Abbruch Schadstoffe, nichtstatischer Abbruch	2 Tage	Mit 21.01.26	Don 22.01.26	121	123;126
123		3 Interim Rohbau	2 Tage	Fre 23.01.26	Mon 26.01.26	122;85	125;126
124		4 Interim Metallbau Türen Werkplanung, Lieferzeiten	40 Tage	Mon 17.11.25	Fre 09.01.26	85EA+100 Tage	125
125		4 Interim Metallbau Türen	2 Tage	Die 27.01.26	Mit 28.01.26	123;124	129
126		5 Interim Trockenbau	2 Tage	Die 27.01.26	Mit 28.01.26	85;122;123	129;127;128
127		50 Interim HLS	2 Tage	Don 29.01.26	Fre 30.01.26	126;106	129
128		51 Interim ELT	2 Tage	Don 29.01.26	Fre 30.01.26	126;106	129
129		6 Interim Maler	2 Tage	Mon 02.02.26	Die 03.02.26	126;125;127;128	144;151
130		TGA07 Baustrom Aufbau	4 Tage	Mon 19.01.26	Don 22.01.26	120;106	134;131
131		TGA07 Baustrom Vorhalte	380 Tage	Fre 23.01.26	Don 08.07.27	130	205
132		7 BE Aufbau	14 Tage	Die 06.01.26	Fre 23.01.26	96	142;140;151;135;133
133		7 BE Vorhalte	400 Tage	Mon 26.01.26	Fre 06.08.27	132	210
134		41 Außengerüst, Aufbau	10 Tage	Fre 23.01.26	Don 05.02.26	120;130;96	142;140;151;135
135		41 Außengerüst Vorhalte	250 Tage	Fre 06.02.26	Don 21.01.27	134;132	154
136		8 Baustellen Überwachung, Aufbau	4 Tage	Mon 19.01.26	Don 22.01.26	120;88	140;137
137		8 Baustellen Überwachung, Vorhalte	365 Tage	Fre 23.01.26	Don 17.06.27	136	206
138		9 Innengerüste, Aufbau	6 Tage	Fre 23.01.26	Fre 30.01.26	120;90	140;139;141
139		9 Innengerüste, Vorhalte	260 Tage	Mon 02.02.26	Fre 29.01.27	138	208
140		10 Abbruch Schadstoffe + nichtst.	50 Tage	Fre 06.02.26	Don 16.04.26	134;136;138;132	143;144;147;150;157;156;142;160;161
141		Abbruch HLS ELT	50 Tage	Mon 02.02.26	Fre 10.04.26	106;138	143
142		11 Dachdecker, Klempner	100 Tage	Fre 17.04.26	Don 03.09.26	134;140;92;132	154
143		12 Bauhaupt	100 Tage	Fre 17.04.26	Don 03.09.26	140;141;88	160EA-45 Tage;161EA-45 Tage
144		13 Korosionsschutz Fassadenriegel Entschichten und Beschichten	40 Tage	Fre 17.04.26	Don 11.06.26	129;140;146;149;94	147;150
145		14 Glasfassadenarbeiten Zuschauerhaus, Werkplanung und Produktion	120 Tage	Fre 12.12.25	Don 28.05.26	92	147
146		14 Glasfassadenarbeiten Zuschauerhaus, Abruch Fassaden	30 Tage	Mon 02.03.26	Fre 10.04.26	92	147;144
147		14 Glasfassadenarbeiten Zuschauerhaus	70 Tage	Mon 22.06.26	Fre 25.09.26	145;140;151;144;157;146	196;153
148		15 Glasfassadenarbeiten Bühnenhaus, Werkplanung und Produktion	120 Tage	Fre 12.12.25	Don 28.05.26	92	150
149		15 Glasfassadenarbeiten Bühnenhaus, Abbruch Fassaden	30 Tage	Mon 02.03.26	Fre 10.04.26	92	150;144
150		15 Glasfassadenarbeiten Bühnenhaus	70 Tage	Mon 22.06.26	Fre 25.09.26	148;140;151;144;157;149	196;153
151		16 Natursteinarbeiten, Ausbau Naturstein für Glasfassaden	30 Tage	Fre 06.02.26	Don 19.03.26	129;134;132	150;147
152		16.1 Natursteinarbeiten, Bemustern, Lieferung	150 Tage	Die 06.01.26	Mon 03.08.26	101	192;153
153		16 Natursteinarbeiten Fensterbänke und Fensterleibungen einbauen	50 Tage	Mon 28.09.26	Fre 04.12.26	152;147;150	154
154		41 Außengerüst, Abrüsten	10 Tage	Fre 22.01.27	Don 04.02.27	135;153;142;196	215
155		17 Betonwerkstein Bemustern, Lieferung	150 Tage	Die 06.01.26	Mon 03.08.26	101	193
156		18 Stahlbauarbeiten, Stahlkonstruktion Bühnenarbeiter u. Stahltreppe	40 Tage	Mon 27.04.26	Fre 19.06.26	140;110	161
157		18 Stahlbauarbeiten, neue UK Stahlträger Fassaden	40 Tage	Mon 27.04.26	Fre 19.06.26	140;110	147;150
158		19 große Treppe Anbau Werkplanung, Lieferzeit	140 Tage	Mit 03.01.24	Die 16.07.24		159
159		19 große Treppe Anbau	50 Tage	Mit 17.07.24	Die 24.09.24	158	209
160		20 Trockenbau vorn Vormontage	30 Tage	Fre 03.07.26	Don 13.08.26	143EA-45 Tage;110;140	162;163;165;166;167;168;169;170;171
161		21 Trockenbau hinten Vormontage	30 Tage	Fre 03.07.26	Don 13.08.26	143EA-45 Tage;110;156;140	162;163;165;166;167;168;169;170;174
162		TGA 01 Sanitäranlagen Vormontage	50 Tage	Fre 14.08.26	Don 22.10.26	160;161;108	174;171
163		TGA02 Heizungsanlagen Vormontage	50 Tage	Fre 14.08.26	Don 22.10.26	160;161;108	174;171
164		TGA03 Lüftungsanlagen Werkplanung, Lieferung	100 Tage	Fre 20.02.26	Don 09.07.26	108	165
165		TGA03 Lüftungsanlagen Vormontage	50 Tage	Fre 14.08.26	Don 22.10.26	160;161;164	174;171
166		TGA04 Kälteanlagen Vormontage	50 Tage	Fre 14.08.26	Don 22.10.26	160;161;108	174;171
167		TGA05 Elektroanlagen Vormontage	50 Tage	Fre 14.08.26	Don 22.10.26	160;161;108	174;171
168		TGA06 Brandmeldeanlage Vormontage	50 Tage	Fre 14.08.26	Don 22.10.26	160;161;108	174;171
169		TGA08 Gebäudeautomation Vormontage	50 Tage	Fre 14.08.26	Don 22.10.26	160;161;108	174;171
170		TGA09 Küchentechnik Vormontage	50 Tage	Fre 14.08.26	Don 22.10.26	160;161;108	174;171
171		20 Trockenbau vorn Endmontage	30 Tage	Fre 23.10.26	Don 03.12.26	160;162;163;165;166;167;168;169;	172;178;180;185;183;188;192;191
172		21 Trockenbau vorn Unterdecken Vormontage	20 Tage	Fre 04.12.26	Don 31.12.26	171	173
173		21 Trockenbau vorn Unterdecken Endmontage	20 Tage	Fre 01.01.27	Don 28.01.27	172	178;180;185;183;188;192;191
174		21 Trockenbau hinten Endmontage	30 Tage	Fre 23.10.26	Don 03.12.26	162;163;165;166;167;168;169;170;	175;178;182;187;183;189;193;191
175		21 Trockenbau hinten Unterdecken Vormontage	20 Tage	Fre 04.12.26	Don 31.12.26	174	176
176		21 Trockenbau hinten Unterdecken Endmontage	20 Tage	Fre 01.01.27	Don 28.01.27	175	178;182;187;183;189;193;191
177		22 Metallbau Glaswände innen Werkplanung, Lieferung	100 Tage	Mon 27.04.26	Fre 11.09.26	110	178
178		22 Metallbau Glaswände innen	40 Tage	Fre 29.01.27	Don 25.03.27	171;173;174;176;177	209
179		23 Tischlerarbeiten vorn Werkplanung, Lieferung	120 Tage	Mon 27.04.26	Fre 09.10.26	110	180
180		23 Tischlerarbeiten vorn	40 Tage	Fre 29.01.27	Don 25.03.27	179;171;173	185
181		24 Tischlerarbeiten hinten Werkplanung, Lieferung	120 Tage	Mon 27.04.26	Fre 09.10.26	110	182
182		24 Tischlerarbeiten hinten	40 Tage	Fre 29.01.27	Don 25.03.27	181;174;176	187
183		25 Möbeltischler	40 Tage	Fre 29.01.27	Don 25.03.27	112;171;173;176;174	209
184		26 Fliesenleger vorn Bemusterung, Lieferung	100 Tage	Fre 12.06.26	Don 29.10.26	112	185
185		26 Fliesenleger vorn	20 Tage	Fre 26.03.27	Don 22.04.27	171;180;173;112;184	188
186		27 Fliesenleger hinten Bemusterung, Lieferung	100 Tage	Fre 12.06.26	Don 29.10.26	112	187;197;198;199;200;201;202;203;204;207
187		27 Fliesenleger hinten	20 Tage	Fre 26.03.27	Don 22.04.27	174;176;182;112;186	189;197;198;199;200;201;202;203;204;207
188		28 Maler u. Tapezierarbeiten vorn	20 Tage	Fre 23.04.27	Don 20.05.27	185;112;171;173	209
189		29 Maler u. Tapezierarbeiten hinten	20 Tage	Fre 23.04.27	Don 20.05.27	187;112;174;176	209
190		30 Bodenbelag Bemusterung, Lieferung	120 Tage	Fre 12.06.26	Don 26.11.26	112	191
191		30 Bodenbelag	40 Tage	Fre 29.01.27	Don 25.03.27	190;171;173;174;176	194;207
192		16 Natursteinarbeiten, Neu verlegen u. Aufarbeiten	25 Tage	Fre 29.01.27	Don 04.03.27	152;171;173	207
193		17 Betonwerkstein Neu verlegen u. Aufarbeiten	25 Tage	Fre 29.01.27	Don 04.03.27	155;174;176	207
194		31 Leitsystem	20 Tage	Fre 26.03.27	Don 22.04.27	191;114	209
195		32 Metallwand Foyer restu. U. aufb.	20 Tage	Fre 24.07.26	Don 20.08.26	114	209
196		33 Stahlbau Dach u. Unterschläge	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26	114;147;150	154
197		TGA 01 Sanitäranlagen Endmontage	40 Tage	Fre 23.04.27	Don 17.06.27	186;187	215
198		TGA02 Heizungsanlagen Endmontage	40 Tage	Fre 23.04.27	Don 17.06.27	186;187	207;215
199		TGA03 Lüftungsanlagen Endmontage	40 Tage	Fre 23.04.27	Don 17.06.27	186;187	207;215
200		TGA04 Kälteanlagen Endmontage	40 Tage	Fre 23.04.27	Don 17.06.27	186;187	207;215
201		TGA05 Elektroanlagen Endmontage	40 Tage	Fre 23.04.27	Don 17.06.27	186;187	207;215
202		TGA06 Brandmeldeanlage Endmontage	40 Tage	Fre 23.04.27	Don 17.06.27	186;187	215
203		TGA08 Gebäudeautomation Endmontage	40 Tage	Fre 23.04.27	Don 17.06.27	186;187	207;215
204		TGA09 Küchentechnik Endmontage	40 Tage	Fre 23.04.27	Don 17.06.27	186;187	215
205		TGA07 Baustrom Demontage	4 Tage	Fre 09.07.27	Mit 14.07.27	131	215
206		8 Baustellen Überwachung, Demontage	4 Tage	Fre 18.06.27	Mit 23.06.27	137	215
207		34 Bildschutzvorhang Foyer	10 Tage	Fre 18.06.27	Don 01.07.27	114;186;187;191;192;193;198;199;	209;211;212;213;214
208		9 Innengerüste, Demontage	4 Tage	Mon 01.02.27	Don 04.02.27	139	212
209		35 Baureinigung, Feinreinigung	20 Tage	Fre 02.07.27	Don 29.07.27	114;207;194;195;188;189;183;178;	215
210		7 BE abbauen	10 Tage	Mon 09.08.27	Fre 20.08.27	133	216
211		36 Beschilderung	5 Tage	Fre 02.07.27	Don 08.07.27	114;207	215
212		37 Brandschutzbeschilderung	5 Tage	Fre 02.07.27	Don 08.07.27	114;207;208	215
213		38 Feuerlöscher Ausstattung	5 Tage	Fre 02.07.27	Don 08.07.27	114;207	215
214		39 Schließanlage	5 Tage	Fre 02.07.27	Don 08.07.27	114;207	215
215		Inbetriebnahme	20 Tage	Fre 30.07.27	Don 26.08.27	197;198;199;200;201;202;203;204;	216
216		**Fertigstellung**	**0 Tage**	**Don 26.08.27**	**Don 26.08.27**	**215;210**	

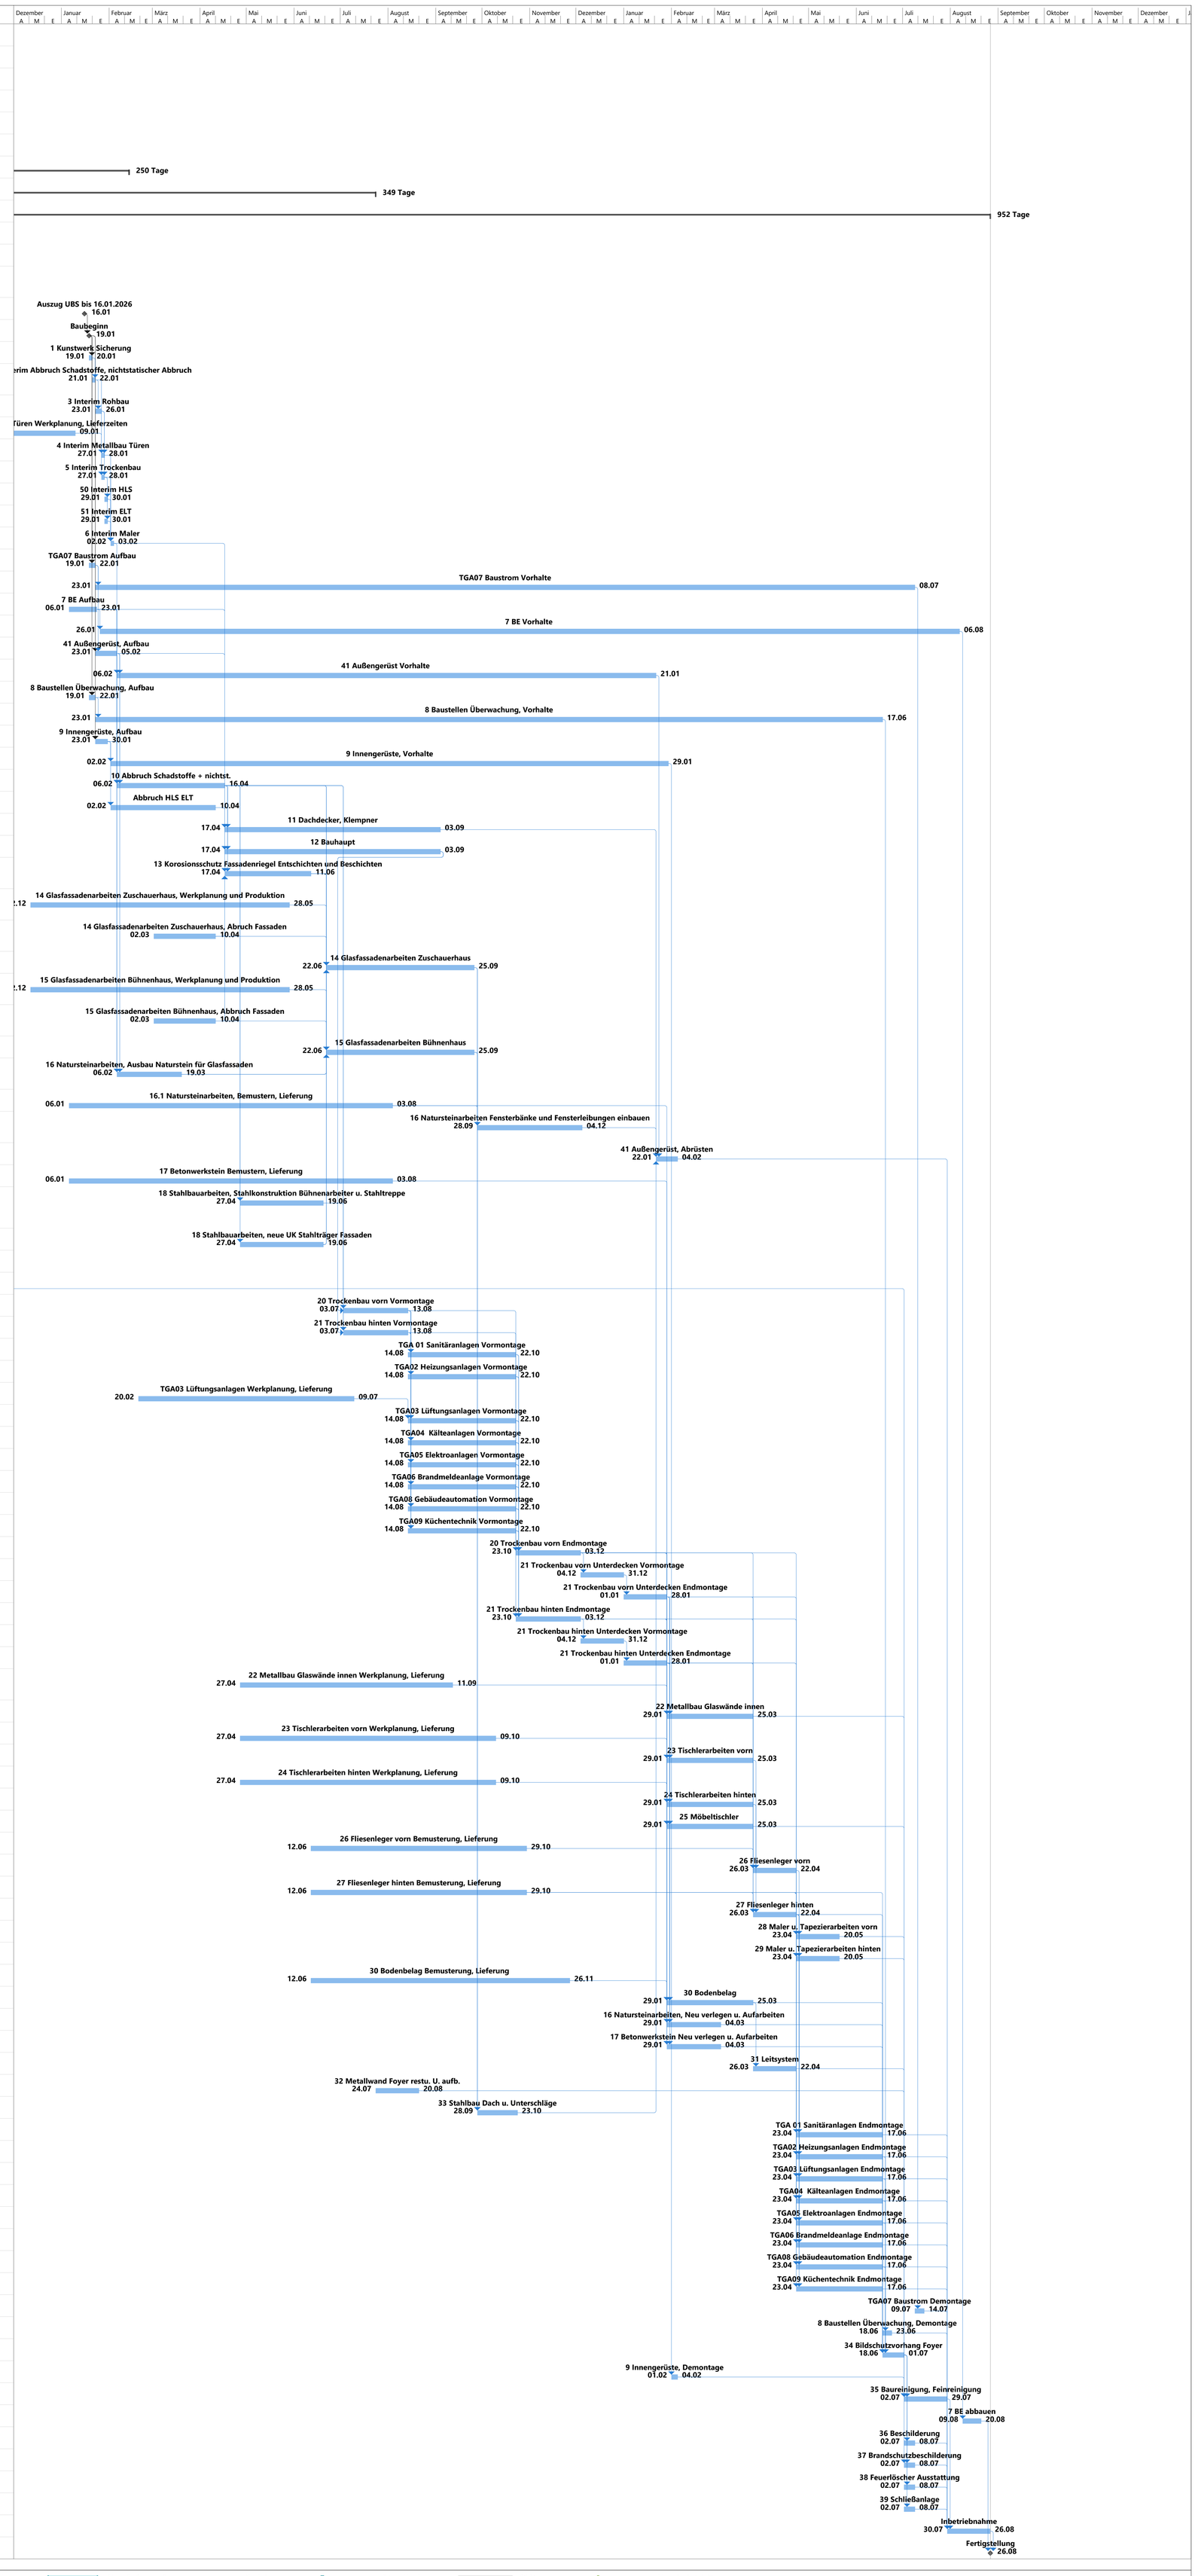

Projekt: 241121 Planungs- und
Datum: Fre 26.09.25

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Name | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
