Projekt: 04244
Stand: 4
Datum: Die 03.02.26

Bauablaufplan
NEUBAU KATASTROPHENSTÜTZPUNKT
DOBERLUG-KIRCHHAIN

K&H
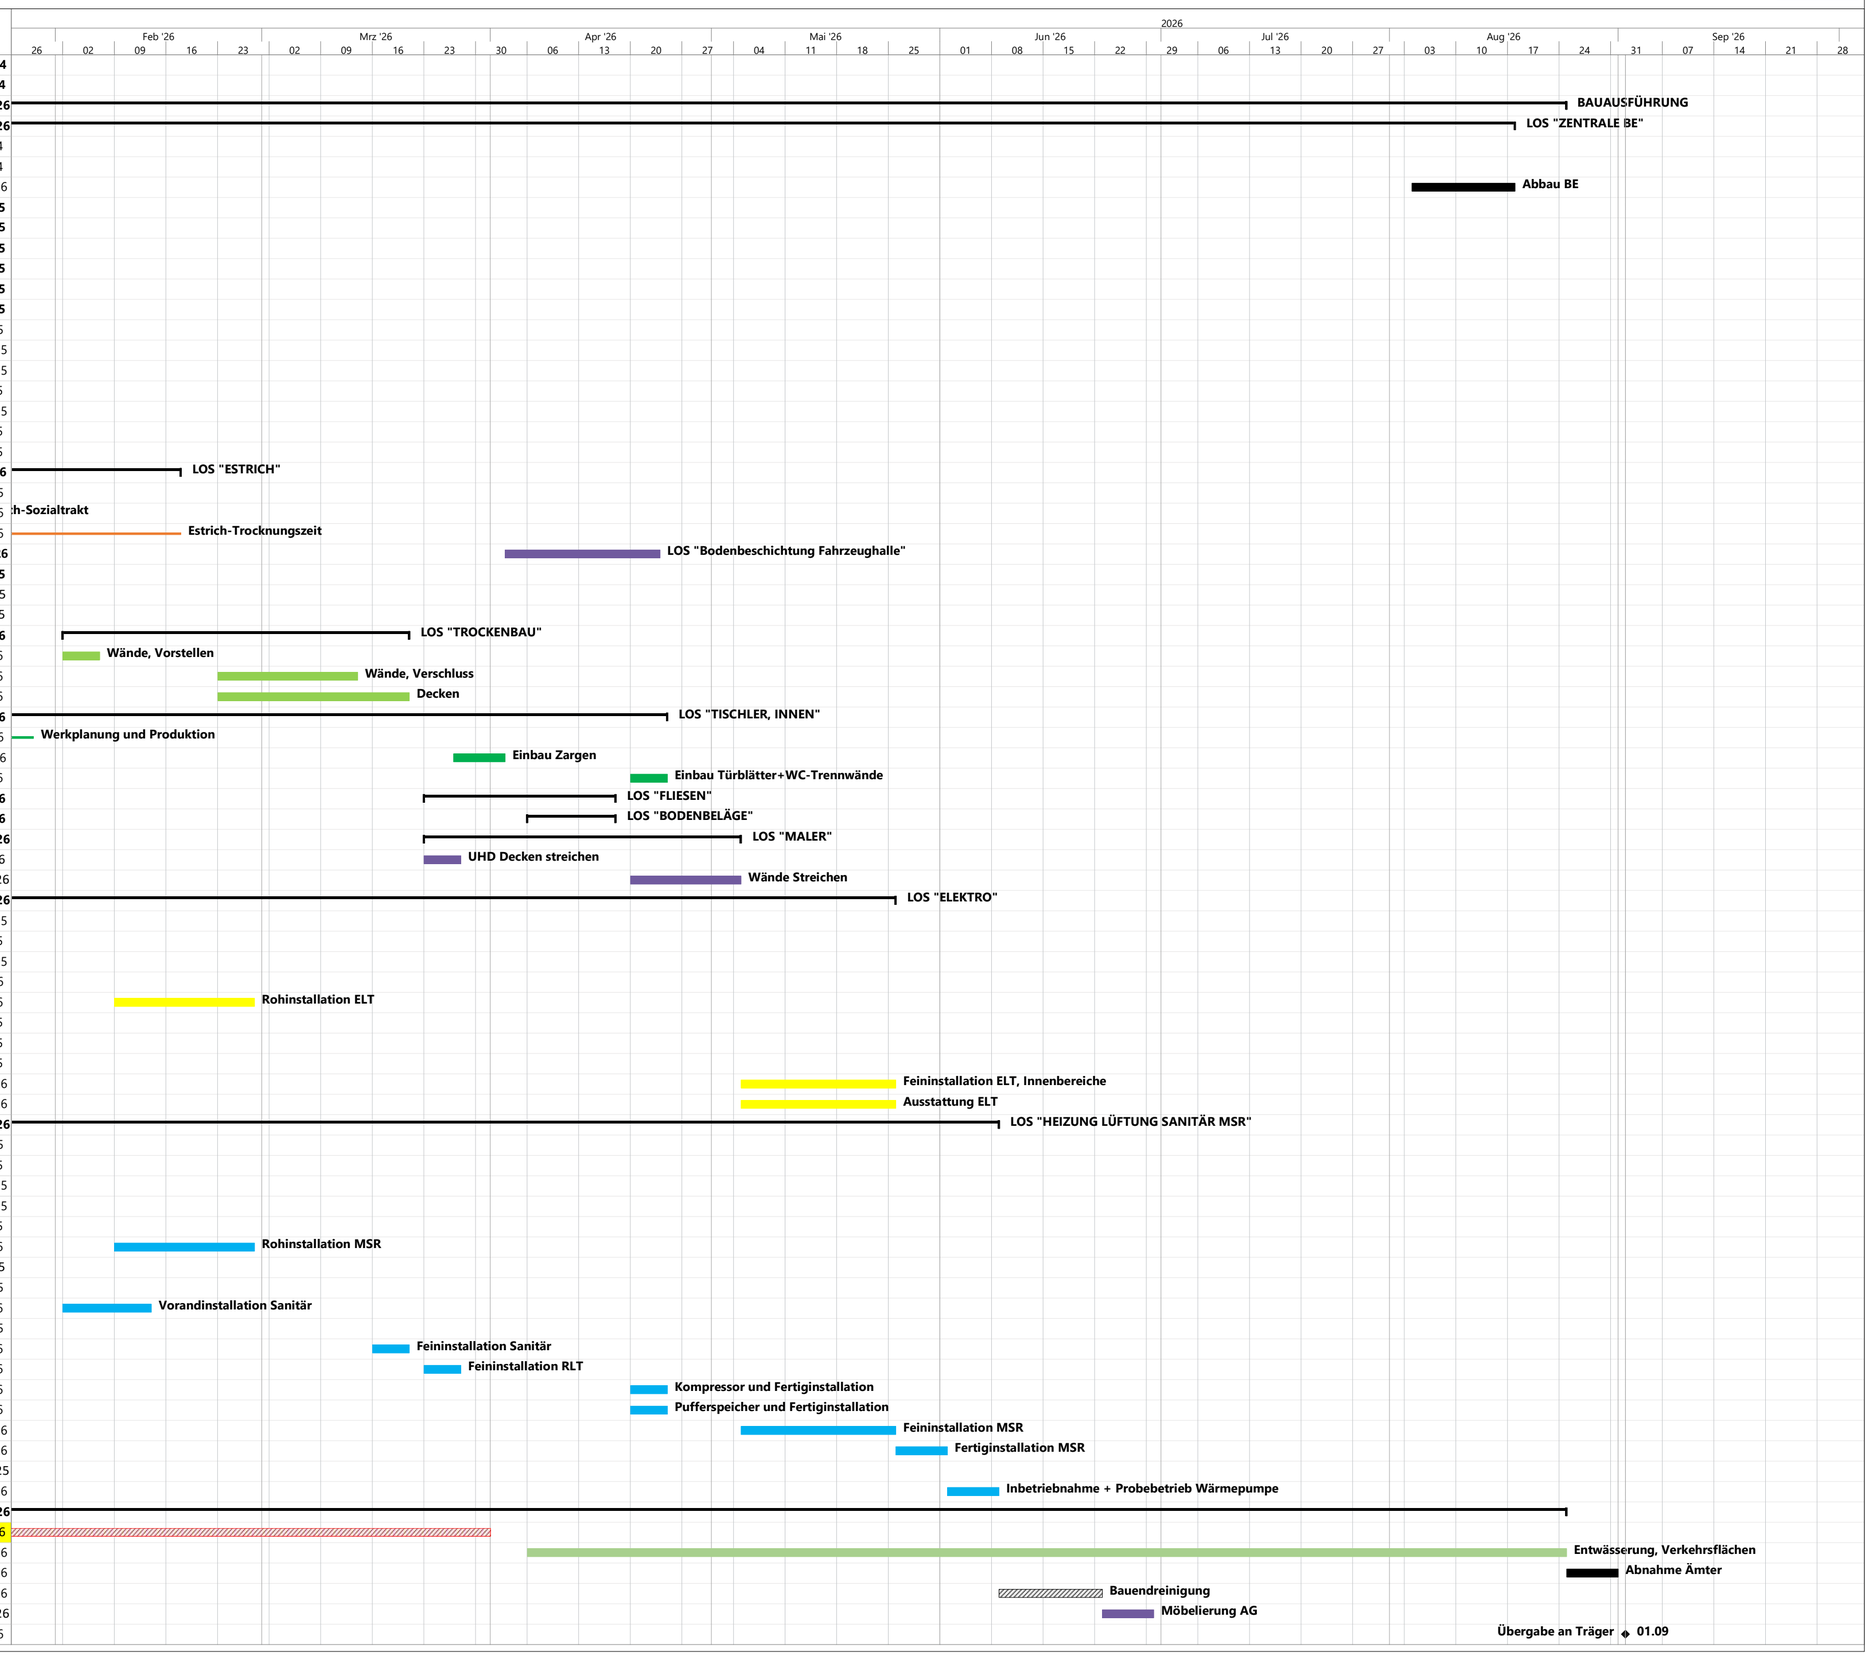
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Planung**	**77 Tage**	**Die 20.02.24**	**Mit 12.06.24**
4	**Ausschreibung, Vergabe (BE+Bauhaupt)**	**82 Tage**	**Mon 29.04.24**	**Fre 23.08.24**
10	**BAUAUSFÜHRUNG**	**488 Tage?**	**Mon 16.09.24**	**Mon 24.08.26**
11	**LOS "ZENTRALE BE"**	**483 Tage**	**Mon 16.09.24**	**Mon 17.08.26**
12	Aufbau BE	5 Tage	Mon 16.09.24	Fre 20.09.24
13	Aufbau Baustromanlage	3 Tage	Mit 18.09.24	Fre 20.09.24
14	Abbau BE	10 Tage	Die 04.08.26	Mon 17.08.26
15	**LOS "BAUHAUPTARBEITEN"**	**310 Tage?**	**Die 17.09.24**	**Fre 12.12.25**
40	**LOS "METALLBAU DACH"**	**44 Tage**	**Die 08.04.25**	**Fre 13.06.25**
43	**LOS "GERÜST"**	**162 Tage**	**Mit 30.04.25**	**Fre 19.12.25**
47	**LOS "DACHARBEITEN"**	**117 Tage**	**Mon 16.06.25**	**Fre 28.11.25**
50	**LOS "FENSTER UND AUSSENTÜREN"**	**44 Tage**	**Mon 11.08.25**	**Fre 10.10.25**
53	**LOS "PUTZARBEITEN"**	**95 Tage**	**Mit 06.08.25**	**Fre 19.12.25**
54	Innenputz Fahrzeughalle+Nebenräume	10 Tage	Mit 06.08.25	Die 19.08.25
55	WDVS Fahrzeughalle	10 Tage	Die 02.09.25	Mon 15.09.25
56	Außenputz Fahrzeughalle	10 Tage	Die 09.09.25	Mon 22.09.25
57	WDVS Sozialtrakt	10 Tage	Mon 10.11.25	Fre 21.11.25
58	Innenputz Nebenräume nach Fenstereinbau	5 Tage	Die 07.10.25	Mon 13.10.25
59	Innenputz Sozialtrakt	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25
60	Innenputz, Trocknungszeit	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25
61	**LOS "ESTRICH"**	**77 Tage**	**Die 28.10.25**	**Die 17.02.26**
62	Estrich-Fahrzeughalle	2 Tage	Die 28.10.25	Mit 29.10.25
63	Estrich-Sozialtrakt	5 Tage	Mit 14.01.26	Die 20.01.26
64	Estrich-Trocknungszeit	28 fTage	Die 20.01.26	Die 17.02.26
65	**LOS "Bodenbeschichtung Fahrzeughalle"**	**15 Tage**	**Fre 03.04.26**	**Don 23.04.26**
66	**LOS "TORE"**	**51 Tage**	**Die 16.09.25**	**Fre 28.11.25**
67	Werkplanung und Produktion	30 Tage	Die 16.09.25	Mit 29.10.25
68	Tore einbauen	5 Tage	Mon 24.11.25	Fre 28.11.25
69	**LOS "TROCKENBAU"**	**35 Tage**	**Mon 02.02.26**	**Fre 20.03.26**
70	Wände, Vorstellen	5 Tage	Mon 02.02.26	Fre 06.02.26
71	Wände, Verschluss	10 Tage	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26
72	Decken	20 Tage	Mon 23.02.26	Fre 20.03.26
73	**LOS "TISCHLER, INNEN"**	**92 Tage**	**Mon 15.12.25**	**Fre 24.04.26**
74	Werkplanung und Produktion	30 Tage	Mon 15.12.25	Mit 28.01.26
75	Einbau Zargen	5 Tage	Fre 27.03.26	Don 02.04.26
76	Einbau Türblätter+WC-Trennwände	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26
77	**LOS "FLIESEN"**	**20 Tage**	**Mon 23.03.26**	**Fre 17.04.26**
78	**LOS "BODENBELÄGE"**	**10 Tage**	**Mon 06.04.26**	**Fre 17.04.26**
79	**LOS "MALER"**	**30 Tage**	**Mon 23.03.26**	**Mon 04.05.26**
80	UHD Decken streichen	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26
81	Wände Streichen	10 Tage	Mon 20.04.26	Mon 04.05.26
82	**LOS "ELEKTRO"**	**185 Tage**	**Fre 29.08.25**	**Mon 25.05.26**
83	Werkplanung und Prüfung	25 Tage	Fre 29.08.25	Mon 06.10.25
84	Schlitzarbeiten ELT	5 Tage	Mon 06.10.25	Fre 10.10.25
85	Installation vor Putz	5 Tage	Mon 13.10.25	Mon 20.10.25
86	Trassenbau	15 Tage	Mon 22.12.25	Die 13.01.26
87	Rohinstallation ELT	15 Tage	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26
88	Installation PV-Anlage	5 Tage	Mon 24.11.25	Fre 28.11.25
89	Blitzschutz+Dachinstallation	10 Tage	Mon 17.11.25	Fre 28.11.25
90	Feininstallation ELT, Fassade	15 Tage	Mon 24.11.25	Fre 12.12.25
91	Feininstallation ELT, Innenbereiche	15 Tage	Die 05.05.26	Mon 25.05.26
92	Ausstattung ELT	15 Tage	Die 05.05.26	Mon 25.05.26
93	**LOS "HEIZUNG LÜFTUNG SANITÄR MSR"**	**259 Tage**	**Fre 30.05.25**	**Mon 08.06.26**
94	Übergabe Dachdurchführungen	1 Tag	Die 10.06.25	Die 10.06.25
95	Schlitzarbeiten HLS	5 Tage	Mon 06.10.25	Fre 10.10.25
96	Installation vor Putz	5 Tage	Mon 13.10.25	Mon 20.10.25
97	Installation HKV	5 Tage	Mon 13.10.25	Mon 20.10.25
98	Rohinstallation Druckluft+Abgas	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25
99	Rohinstallation MSR	15 Tage	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26
100	Bestellung RLT-Gerät	1 Tag	Don 03.07.25	Fre 04.07.25
101	Installation RLT	15 Tage	Mon 08.12.25	Die 30.12.25
102	Vorandinstallation Sanitär	10 Tage	Mon 02.02.26	Fre 13.02.26
103	Fundament Wärmepumpe	5 Tage	Mon 22.12.25	Die 30.12.25
104	Feininstallation Sanitär	5 Tage	Mon 16.03.26	Fre 20.03.26
105	Feininstallation RLT	5 Tage	Mon 23.03.26	Fre 27.03.26
106	Kompressor und Fertiginstallation	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26
107	Pufferspeicher und Fertiginstallation	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26
108	Feininstallation MSR	15 Tage	Die 05.05.26	Mon 25.05.26
109	Fertiginstallation MSR	5 Tage	Die 26.05.26	Mon 01.06.26
110	Bestellung Wärmepumpe (Schätzung)	1 Tag	Fre 30.05.25	Mon 02.06.25
111	Inbetriebnahme + Probebetrieb Wärmepumpe	5 Tage	Die 02.06.26	Mon 08.06.26
112	**LOS "FREIANLAGEN"**	**207 Tage?**	**Mon 03.11.25**	**Mon 24.08.26**
113	Einschränkungen Winter (Temperaturen <5°C)	104 Tage?	Mon 03.11.25	Die 31.03.26
114	Entwässerung, Verkehrsflächen	100 Tage	Mon 06.04.26	Mon 24.08.26
115	Abnahme Ämter	5 Tage	Die 25.08.26	Mon 31.08.26
116	Bauendreinigung	10 Tage	Die 09.06.26	Mon 22.06.26
117	Möbelierung AG	5 Tage	Die 23.06.26	Mon 29.06.26
118	Übergabe an Träger	1 Tag	Die 01.09.26	Die 01.09.26
