S&P GRUPPE

Neubau Grundschule
zur Ahrensdorfer Heide, 14974 Ludwigsfelde

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Grundschule zur Ahrensdorfer Heide**	**569 Tage?**	**Mon 16.06.25**	**Mon 20.09.27**
2	**Baustelleneinrichtung**	10 Tage	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25
3	**Erdbau**	**168 Tage**	**Mon 07.07.25**	**Fre 13.03.26**
4	Baustelleneinrichtung, Vorbereitenden Arbeiten	10 Tage	Mon 07.07.25	Fre 18.07.25
5	BT01_Fundamente ausgehoben, Übergabe an Rohbau	10 Tage	Mon 21.07.25	Fre 01.08.25
6	BT02_Fundamente ausgehoben, Übergabe an Rohbau	10 Tage	Mon 04.08.25	Fre 15.08.25
7	BT03_Fundamente ausgehoben, Übergabe an Rohbau	10 Tage	Mon 18.08.25	Fre 29.08.25
8	BT01_Verfüllung zwischen Fundamenten/ Planum für Bodenplatte	5 Tage	Don 23.10.25	Mit 29.10.25
9	BT02_Verfüllung zwischen Fundamenten/ Planum für Bodenplatte	5 Tage	Mon 27.10.25	Die 04.11.25
10	BT03_Verfüllung zwischen Fundamenten/ Planum für Bodenplatte	5 Tage	Mon 10.11.25	Mon 17.11.25
11	BT01_Verfüllung außen	10 Tage	Don 06.11.25	Mit 19.11.25
12	BT02_Verfüllung außen	5 Tage	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26
13	BT03_Verfüllung außen	4 Tage	Die 03.03.26	Fre 06.03.26
14	RW-Leitungen und Mulde	10 Tage	Mon 18.08.25	Fre 29.08.25
15	**Rohbau**	**197 Tage**	**Mon 25.08.25**	**Don 11.06.26**
16	Baustelleneinrichtung	10 Tage	Mon 25.08.25	Fre 05.09.25
17	BT01_Fundamente, Grundleitungen	7 Tage	Die 14.10.25	Mit 22.10.25
18	BT02_Fundamente, Grundleitungen	34 Tage	Die 04.11.25	Fre 19.12.25
19	BT03_Fundamente, Grundleitungen	23 Tage	Mon 17.11.25	Mit 17.12.25
20	BT01_Bodenplatte	9 Tage	Don 23.10.25	Mit 05.11.25
21	BT02_Bodenplatte	21 Tage	Mon 26.01.26	Mon 23.02.26
22	BT03_Bodenplatte	23 Tage	Mon 17.11.25	Mit 17.12.25
23	BT01_Wände, Stützen, Unterzüge EG	15 Tage	Don 06.11.25	Mit 26.11.25
24	BT02_Wände, Stützen, Unterzüge EG	15 Tage	Die 24.02.26	Mon 16.03.26
25	BT03_Wände, Stützen, Unterzüge EG	35 Tage	Mon 19.01.26	Fre 06.03.26
26	BT01_Decke über EG	10 Tage	Don 27.11.25	Mit 10.12.25
27	BT02_Decke über EG	5 Tage	Die 17.03.26	Mon 23.03.26
28	BT03_Decke über EG	8 Tage	Don 05.03.26	Mon 16.03.26
29	BT01_Wände, Stützen, Unterzüge 1.OG	15 Tage	Mon 02.03.26	Fre 20.03.26
30	BT02_Wände, Stützen, Unterzüge 1.OG	17 Tage	Die 24.03.26	Mit 15.04.26
31	BT03_Wände, Stützen, Unterzüge 1.OG	17 Tage	Die 17.03.26	Mit 08.04.26
32	BT01_Decke über 1. OG	17 Tage	Mon 23.03.26	Die 14.04.26
33	BT02_Decke über 1. OG	4 Tage	Don 16.04.26	Die 21.04.26
34	BT03_Decke über 1. OG	8 Tage	Don 09.04.26	Mon 20.04.26
35	BT01_Wände, Stützen, Unterzüge 2.OG	19 Tage	Mit 15.04.26	Mon 11.05.26
36	BT02_Wände, Stützen, Unterzüge 2.OG	20 Tage	Mit 22.04.26	Die 19.05.26
37	BT03_Wände, Stützen, Unterzüge 2.OG	19 Tage	Die 21.04.26	Fre 15.05.26
38	BT01_Decke über 2. OG	12 Tage	Die 12.05.26	Mit 27.05.26
39	BT02_Decke über 2. OG	9 Tage	Mit 20.05.26	Mon 01.06.26
40	BT03_Decke über 2. OG	9 Tage	Mon 18.05.26	Don 28.05.26
41	Attika insgesamt	19 Tage	Mon 18.05.26	Don 11.06.26
42	**Dachdecker/Dachklempner**	**99 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Don 15.10.26**
43	Voranstrich	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26
44	Dampfsperre	15 Tage	Mon 08.06.26	Fre 26.06.26
45	Dampfsperre vollständig fertig/ Dach dicht	0 Tage	Mon 22.06.26	Mon 22.06.26
46	Attika dämmen und abdichten	15 Tage	Mon 22.06.26	Fre 10.07.26
47	Dämmung und 1. und 2.Abdichtungslage	25 Tage	Mon 06.07.26	Fre 07.08.26
48	Attikaabdeckung (Verwahrung)	15 Tage	Fre 25.09.26	Don 15.10.26
49	BT01_Lichthof_Voranstrich und Dampfsperre	6 Tage	Fre 17.07.26	Fre 24.07.26
50	BT01_Dämmung sowie 1. und 2. Abdichtungslage	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26
51	BT02_Lichthof_Voranstrich und Dampfsperre	6 Tage	Fre 24.07.26	Fre 31.07.26
52	BT02_Dämmung sowie 1. und 2. Abdichtungslage	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
53	BT03_Lichthof_Voranstrich und Dampfsperre	6 Tage	Fre 31.07.26	Fre 07.08.26
54	BT03_Dämmung sowie 1. und 2. Abdichtungslage	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
55	**Fenster, Außentüren**	**80 Tage**	**Fre 17.04.26**	**Don 06.08.26**
56	WMP zur Prüfung und Freigabe	0 Tage	Fre 17.04.26	Fre 17.04.26
57	BT01_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung EG	10 Tage	Fre 29.05.26	Don 11.06.26
58	BT02_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung EG	10 Tage	Fre 05.06.26	Don 18.06.26
59	BT03_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung EG	10 Tage	Fre 12.06.26	Don 25.06.26
60	BT01_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 1.OG	10 Tage	Fre 19.06.26	Don 02.07.26
61	BT02_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 1.OG	10 Tage	Fre 26.06.26	Don 09.07.26
62	BT03_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 1.OG	10 Tage	Fre 03.07.26	Don 16.07.26
63	BT01_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 2.OG	10 Tage	Fre 10.07.26	Don 23.07.26
64	BT02_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 2.OG	10 Tage	Fre 17.07.26	Don 30.07.26
65	BT03_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 2.OG	10 Tage	Fre 24.07.26	Don 06.08.26
66	**Pfosten Riegel Fassade, ALU-Türen**	**101 Tage**	**Fre 17.04.26**	**Fre 04.09.26**
67	**Pfosten-Riegel-Fassade, Außen-Türen**	**90 Tage**	**Fre 17.04.26**	**Don 20.08.26**
68	WMP zur Prüfung und Freigabe	0 Tage	Fre 17.04.26	Fre 17.04.26
69	BT01_Lieferung, Montage EG	10 Tage	Fre 29.05.26	Don 11.06.26
70	BT02_Lieferung, Montage EG	10 Tage	Fre 05.06.26	Don 18.06.26
71	BT03_Lieferung, Montage EG	20 Tage	Fre 12.06.26	Don 09.07.26
72	BT01_Lieferung, Montage 1.OG	10 Tage	Fre 03.07.26	Don 16.07.26
73	BT02_Lieferung, Montage 1.OG	10 Tage	Fre 10.07.26	Don 23.07.26
74	BT03_Lieferung, Montage 1.OG	10 Tage	Fre 17.07.26	Don 30.07.26
75	BT01_Lieferung, Montage 2.OG	10 Tage	Fre 24.07.26	Don 06.08.26
76	BT02_Lieferung, Montage 2.OG	10 Tage	Fre 31.07.26	Don 13.08.26
77	BT03_Lieferung, Montage 3.OG	10 Tage	Fre 07.08.26	Don 20.08.26
78	**ALU-Türen innen**	**61 Tage**	**Fre 12.06.26**	**Fre 04.09.26**
79	Übergabe WMP zur Prüfung und Freigabe	0 Tage	Fre 12.06.26	Fre 12.06.26
80	Lieferung, Montage BT01	7 Tage	Fre 21.08.26	Mon 31.08.26
81	Lieferung, Montage BT02	7 Tage	Die 25.08.26	Mit 02.09.26
82	Lieferung, Montage BT03	7 Tage	Don 27.08.26	Fre 04.09.26
83	**Stahltüren**	**45 Tage**	**Fre 15.05.26**	**Don 16.07.26**
84	WMP zur Prüfung und Freigabe	0 Tage	Fre 15.05.26	Fre 15.05.26
85	Lieferung, Montage	15 Tage	Fre 26.06.26	Don 16.07.26
86	**WDVS**	**70 Tage**	**Fre 07.08.26**	**Don 12.11.26**
87	Vorbereiten / Schützen / Ausgleichen	15 Tage	Fre 07.08.26	Don 27.08.26
88	BT01_Dämmung mit Giebel beginnend, inkl. Innenhof	15 Tage	Fre 21.08.26	Don 10.09.26
89	BT03_Dämmung mit Giebel beginnend, inkl. Innenhof	15 Tage	Fre 28.08.26	Don 17.09.26
90	BT02_Dämmung mit Giebel beginnend, inkl. Innenhof	15 Tage	Fre 04.09.26	Don 24.09.26
91	BT01_Armierung inkl. Eckwinkel etc., inkl. Innenhof	15 Tage	Fre 04.09.26	Don 24.09.26
92	BT03_Armierung inkl. Eckwinkel etc., inkl. Innenhof	15 Tage	Fre 11.09.26	Don 01.10.26
93	BT02_Armierung inkl. Eckwinkel etc., inkl. Innenhof	15 Tage	Fre 18.09.26	Don 08.10.26
94	BT01_Putzen	15 Tage	Fre 25.09.26	Don 15.10.26
95	BT03_Putzen	15 Tage	Fre 02.10.26	Don 22.10.26
96	BT02_Putzen	15 Tage	Fre 09.10.26	Don 29.10.26
97	BT01_Klinkerriemchen	15 Tage	Fre 25.09.26	Don 15.10.26
98	BT03_Klinkerriemchen	15 Tage	Fre 02.10.26	Don 22.10.26
99	BT02_Klinkerriemchen	15 Tage	Fre 09.10.26	Don 29.10.26
100	BT01_Abbau Fassadengerüst	10 Tage	Fre 16.10.26	Don 29.10.26
101	BT03_Abbau Fassadengerüst	10 Tage	Fre 23.10.26	Don 05.11.26
102	BT02_Abbau Fassadengerüst	10 Tage	Fre 30.10.26	Don 12.11.26
103	Fassadengerüst abgebaut	0 Tage	Don 12.11.26	Don 12.11.26
104	**Stahlbau**	**30 Tage**	**Fre 25.09.26**	**Don 05.11.26**
105	BT01_Stahlaußentreppe	15 Tage	Fre 25.09.26	Don 15.10.26
106	BT02_Stahlaußentreppe	15 Tage	Fre 09.10.26	Don 29.10.26
107	BT03_Stahlaußentreppe	15 Tage	Fre 16.10.26	Don 05.11.26
108	**Trockenbau**	**291 Tage**	**Mon 29.06.26**	**Mon 23.08.27**
109	BT01_UK inkl. Einseitiges Beplanken EG	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
110	BT02_UK inkl. Einseitiges Beplanken EG	10 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26
111	BT03_UK inkl. Einseitiges Beplanken EG	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26
112	BT01_Schließen Montagewände EG	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
113	BT02_Schließen Montagewände EG	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
114	BT03_Schließen Montagewände EG	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
115	BT01_Schließen der Installationswände EG	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
116	BT02_Schließen der Installationswände EG	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
117	BT03_Schließen der Installationswände EG	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
118	BT01_Spachtelung Wände EG	10 Tage	Die 13.10.26	Mon 26.10.26
119	BT02_Spachtelung Wände EG	10 Tage	Die 27.10.26	Mon 09.11.26
120	BT03_Spachtelung Wände EG	10 Tage	Die 01.12.26	Mon 14.12.26
121	BT01_UK inkl. Einseitiges Beplanken 1.OG	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26
122	BT02_UK inkl. Einseitiges Beplanken 1.OG	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26
123	BT03_UK inkl. Einseitiges Beplanken 1.OG	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
124	BT01_Schließen Montagewände 1.OG	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
125	BT02_Schließen Montagewände 1.OG	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26
126	BT03_Schließen Montagewände 1.OG	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
127	BT01_ Schließen der Installationswände 1.OG	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26
128	BT02_ Schließen der Installationswände 1.OG	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26
129	BT03_ Schließen der Installationswände 1.OG	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26
130	BT01_Spachtelung Wände 1.OG	10 Tage	Die 15.12.26	Mon 11.01.27
131	BT02_Spachtelung Wände 1.OG	10 Tage	Die 19.01.27	Mon 01.02.27
132	BT03_Spachtelung Wände 1.OG	10 Tage	Die 09.02.27	Mon 22.02.27
133	BT01_UK inkl. Einseitiges Beplanken 2.OG	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
134	BT02_UK inkl. Einseitiges Beplanken 2.OG	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
135	BT03_UK inkl. Einseitiges Beplanken 2.OG	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
136	BT01_Schließen Montagewände 2.OG	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
137	BT02_Schließen Montagewände 2.OG	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
138	BT03_Schließen Montagewände 2.OG	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
139	BT01_Schließen der Installationswände 2.OG	10 Tage	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27
140	BT02_Schließen der Installationswände 2.OG	10 Tage	Mon 01.02.27	Fre 12.02.27
141	BT03_Schließen der Installationswände 2.OG	10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27
142	BT01_Spachtelung Wände 2.OG	10 Tage	Die 23.03.27	Mon 05.04.27
143	BT02_Spachtelung Wände 2.OG	10 Tage	Die 13.04.27	Mon 26.04.27
144	BT03_Spachtelung Wände 2.OG	10 Tage	Die 04.05.27	Mon 17.05.27
145	Nacharbeiten Wände	10 Tage	Die 18.05.27	Mon 31.05.27
146	BT01_Abhangdecke EG	10 Tage	Die 16.03.27	Mon 29.03.27
147	BT02_Abhangdecke EG	10 Tage	Die 23.03.27	Mon 05.04.27
148	BT03_Abhangdecke EG	10 Tage	Die 30.03.27	Mon 12.04.27
149	BT01_Abhangdecke 1.OG	10 Tage	Die 04.05.27	Mon 17.05.27
150	BT02_Abhangdecke 1.OG	10 Tage	Die 11.05.27	Mon 24.05.27
151	BT03_Abhangdecke 1.OG	10 Tage	Die 18.05.27	Mon 31.05.27
152	BT01_Abhangdecke 2.OG	10 Tage	Die 27.07.27	Mon 09.08.27
153	BT02_Abhangdecke 2.OG	10 Tage	Die 03.08.27	Mon 16.08.27
154	BT03_Abhangdecke 2.OG	10 Tage	Die 10.08.27	Mon 23.08.27
155	**HLS**	**336 Tage?**	**Mon 04.05.26**	**Mon 30.08.27**
156	Erstellung, Prüfung u. Freigabe WMP	40 Tage	Mon 04.05.26	Fre 26.06.26
157	Baustelleneinrichtung u. Vorbereitung	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
158	BT01_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente EG	20 Tage	Mon 13.07.26	Fre 07.08.26
159	BT02_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente EG	20 Tage	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26
160	BT03_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente EG	20 Tage	Mon 24.08.26	Fre 18.09.26
161	BT01_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 1.OG	20 Tage	Mon 14.09.26	Fre 09.10.26
162	BT02_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 1.OG	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26
163	BT03_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 1.OG	20 Tage	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26
164	BT01_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 2.OG	20 Tage	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26
165	BT02_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 2.OG	20 Tage	Mon 07.12.26	Fre 15.01.27
166	BT03_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 2.OG	20 Tage	Mon 11.01.27	Fre 05.02.27
167	BT01_Unterverteilung, Objektanbindung EG	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
168	BT02_Unterverteilung, Objektanbindung EG	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26
169	BT03_Unterverteilung, Objektanbindung EG	15 Tage	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26
170	BT01_Unterverteilung, Objektanbindung, 1.OG	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
171	BT02_Unterverteilung, Objektanbindung, 1.OG	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
172	BT03_Unterverteilung, Objektanbindung, 1.OG	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26
173	BT01_Unterverteilung, Objektanbindung, 2.OG	10 Tage	Mon 14.12.26	Fre 08.01.27
174	BT02_Unterverteilung, Objektanbindung, 2.OG	10 Tage	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27
175	BT03_Unterverteilung, Objektanbindung, 2.OG	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27
176	BT01_Fußbodenheizung EG	5 Tage	Don 24.09.26	Mit 30.09.26
177	BT02_Fußbodenheizung EG	5 Tage	Don 08.10.26	Mit 14.10.26
178	BT03_Fußbodenheizung EG	5 Tage	Don 12.11.26	Mit 18.11.26
179	BT01_Fußbodenheizung 1.OG	5 Tage	Don 26.11.26	Mit 02.12.26
180	BT02_Fußbodenheizung 1.OG	5 Tage	Don 17.12.26	Mit 06.01.27
181	BT03_Fußbodenheizung 1.OG	5 Tage	Don 21.01.27	Mit 27.01.27
182	BT01_Fußbodenheizung 2.OG	5 Tage	Don 11.02.27	Mit 17.02.27
183	BT02_Fußbodenheizung 2.OG	5 Tage	Don 04.03.27	Mit 10.03.27
184	BT03_Fußbodenheizung 2.OG	5 Tage	Don 25.03.27	Mit 31.03.27
185	Installation HA-Raum/ Aufstellen und Anschließen Wärmepumpen	50 Tage	Mon 13.07.26	Fre 18.09.26
186	Inbetriebnahme Heizung	1 Tag?	Die 29.09.26	Die 29.09.26
187	Objektmontage, Heizkörper, Luftauslässe	45 Tage	Die 08.06.27	Mon 09.08.27
188	Restleistungen	15 Tage	Die 10.08.27	Mon 30.08.27
189	**Elektro**	**301 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Mon 19.07.27**
190	Erstellung, Prüfung u. Freigabe WMP	25 Tage	Mon 11.05.26	Mon 15.06.26
191	Baustelleneinrichtung u. Vorbereitung	10 Tage	Mon 15.06.26	Mon 29.06.26
192	Schlitzenarbeiten u. Bohrungen	30 Tage	Mon 29.06.26	Fre 07.08.26
193	Steigtrasse, - Leitungen	20 Tage	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26
194	BT01_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden EG	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26
195	BT02_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden EG	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26
196	BT03_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden EG	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26
197	BT01_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 1.OG	15 Tage	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26
198	BT02_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 1.OG	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26
199	BT03_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 1.OG	15 Tage	Mon 17.08.26	Fre 04.09.26
200	BT01_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 2.OG	15 Tage	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26
201	BT02_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 2.OG	15 Tage	Mon 31.08.26	Fre 18.09.26
202	BT03_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 2.OG	15 Tage	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26
203	Bestückung / Verteilung	60 Tage	Die 13.04.27	Mon 05.07.27
204	Komplettierung / Beschriftung	40 Tage	Die 11.05.27	Mon 05.07.27
205	Inbetriebnahme	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27
206	**Innenputz**	**145 Tage**	**Mon 24.08.26**	**Fre 26.03.27**
207	Vorbereitung, Bauteilschutz, Eckschutzschienen	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
208	BT01_Innenputz EG	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
209	BT02_Innenputz EG	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
210	BT03_Innenputz EG	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26
211	BT01_Innenputz 1.OG	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26
212	BT02_Innenputz 1.OG	5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26
213	BT03_Innenputz 1.OG	5 Tage	Mon 04.01.27	Fre 08.01.27
214	BT01_Innenputz 2.OG	5 Tage	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27
215	BT02_Innenputz 2.OG	5 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27
216	BT03_Innenputz 2.OG	5 Tage	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27
217	Innenputz Treppenhaus	10 Tage	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27
218	**Estrich**	**156 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Mon 03.05.27**
219	BT01_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich EG	8 Tage	Mon 14.09.26	Mit 23.09.26
220	BT01_Estricheinbau EG	8 Tage	Don 01.10.26	Mon 12.10.26
221	BT01_Abbinden Estrich / Belegreife EG	15 Tage	Die 13.10.26	Mon 02.11.26
222	BT02_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich EG	8 Tage	Mon 28.09.26	Mit 07.10.26
223	BT02_Estricheinbau EG	8 Tage	Don 15.10.26	Mon 26.10.26
224	BT02_Abbinden Estrich / Belegreife EG	15 Tage	Die 27.10.26	Mon 16.11.26
225	BT03_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich EG	8 Tage	Mon 02.11.26	Mit 11.11.26
226	BT03_Estricheinbau EG	8 Tage	Don 19.11.26	Mon 30.11.26
227	BT03_Abbinden Estrich / Belegreife EG	15 Tage	Die 01.12.26	Mon 04.01.27
228	BT01_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 1.OG	8 Tage	Mon 16.11.26	Mit 25.11.26
229	BT01_Estricheinbau 1.OG	8 Tage	Don 03.12.26	Mon 14.12.26
230	BT01_Abbinden Estrich / Belegreife 1.OG	15 Tage	Die 15.12.26	Mon 18.01.27
231	BT02_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 1.OG	8 Tage	Mon 07.12.26	Mit 16.12.26
232	BT02_Estricheinbau 1.OG	8 Tage	Don 07.01.27	Mon 18.01.27
233	BT02_Abbinden Estrich / Belegreife 1.OG	15 Tage	Die 19.01.27	Mon 08.02.27
234	BT03_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 1.OG	8 Tage	Mon 11.01.27	Mit 20.01.27
235	BT03_Estricheinbau 1.OG	8 Tage	Don 28.01.27	Mon 08.02.27
236	BT03_Abbinden Estrich / Belegreife 1.OG	15 Tage	Die 09.02.27	Mon 01.03.27
237	BT01_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 2.OG	8 Tage	Mon 01.02.27	Mit 10.02.27
238	BT01_Estricheinbau 2.OG	8 Tage	Don 18.02.27	Mon 01.03.27
239	BT01_Abbinden Estrich / Belegreife 2.OG	15 Tage	Die 02.03.27	Mon 22.03.27
240	BT02_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 2.OG	8 Tage	Mon 22.02.27	Mit 03.03.27
241	BT02_Estricheinbau 2.OG	8 Tage	Don 11.03.27	Mon 22.03.27
242	BT02_Abbinden Estrich / Belegreife 2.OG	15 Tage	Die 23.03.27	Mon 12.04.27
243	BT03_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 2.OG	8 Tage	Mon 15.03.27	Mit 24.03.27
244	BT03_Estricheinbau 2.OG	8 Tage	Don 01.04.27	Mon 12.04.27
245	BT03_Abbinden Estrich / Belegreife 2.OG	15 Tage	Die 13.04.27	Mon 03.05.27
246	**Metallbau, Treppengeländer innen**	**55 Tage**	**Die 30.03.27**	**Mon 14.06.27**
247	Übergabe WMP zur Prüfung und Freigabe	0 Tage	Die 30.03.27	Die 30.03.27
248	Treppengeländer	30 Tage	Die 04.05.27	Mon 14.06.27
249	**Maler**	**286 Tage**	**Mon 29.06.26**	**Mon 16.08.27**
250	Bemusterung	0 Tage	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26
251	Anstrich Technikräume	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26
252	Malerarbeiten Bäder/ WC's EG vor Fliesenleger	15 Tage	Die 13.10.26	Mon 02.11.26
253	BT01_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich EG	25 Tage	Die 27.10.26	Mon 30.11.26
254	BT02_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich EG	25 Tage	Die 10.11.26	Mon 14.12.26
255	BT03_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich EG	25 Tage	Die 15.12.26	Mon 01.02.27
256	BT01_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 1.OG	25 Tage	Die 12.01.27	Mon 15.02.27
257	BT02_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 1.OG	25 Tage	Die 02.02.27	Mon 08.03.27
258	BT03_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 1.OG	25 Tage	Die 23.02.27	Mon 29.03.27
259	BT01_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 2.OG	25 Tage	Die 06.04.27	Mon 10.05.27
260	BT02_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 2.OG	25 Tage	Die 27.04.27	Mon 31.05.27
261	BT03_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 2.OG	25 Tage	Die 18.05.27	Mon 21.06.27
262	TH_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich	25 Tage	Die 22.06.27	Mon 26.07.27
263	EG - 2. Anstrich/ Ausbesserungen	10 Tage	Die 23.03.27	Mon 05.04.27
264	1.OG - 2. Anstrich/ Ausbesserungen	10 Tage	Die 11.05.27	Mon 24.05.27
265	2.OG - 2. Anstrich/ Ausbesserungen	10 Tage	Die 03.08.27	Mon 16.08.27
266	**Fliesen**	**150 Tage**	**Die 27.10.26**	**Mon 07.06.27**
267	Bemusterung	0 Tage	Die 27.10.26	Die 27.10.26
268	Vorbereitung u. Abdichtung EG	10 Tage	Die 05.01.27	Mon 18.01.27
269	Verlegen EG	25 Tage	Die 19.01.27	Mon 22.02.27
270	Vorbereitung u. Abdichtung 1.OG	5 Tage	Die 02.03.27	Mon 08.03.27
271	Verlegen 1.OG	20 Tage	Die 09.03.27	Mon 05.04.27
272	Vorbereitung u. Abdichtung 2.OG	5 Tage	Die 04.05.27	Mon 10.05.27
273	Verlegen 2.OG	20 Tage	Die 11.05.27	Mon 07.06.27
274	**Bodenbelag**	**175 Tage**	**Die 17.11.26**	**Mon 02.08.27**
275	Bemusterung	0 Tage	Die 17.11.26	Die 17.11.26
276	Ausgleich EG	10 Tage	Die 26.01.27	Mon 08.02.27
277	Verlegen EG	15 Tage	Die 09.02.27	Mon 01.03.27
278	Ausgleich 1.OG	10 Tage	Die 16.03.27	Mon 29.03.27
279	Verlegen 1.OG	15 Tage	Die 30.03.27	Mon 19.04.27
280	Ausgleich 2.OG	10 Tage	Die 08.06.27	Mon 21.06.27
281	Verlegen 2.OG	15 Tage	Die 22.06.27	Mon 12.07.27
282	Ausgleich Treppenhaus	10 Tage	Die 06.07.27	Mon 19.07.27
283	Verlegen Treppenhaus	10 Tage	Die 20.07.27	Mon 02.08.27
284	**Innentüren**	**200 Tage**	**Die 13.10.26**	**Mon 02.08.27**
285	Übergabe WMP zur Prüfung und Freigabe	0 Tage	Die 13.10.26	Die 13.10.26
286	Montage EG	15 Tage	Die 02.03.27	Mon 22.03.27
287	Montage 1.OG	15 Tage	Die 20.04.27	Mon 10.05.27
288	Montage 2.OG	15 Tage	Die 13.07.27	Mon 02.08.27
289	**Möblierung**	**70 Tage**	**Die 18.05.27**	**Mon 23.08.27**
290	Übergabe WMP zur Prüfung und Freigabe	0 Tage	Die 18.05.27	Die 18.05.27
291	Lieferung, Montage, Aufbau	30 Tage	Die 13.07.27	Mon 23.08.27
292	**Reinigung**	**60 Tage**	**Die 22.06.27**	**Mon 13.09.27**
293	Grobreinigung	10 Tage	Die 29.06.27	Mon 12.07.27
294	Glasreinigung	15 Tage	Die 22.06.27	Mon 12.07.27
295	abschließende Baufeinreinigung	15 Tage	Die 24.08.27	Mon 13.09.27
296	**Schließanlage**	**70 Tage**	**Die 15.06.27**	**Mon 20.09.27**
297	Schließplan	10 Tage	Die 15.06.27	Mon 28.06.27
298	Lieferung, Einbau, Montage	10 Tage	Die 07.09.27	Mon 20.09.27
299	**Beschilderung**	**38 Tage**	**Don 08.07.27**	**Mon 30.08.27**
300	Bemusterung	10 Tage	Don 08.07.27	Mit 21.07.27
301	Montage Beschilderung Gebäude D u. C	10 Tage	Die 17.08.27	Mon 30.08.27
302	**Aufzugsanlage**	**80 Tage**	**Don 21.05.26**	**Don 10.09.26**
303	Erstellung, Prüfung u. Freigabe WMP	15 Tage	Don 21.05.26	Don 11.06.26
304	Montage	25 Tage	Don 06.08.26	Don 10.09.26
305	**Außenanlagen**	**180 Tage**	**Fre 30.10.26**	**Don 22.07.27**
306	Herstellung Außenanlagen	180 Tage	Fre 30.10.26	Don 22.07.27
307	**Abnahmen u. Mängelbeseitigung**	30 Tage	Die 03.08.27	Mon 13.09.27
308	**Übergabe an den AG**	1 Tag	Die 14.09.27	Die 14.09.27

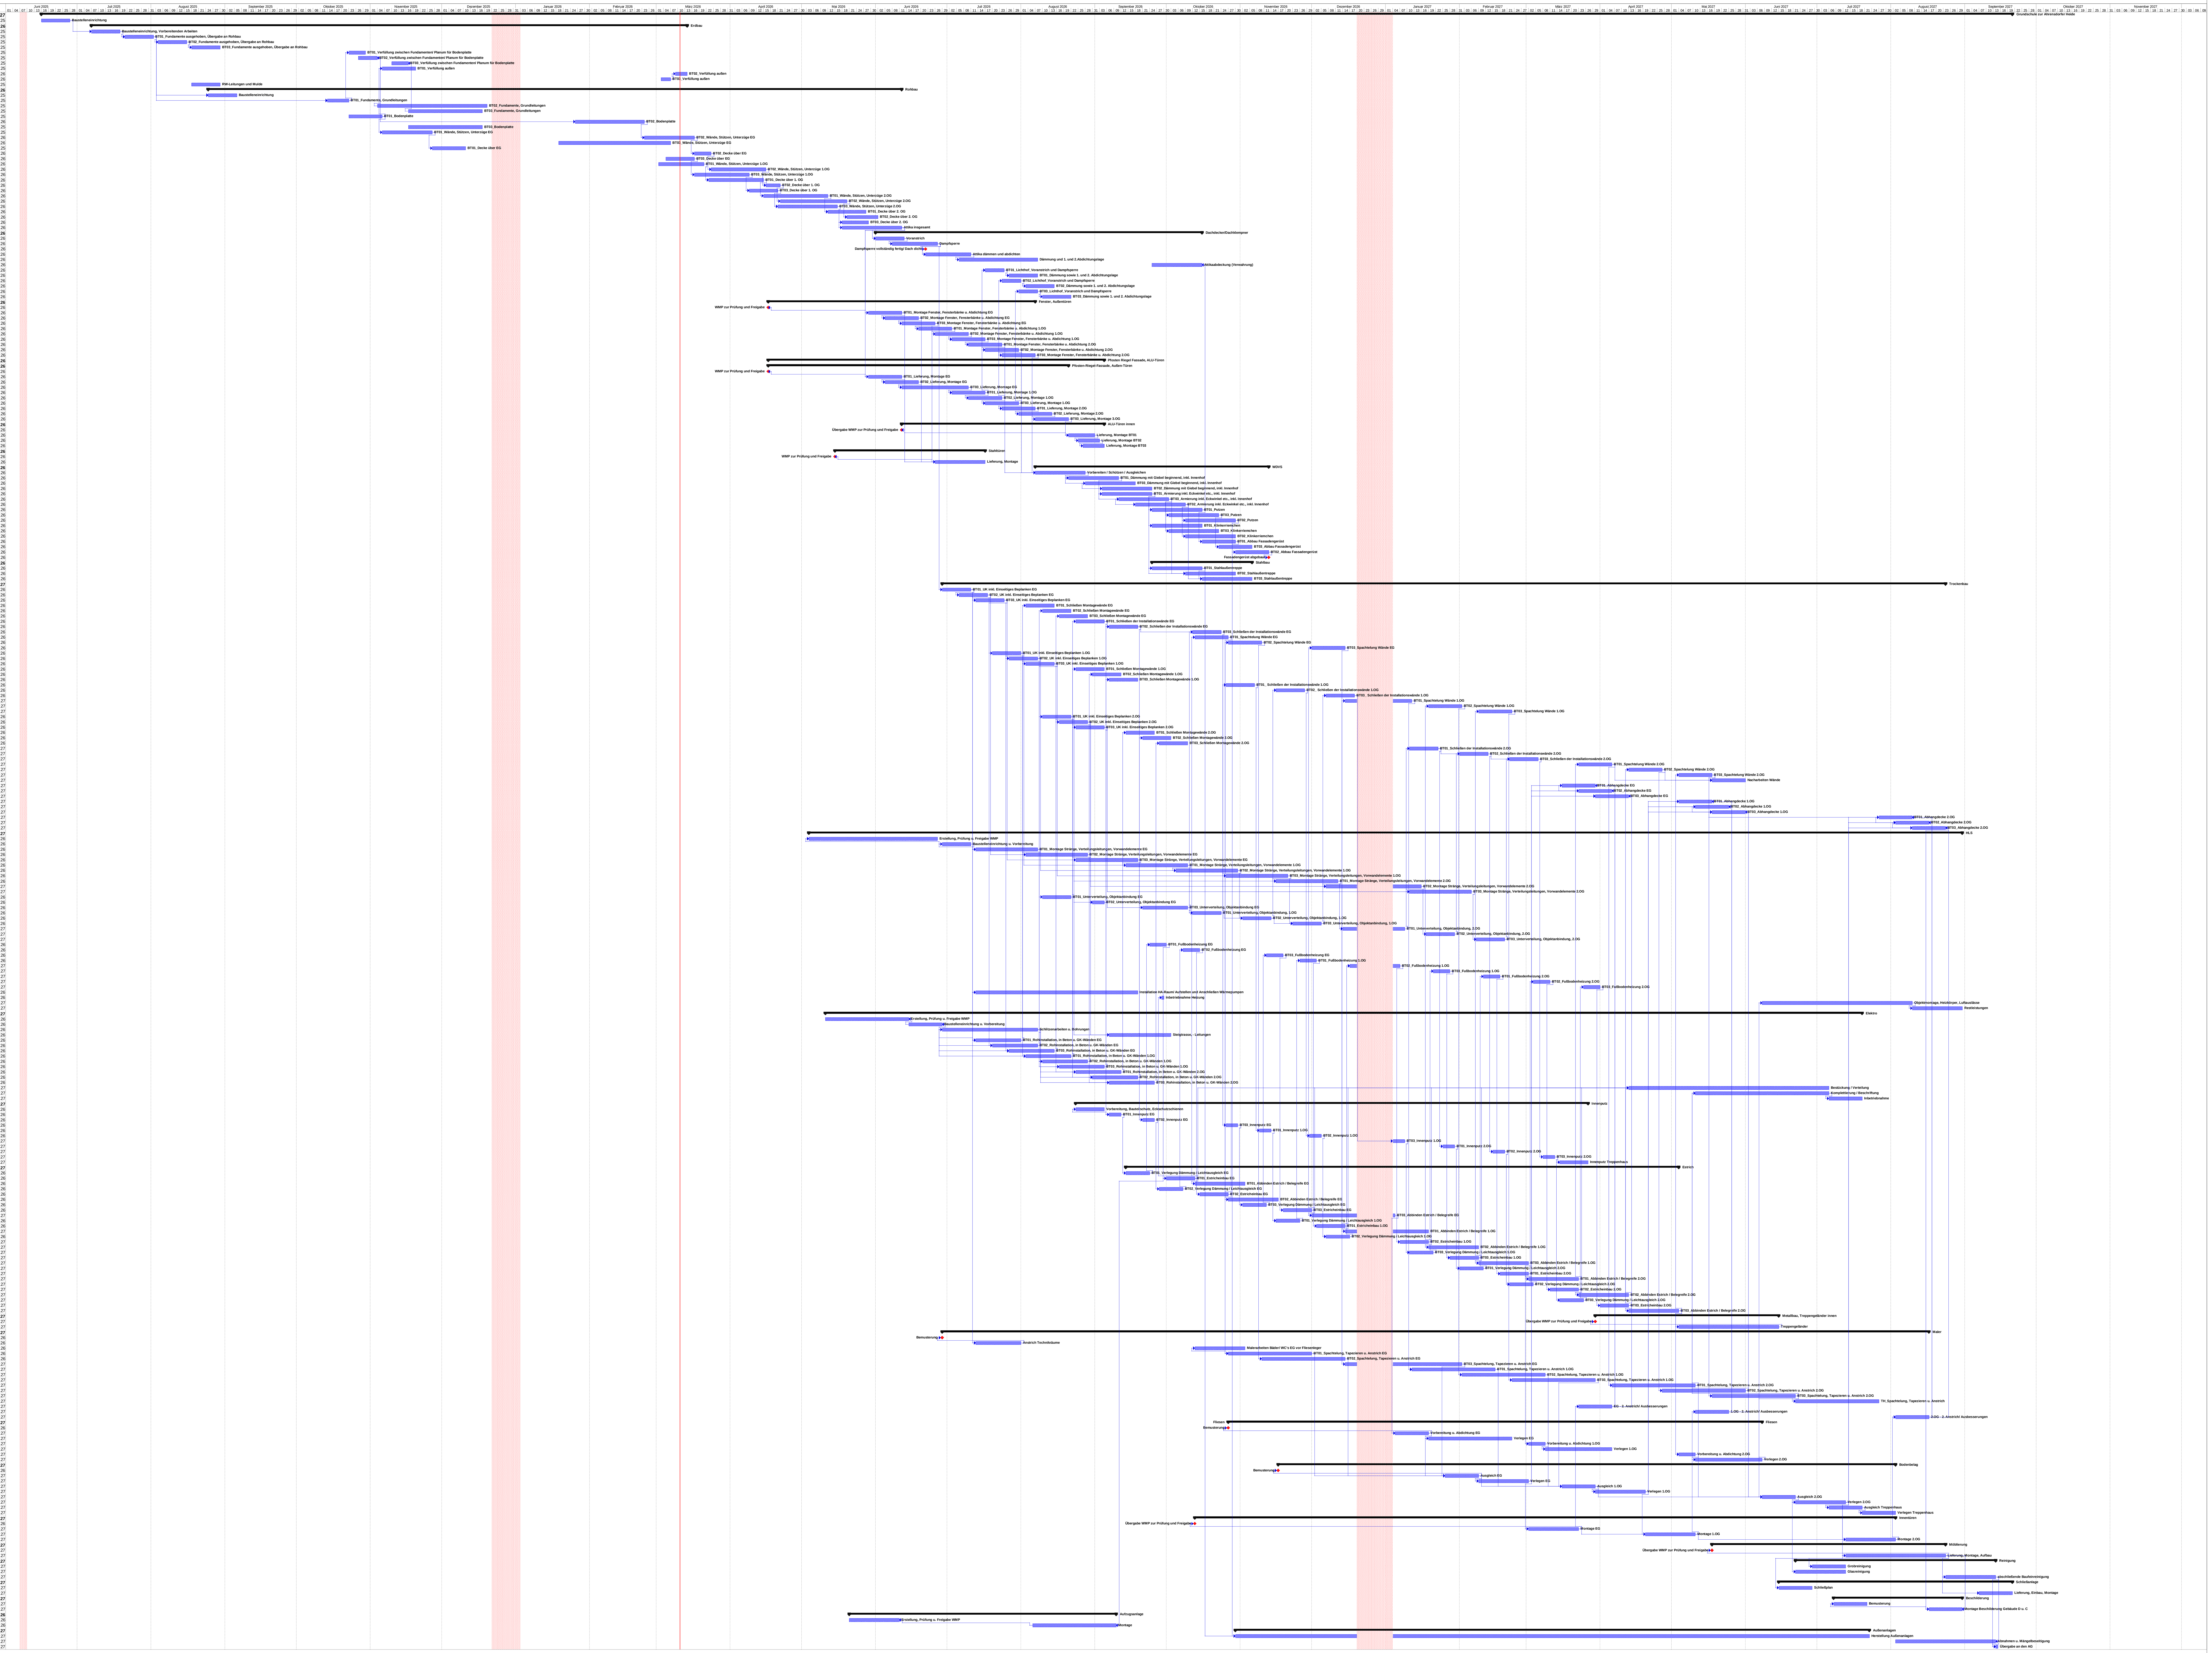

Achtung: Dieser Ablaufplan enthält keine witterungsbedingten Bauunterbrechungen.

Stand: Mit 11.03.26
