Bauzeitenplan

Title	Duration	Start	End
BBSR	78w	19.05.2025	13.11.2026
LPH 7 - Mithilfe bei der Vergabe	61w	19.05.2025	17.07.2026
LPH 8	63w	11.08.2025	23.10.2026
Vorlauf	2w	11.08.2025	22.08.2025
01 BE	3w	25.08.2025	12.09.2025
Haus 1	57w	25.08.2025	25.09.2026
02 Rückbau H1	9w	15.09.2025	14.11.2025
02 Beprobung und Abfuhr	4w	17.11.2025	12.12.2025
04 Rohbau Fundamente H1+Verbinder	3w	17.11.2025	05.12.2025
Gewächshausbau / Stahlbau	22w	25.08.2025	23.01.2026
Vorlage WMP Betonsockel		25.08.2025	25.08.2025
Freigabe WMP Betonsockel	1w	25.08.2025	29.08.2025
Vorlage WMP Stahlbau Teil 1		05.09.2025	05.09.2025
Freigabe WMP Stahlbau Teil 1	2w 1d	05.09.2025	19.09.2025
Bestellung Stahl Teil 1	1w	22.09.2025	26.09.2025
Fertigung Stahl Teil 1	6w	29.09.2025	07.11.2025
Aufmaß Stahlbau Teil 2		02.10.2025	02.10.2025
WMP nach Aufmaß	1w	06.10.2025	10.10.2025
Bestellung Stahl Teil 2	1w	13.10.2025	17.10.2025
Fertigung Stahl Teil 2	3w	20.10.2025	07.11.2025
05 Gewächshaus // Sanierung Stützenfüße H1+V	2w	10.11.2025	21.11.2025
Errichtung Stahl H1 + H2	3w	24.11.2025	12.12.2025
Betonsockel H1	1w	01.12.2025	05.12.2025
Winterferien	2w	22.12.2025	02.01.2026
Gewächshauseindeckung Dach	2w	05.01.2026	16.01.2026
Gewächshauseindeckung Wand	1w	19.01.2026	23.01.2026
04 Bodenplatten Moduleinbauten H1	3w	02.03.2026	20.03.2026
08 Zimmermann H1	8w	23.03.2026	15.05.2026
09 Fenster / Außentüren H1	2w	04.05.2026	15.05.2026
WMP, Fertigung	16w	08.12.2025	27.03.2026
05 Gewächshaus // Eindeck. H1 Teil 2 bei Moduleinbauten	2w	18.05.2026	29.05.2026
14 Energieschirm H1	2w	01.06.2026	12.06.2026
04 Wege in H1	2w	15.06.2026	26.06.2026
TGA // Gewächshaus H1	10w	29.06.2026	04.09.2026
10 Metallfassade H1	4w	29.06.2026	24.07.2026
32 Schlosser H1	2w	29.06.2026	10.07.2026
WMP, Fertigung	6w	18.05.2026	26.06.2026
17 Trockenbau H1	9w	18.05.2026	17.07.2026
17 Maler Decke H1 (vor Montage TGA)	2w	18.05.2026	29.05.2026
17 Türzargen H1	1w	06.07.2026	10.07.2026
TGA Ausbau Vormontage H1	5w	01.06.2026	03.07.2026
ELT Blitzschutz	2w	11.05.2026	22.05.2026
18 Fliesen H1	2w	20.07.2026	31.07.2026
17 Maler H1	3w	20.07.2026	07.08.2026
20 Bodenbeschichtung	2w	10.08.2026	21.08.2026
17 Türblätter H1	1w	24.08.2026	28.08.2026
TGA // Ausbau Endmontage H1	2w	24.08.2026	04.09.2026
16 Sauberlauf H1	2w	31.08.2026	11.09.2026
21 Küche H1	2w	14.09.2026	25.09.2026
WMP, Fertigung	10w	06.07.2026	11.09.2026
Haus 2	40w	20.10.2025	24.07.2026
02 Rückbau H2	2w	17.11.2025	28.11.2025
02 Beprobung und Abfuhr	4w	01.12.2025	26.12.2025
05 Gewächshaus // Sanierung Stützenfüße H2	2w	10.11.2025	21.11.2025
05 Gewächshaus // Stahlbau H2	3w	24.11.2025	12.12.2025
Betonsockel H2	1w	08.12.2025	12.12.2025
Winterferien	2w	22.12.2025	02.01.2026
04 Rohbau Bodenplatte H2	8w	05.01.2026	27.02.2026
08 Zimmermann H2	4w	02.03.2026	27.03.2026
WMP, Fertigung	14w	20.10.2025	23.01.2026
11 Metalltüren H2	2w	30.03.2026	10.04.2026
10 Metallfassade H2	8w	16.03.2026	08.05.2026
WMP, Fertigung	16w	24.11.2025	13.03.2026
EFRE Bodenplatte Wasseraufbereitung	1w	11.05.2026	15.05.2026
EFRE Zimmererarbeiten Wasseraufbereitung	2w	22.06.2026	03.07.2026
WMP, Fertigung	6w	11.05.2026	19.06.2026
17 Maler H2	2w	06.07.2026	17.07.2026
05 Anprallschutz H2	2w	06.07.2026	17.07.2026
ELT Blitzschutz	2w	11.05.2026	22.05.2026
TGA H2	8w	25.05.2026	17.07.2026
32 Gitterwände H2	1w	20.07.2026	24.07.2026
Haus 7	12w	30.03.2026	19.06.2026
Schließanlage	1w	28.09.2026	02.10.2026
22 Raumnummern	1w	05.10.2026	09.10.2026
23 Endreinigung	1w	12.10.2026	16.10.2026
Freianlagen	37w	09.02.2026	23.10.2026
Baumfällungen	2w	09.02.2026	20.02.2026
Landschaftsbau / Medientiefbau	12w	01.06.2026	21.08.2026
Wege in Gewächshausnähe	16w	06.07.2026	23.10.2026
ELT Fangstangen Blitzschutz	3w	01.06.2026	19.06.2026
TGA in Außenanlagen	8w	01.06.2026	24.07.2026
Abnahmen	1w	26.10.2026	30.10.2026
Mängelbeseitigung, Abrechnung, VN	2w	02.11.2026	13.11.2026
Fertigstellung BBSR		13.11.2026	13.11.2026
EFRE	64w	22.12.2025	12.03.2027

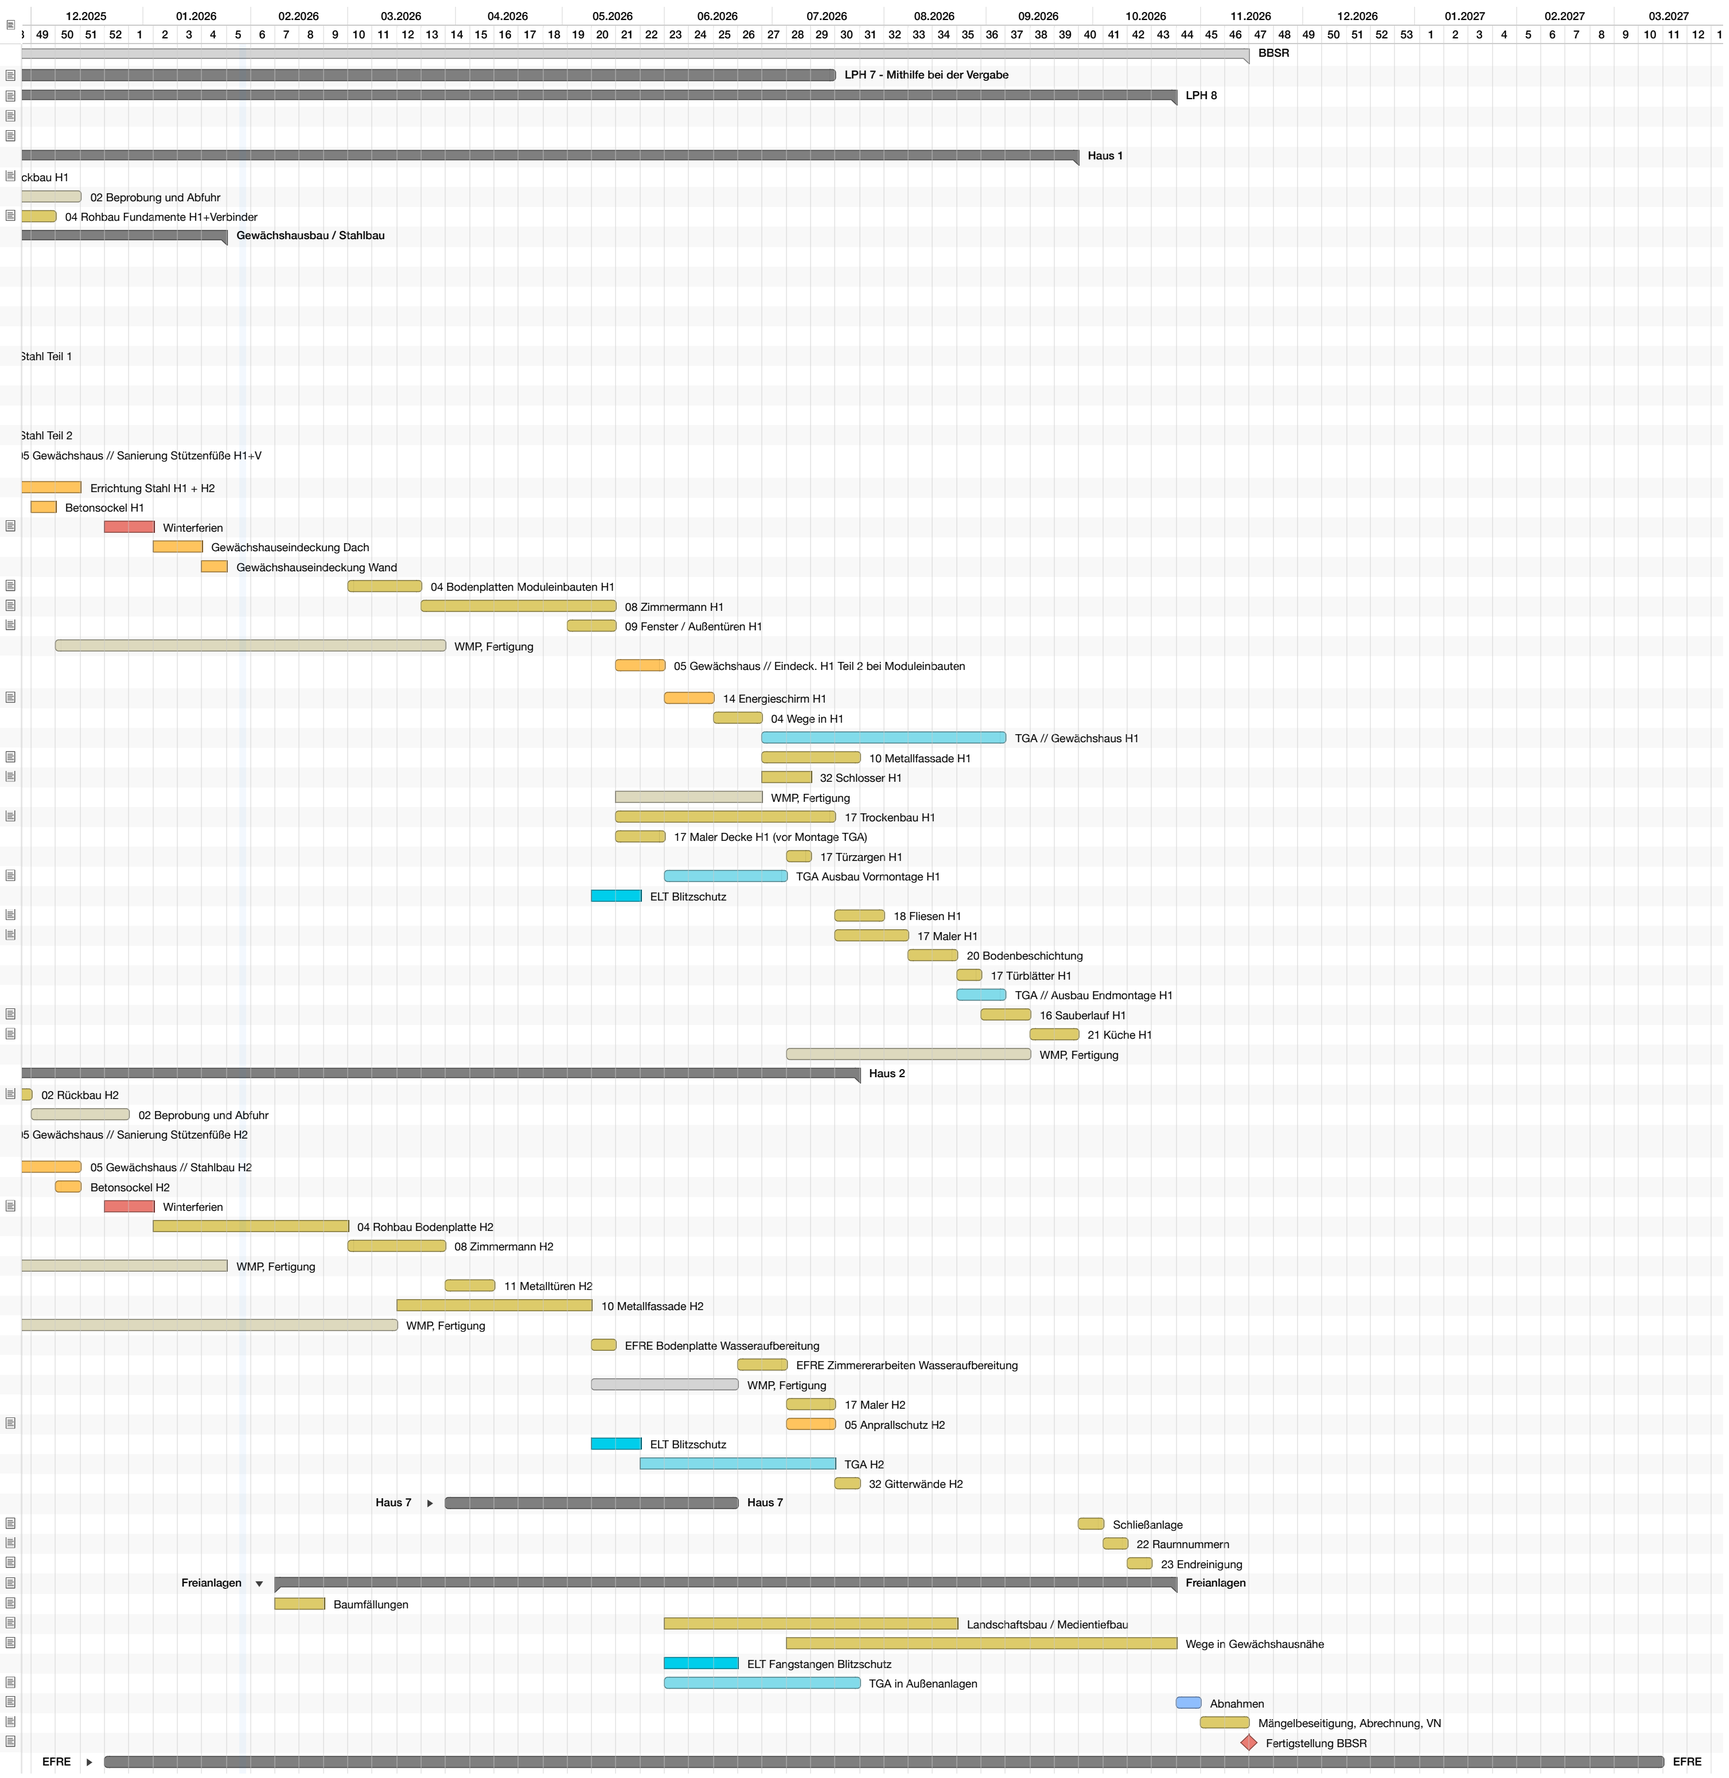

Langhansstraße 123 . 13086 Berlin . Germany
tel +49 30 5771 0361 . email a2f@a2f.de
