Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
89	**0106_GWC_Max-Grünebaum-Str. 3-6_Cottbus_LP8**	130at	Mo, 22.06.26	Fr, 18.12.26
89.1	LP8_Ausführung / Baustellenstart	1at	Mo, 29.06.26	Mo, 29.06.26
89.2	**000_Baustelleneinrichtung**	130at	Mo, 22.06.26	Fr, 18.12.26
89.3	Baustelleneinrichtung einsatzbereit	1at	Mo, 29.06.26	Mo, 29.06.26
89.4	**084_Demontage Balkone**	25at	Mo, 29.06.26	Fr, 31.07.26
89.4.1	Gerüst (nur für Abriss), alternativ Hebebühne in Absprache SIGEKO (Montagekonzept) / Einrichtung BE-Abrissarbeiten	5at	Mo, 29.06.26	Fr, 03.07.26
89.4.2	Vorbereitungsarbeiten Abriss / Sicherung Balkontüren / Entfernen Morinolfugen Fassade / Abriss Gefälleestrich / Anschlagpunkte etc.	10at	Mo, 06.07.26	Fr, 17.07.26
89.4.3	Demontage und Entsorgung der Balkon-Anlagen 8 Stk (je 5 Balkone)	5at	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26
89.4.4	Nachbereitungsarbeiten bzw. Beräumung BE Abriss / Rückbau Gerüst (nur für Abriss)	5at	Mo, 27.07.26	Fr, 31.07.26
89.5	Abbruch Podest Eingangsbereich ZBV Hnr.6 **(Zeitraum ca. 3 Tage) /** / *Abstimmung mit Arbeiten Los 081b_Bearbeitung_Teilgiebel Süd / östl. Fassade ZBW Süd_HNr.6 notwendig!!!*	75at	Mo, 03.08.26	Fr, 13.11.26
89.6	**081a_Betonerhaltungsarbeiten HE-Fassade**	95at	Mo, 06.07.26	Fr, 13.11.26
89.6.1	Aufbau Gerüst	5at	Mo, 06.07.26	Fr, 10.07.26
89.6.2	vorbereitende Arbeiten	5at	Mo, 13.07.26	Fr, 17.07.26
89.6.3	Fugensanierung / Entfernen Morinolfugen Fassade	10at	Mo, 20.07.26	Fr, 31.07.26
89.6.4	Fugensanierung / Reprofilierung etc.	28at	Mo, 03.08.26	Mi, 09.09.26
89.6.5	FB und Leibungsdämmung	20at	Mo, 03.08.26	Fr, 28.08.26
89.6.6	Betoninstandsetzung	20at	Do, 13.08.26	Mi, 09.09.26
89.6.7	Oberflächenbehandlung (inkl. Farbbeschichtung) Fassade HE-Seite	25at	Do, 10.09.26	Mi, 14.10.26
89.6.8	Rückbau Gerüst HE-Seite	5at	Do, 15.10.26	Mi, 21.10.26
89.6.9	Sockelbearbeitung / Rollkiesstreifen	17at	Do, 22.10.26	Fr, 13.11.26
89.6.10	***Bearbeitung_Teilgiebel Süd / westl Fassade ZBW Süd / Durchgang ZBW Süd_HNr.6***	73at	Mo, 06.07.26	Mi, 14.10.26
89.6.10.1	z. B. Gerüst und Bearbeitung Teilgiebel Süd, Fassadenfläche West ZBW Süd und Durchgang_ZBW Süd_**ACHTUNG Angabe Zeitraum ca. 6 Wochen**	73at	Mo, 06.07.26	Mi, 14.10.26
89.6.10.2	z. B. Aufbau Gerüst	2at	Mo, 06.07.26	Di, 07.07.26
89.6.10.3	z. B. vorbereitende Arbeiten	5at	Mi, 08.07.26	Di, 14.07.26
89.6.10.4	z. B. Fugensanierung / Entfernen Morinolfugen	5at	Mi, 08.07.26	Di, 14.07.26
89.6.10.5	z: B. Fugensanierung / Reprofilierung etc. westl. Fassade	5at	Mi, 15.07.26	Di, 21.07.26
89.6.10.6	z. B. FB (Fensterbretter) und Leibungsdämmung	10at	Mi, 15.07.26	Di, 28.07.26
89.6.10.7	z. B. Betoninstandsetzung	10at	Mi, 15.07.26	Di, 28.07.26
89.6.10.8	z. B. Oberflächenbehandlung (inkl. Farbbeschichtung)	10at	Mi, 29.07.26	Di, 11.08.26
89.6.10.9	z. B. Rückbau Gerüst	2at	Mi, 12.08.26	Do, 13.08.26
89.6.11	***Bearbeitung_Teilgiebel Nord / westl. Fassade ZBW Nord / Durchgang ZBW Nord_HNr.2***	73at	Mo, 06.07.26	Mi, 14.10.26
89.6.11.1	z. B. Gerüst und Bearbeitung Teilgiebel Nord, Fassadenfläche West ZBW Nord und Durchgang_ZBW Nord_**ACHTUNG Angabe Zeitraum ca. 9 Wochen**	73at	Mo, 06.07.26	Mi, 14.10.26
89.6.11.2	z. B. Aufbau Gerüst	3at	Mo, 06.07.26	Mi, 08.07.26
89.6.11.3	z. B. vorbereitende Arbeiten	7at	Do, 09.07.26	Fr, 17.07.26
89.6.11.4	z. B. Fugensanierung / Entfernen Morinolfugen Nord	7at	Do, 09.07.26	Fr, 17.07.26
89.6.11.5	z: B. Fugensanierung / Reprofilierung etc.	5at	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26
89.6.11.6	z. B. FB (Fensterbretter) und Leibungsdämmung	10at	Mo, 20.07.26	Fr, 31.07.26
89.6.11.7	z. B. Betoninstandsetzung	15at	Mo, 20.07.26	Fr, 07.08.26
89.6.11.8	z. B. Oberflächenbehandlung (inkl. Farbbeschichtung)	18at	Mo, 10.08.26	Mi, 02.09.26
89.6.11.9	z. B. Rückbau Gerüst HE-Seite	2at	Do, 03.09.26	Fr, 04.09.26
89.7	**081b_Betonerhaltungsarbeiten Balkone, Fassade**	95at	Mo, 03.08.26	Fr, 11.12.26
89.7.1	Aufbau Gerüst (nach Abriss Balkonanlagen)	5at	Mo, 03.08.26	Fr, 07.08.26
89.7.2	vorbereitende Arbeiten	5at	Mo, 10.08.26	Fr, 14.08.26
89.7.3	Fugensanierung / Reprofilierung etc.	15at	Mo, 17.08.26	Fr, 04.09.26
89.7.4	Betoninstandsetzung / Reinigung Fassade bzw. Rückwände Balkone (z.T.Sandstrahlen)	10at	Mo, 17.08.26	Fr, 28.08.26
89.7.5	FB (Fensterbretter) und Leibungsdämmung	20at	Mo, 17.08.26	Fr, 11.09.26
89.7.6	Betoninstandsetzung	10at	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26
89.7.7	Oberflächenbehandlung (inkl. Farbbeschichtung)	30at	Mo, 14.09.26	Fr, 23.10.26
89.7.8	Balkonrückwand- und Austrittbeschichtung	20at	Mo, 12.10.26	Fr, 06.11.26
89.7.9	Rückbau Gerüst (anschließend Balkonkonstruktion Los 100)	5at	Mo, 09.11.26	Fr, 13.11.26
89.7.10	Sockel u. Rollkiesstreifen, Rollkiesflächen unter den Balkonen	20at	Mo, 16.11.26	Fr, 11.12.26
89.7.11	***Bearbeitung_Teilgiebel Süd / östl. Fassade ZBW Süd_HNr.6***	75at	Mo, 03.08.26	Fr, 13.11.26
89.7.11.1	z. B. Gerüst und Bearbeitung Teilgiebel Süd, Fassadenfläche Ost ZBW Süd_**ACHTUNG Angabe Zeitraum ca. 5 Wochen**	75at	Mo, 03.08.26	Fr, 13.11.26
89.7.11.2	z. B. Aufbau Gerüst	2at	Mo, 03.08.26	Di, 04.08.26
89.7.11.3	z. B. vorbereitende Arbeiten	10at	Mi, 05.08.26	Di, 18.08.26
89.7.11.4	z. B. Fugensanierung / Entfernen Morinolfugen östl. Fassade	10at	Mi, 05.08.26	Di, 18.08.26
89.7.11.5	z: B. Fugensanierung / Reprofilierung etc. östl. Fassade	5at	Mi, 19.08.26	Di, 25.08.26
89.7.11.6	z. B. Oberflächenbehandlung (inkl. Farbbeschichtung)	7at	Mi, 26.08.26	Do, 03.09.26
89.7.11.7	z.B. Rückbau Gerüst	1at	Fr, 04.09.26	Fr, 04.09.26
89.7.12	Instandsetzung Sockelbereich Podest Eingangsbereich ZBV Hnr.6 **(Zeitraum ca. 5 Tage)** / *Abstimmung mit Arbeiten Los 084_Abbruch notwendig!!!*	75at	Mo, 03.08.26	Fr, 13.11.26
89.7.13	***Bearbeitung_Teilgiebel ZBV Nord / östl. Fassade ZBW Nord / Teilgiebel ZBV Süd_HNr.2***	75at	Do, 13.08.26	Mi, 25.11.26
89.7.13.1	Gerüst und Bearbeitung Teilgiebel Nord, Fassadenfläche Ost ZBV Nord_ **ACHTUNG Angabe Zeitraum ca. 7 Wochen**	75at	Do, 13.08.26	Mi, 25.11.26
89.7.13.2	z.B. Aufbau Gerüst	5at	Do, 13.08.26	Mi, 19.08.26
89.7.13.3	z.B. vorbereitende Arbeiten	5at	Do, 20.08.26	Mi, 26.08.26
89.7.13.4	z. B. Fugensanierung / Entfernen Morinolfugen östl. Fassade	10at	Do, 27.08.26	Mi, 09.09.26
89.7.13.5	z: B. Fugensanierung / Reprofilierung etc. östl. Fassade	5at	Do, 10.09.26	Mi, 16.09.26
89.7.13.6	z. B. Oberflächenbehandlung (inkl. Farbbeschichtung)	7at	Do, 17.09.26	Fr, 25.09.26
89.7.13.7	z.B. Reinigung, Betoninstandsetzung und Farbbeschichtung in Teilbereichen (in Absprache mit BL) östl. Fassadenfläche ZBW HNr.2, je nach Umfang auch mit Hebebühne möglich	12at	Do, 10.09.26	Fr, 25.09.26
89.7.13.8	z.B. Rückbau Gerüst	3at	Mo, 28.09.26	Mi, 30.09.26
89.8	**100_Einzelbalkon-Anlagen (8x5)**	15at	Mo, 16.11.26	Fr, 04.12.26
89.8.1	Vorbereitung / Einrichtung Fundamente für Doppelbalkonanlagen	2at	Mo, 16.11.26	Di, 17.11.26
89.8.2	Erdarbeiten / Herstellung Fundamente für Einzelbalkon-Anlage 8 Stk + Erdung	3at	Mi, 18.11.26	Fr, 20.11.26
89.8.3	Montage Einzelbalkon-Anlage 8 Stk + Erdung + Fallrohre	10at	Mo, 23.11.26	Fr, 04.12.26
89.9	**Los 003 Landschaftsbauarbeiten (Außenanlagen)**	20at	Mo, 23.11.26	Fr, 18.12.26

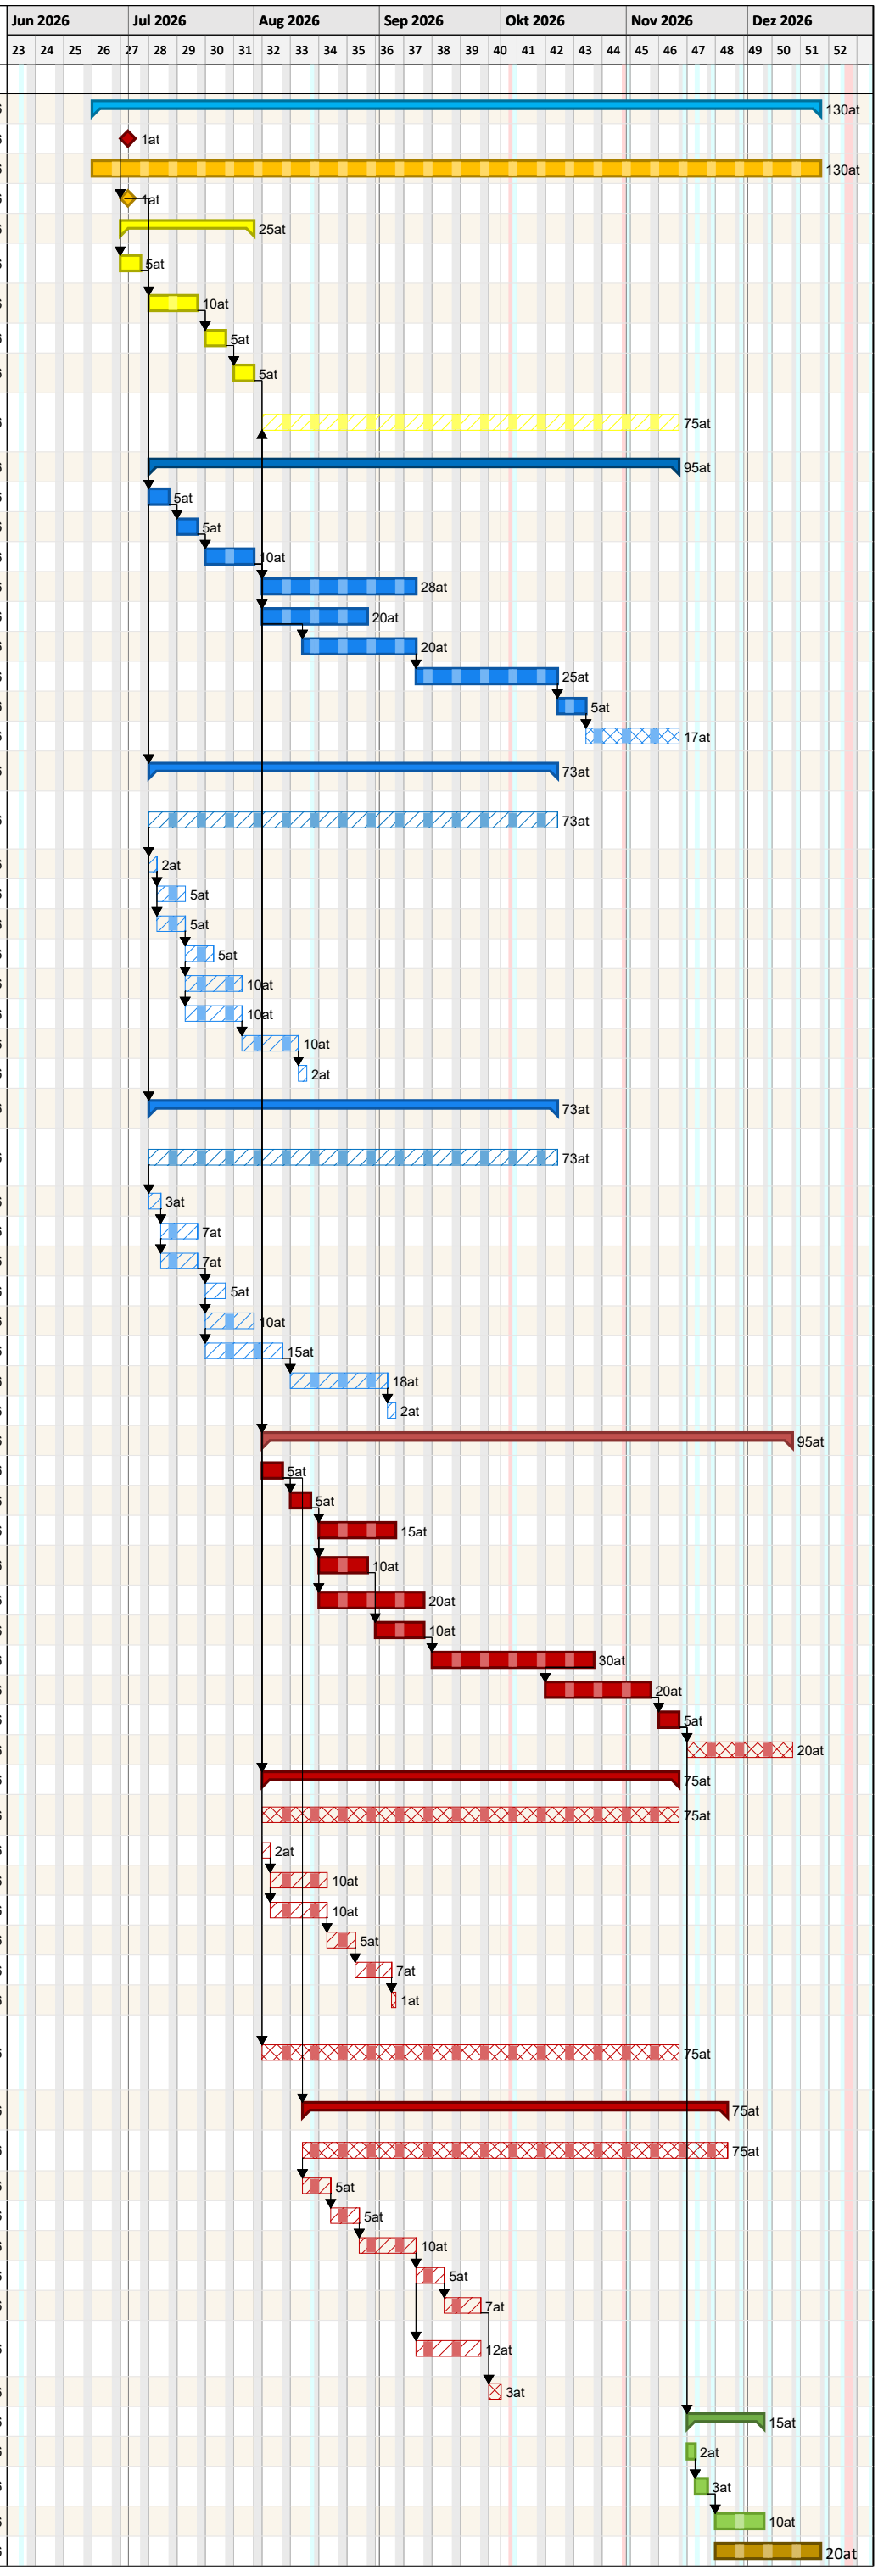

erstellt mit pro:Plan 2024 (24.0.0.6) Serien Nr.: PPL24-727898888754 Lizenz für Kobel Architekten u. Ingenieure, Cottbus
