Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Nachfolger
1	Planung	1091 Tage	Mon 16.01.23	Mon 12.04.27			
376	Lph8	470 Tage	Mon 05.10.26	Fre 11.08.28			
377	Bauabschnitt 1	390 Tage	Mon 05.10.26	Fre 21.04.28			481
378	Baubeginn	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26	218		380;379
379	BE (Container/Bauzaun)	71 Wochen	Mon 02.11.26	Fre 31.03.28	437EE;378	Los 01 BE	
380	Abbruch/Entsorgung Asphalt, Tartan, Oberboden, Bäume	2 Wochen	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26	378	Los 02 Tiefbauarbeiten	381
381	Absteckung/Einmessung	1 Woche	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	380	Vermesser	385;382
382	Aushub Rigole	1 Woche	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26	381	Los 02 Tiefbauarbeiten	383
383	Einbau Rigole	1 Woche	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26	382	Los 02 Tiefbauarbeiten	384
384	Verfüllung und Schutz	1 Woche	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26	383	Los 02 Tiefbauarbeiten	385
385	Aushub/Entsorgung/Schutzmaßnahme Geländegefälle	2 Wochen	Mon 14.12.26	Fre 15.01.27	381;384	Los 02 Tiefbauarbeiten	386;388
386	Einbau Kontroll-, Schmutz-, Regenwasserschächte, Pumpestation	1 Woche	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	385	Los 02 Tiefbauarbeiten	387
387	Leitungsgraben/Bodenaustausch	1 Woche	Mon 25.01.27	Fre 29.01.27	386	Los 02 Tiefbauarbeiten	389
388	Winkelwände L-Elemente Einbau	1 Woche	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	385	Los 04 Rohbauarbeiten	
389	Einbau Grundleitung	1 Woche	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27	387	Los 04 Rohbauarbeiten	390
390	Verfüllung/Planum/Aufzugunterfahrt/Fundamentaushub	2 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27	389	Los 02 Tiefbauarbeiten	391
391	Fundamente/Frostzschürze/Aufzugunterfahrt Betonage	2 Wochen	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27	390	Los 04 Rohbauarbeiten	393
392	Werk- Montagepläne/Genehmigung/Bestellung/Lieferung Fertigteilelemente	8 Wochen	Mon 11.01.27	Fre 05.03.27	393AA-8 Woch	Los 04 Rohbauarbeiten	
393	Fertigteilbeton Stützen	1 Woche	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27	391	Los 04 Rohbauarbeiten	392AA-8 Wochen;394
394	Sauberkeitsschicht/Abdichtung/Dämmung	2 Wochen	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27	393	Los 04 Rohbauarbeiten	395
395	Schalung/Bewehrung/Betonage Betonbodenplatte	3 Wochen	Mon 29.03.27	Fre 16.04.27	394	Los 04 Rohbauarbeiten	397;396EA+1 Woche
396	Gerüstbau	22 Wochen	Mon 12.07.27	Fre 10.12.27	425EE;395EA+	Los 03 Gerüstbau	
397	Einbau Wände EG	5 Wochen	Mon 19.04.27	Fre 21.05.27	395	Los 04 Rohbauarbeiten	398
398	Einbau Decke EG / Treppen Fertigteil / Betonage	3 Wochen	Mon 24.05.27	Fre 11.06.27	397	Los 04 Rohbauarbeiten	399
399	Einbau Wände OG und Fertigteilwände Halle	3 Wochen	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27	398	Los 04 Rohbauarbeiten	401;402
400	Werk- Montagepläne/Genehmigung/Bestellung/Lieferung Holzelemente	8 Wochen	Mon 10.05.27	Fre 02.07.27	401AA-8 Woch	Los 04 Rohbauarbeiten	
401	Brettschichtträger / Holzbalken / Schutzmaßnahme	1 Woche	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27	399	Los 04 Rohbauarbeiten	400AA-8 Wochen;403
402	Einbau Decke OG	3 Wochen	Mon 05.07.27	Fre 23.07.27	399	Los 04 Rohbauarbeiten	405;408EA+1 Woche;406
403	Trapezbleche Halle	2 Wochen	Mon 12.07.27	Fre 23.07.27	401	Los 04 Rohbauarbeiten	
404	Abdichtung / Perimiterdämmung Wände EG	1 Woche	Mon 19.07.27	Fre 23.07.27	405AA-1 Woch	Los 04 Rohbauarbeiten	
405	Restleistung/Schutzmaßnahmen/Gerüstabbau Rohbau	1 Woche	Mon 26.07.27	Fre 30.07.27	402	Los 04 Rohbauarbeiten	404AA-1 Woche;478
406	Unterkonstruktion Dach KG 400 (PV-Anlage, Luftung, Blitzschutz)	1 Woche	Mon 26.07.27	Fre 30.07.27	402	KG 400	
407	Werk- Montagepläne/Genehmigung/Bestellung/Lieferung Gefälledämmung	6 Wochen	Mon 21.06.27	Fre 30.07.27	408AA-6 Woch	Los 05 Dachabdichtung	
408	Dampfsperre/UK Dachleiter/Anschlagsystem Seile/Dacheinlauf/Lichtkuppeln Einbau	1 Woche	Mon 02.08.27	Fre 06.08.27	402EA+1 Woch	Los 05 Dachabdichtung	407AA-6 Wochen;409
409	Dachdämmung	1 Woche	Mon 09.08.27	Fre 13.08.27	408	Los 05 Dachabdichtung	410
410	Dachabdichtung	2 Wochen	Mon 16.08.27	Fre 27.08.27	409	Los 05 Dachabdichtung	429;439EA+1 Woche;427;42
411	Attika Abdeckung	2 Wochen	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27	410	Los 05 Dachabdichtung	413
412	Rohinstallation Halle (Elektro, Heizung, Beleuchtung)	3 Wochen	Mon 30.08.27	Fre 17.09.27	410	KG 400	
413	Dachbekiesung und -grünung	2 Wochen	Mon 13.09.27	Fre 24.09.27	411	Los 05 Dachabdichtung	414
414	Blitzschutz (Dach + Fassade)	1 Woche	Mon 27.09.27	Fre 01.10.27	413	KG 400	
415	Werk- Montagepläne/Genehmigung/Bestellung/Lieferung Türen u. Fenster	8 Wochen	Mon 05.07.27	Fre 27.08.27	417AA-8 Woch	Los 06 Fenster	
416	Stahltüren Einbau	1 Woche	Mon 30.08.27	Fre 03.09.27	410	Los 10 Schlosser	
417	Alu-Fenster-Türen / Sonnenschutz / Außenfensterbank	2 Wochen	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27	410	Los 06 Fenster	415AA-8 Wochen;419;418
418	Hallenwand spachteln und streichen (Erstanstrich)	3 Wochen	Mon 13.09.27	Fre 01.10.27	417	Los 12 Maler	430
419	Fassadendämmung OG	3 Wochen	Mon 13.09.27	Fre 01.10.27	417	Los 07 WDVS	422;420
420	Klinkerriemchen/Armierung/Putz Fassade OG	3 Wochen	Mon 04.10.27	Fre 22.10.27	419	Los 07 WDVS	421
421	Armierung/Putz Leibung OG	2 Wochen	Mon 25.10.27	Fre 05.11.27	420	Los 07 WDVS	
422	Fassadendämmung EG	3 Wochen	Mon 04.10.27	Fre 22.10.27	419	Los 07 WDVS	423
423	Klinkerriemchen/Armierung/Putz Fassade EG	3 Wochen	Mon 25.10.27	Fre 12.11.27	422	Los 07 WDVS	424
424	Fallrohre	2 Wochen	Mon 15.11.27	Fre 26.11.27	423	Los 05 Dachabdichtung	425
425	Gerüstabbau	2 Wochen	Mon 29.11.27	Fre 10.12.27	424	Los 03 Gerüstbau	396EE;426EA+3 Wochen
426	Restverfüllung Wände	1 Woche	Mon 03.01.28	Fre 07.01.28	425EA+3 Woch	Los 02 Tiefbauarbeiten	
427	Aufzug Einbau	3 Wochen	Mon 30.08.27	Fre 17.09.27	410		
428	UK Trockenbau	2 Wochen	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27	410	Los 08 Trockenbau	
429	UK Sportgeräte Halle	2 Wochen	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27	410	Los 16 Sportgeräte	
430	Prallwand UK	2 Wochen	Mon 04.10.27	Fre 15.10.27	418	Los 14 Prallwand	431
431	Endbeschichtung Halle	2 Wochen	Mon 18.10.27	Fre 29.10.27	430	Los 12 Maler	433;432
432	Innenfensterbank Halle	1 Woche	Mon 01.11.27	Fre 05.11.27	431	Los 06 Fenster	
433	Abdichtung/Ausgleich/Dämmung Halle	2 Wochen	Mon 01.11.27	Fre 12.11.27	431	Los 14 Prallwand	
434	Sportboden Duplex Uno VST 25	2 Wochen	Mon 07.02.28	Fre 18.02.28	465	Los 14 Prallwand	435
435	Bodenbelag Linoleum Halle	2 Wochen	Mon 21.02.28	Fre 03.03.28	434	Los 14 Prallwand	436;437
436	Schutz Hallenboden	4 Wochen	Mon 06.03.28	Fre 31.03.28	435	Los 14 Prallwand	
437	Prallwand (MDF-Paneele) + Anschluss	3 Wochen	Mon 06.03.28	Fre 24.03.28	435	Los 14 Prallwand	438;379EE
438	Feininstallation TGA Halle	2 Wochen	Mon 27.03.28	Fre 07.04.28	437	KG 400	
439	Spachtel/Farbe Lager, Neben- und Technikräume (Vorabmaßnahme)	1 Woche	Mon 06.09.27	Fre 10.09.27	410EA+1 Woch	Los 12 Maler	440
440	Rohinstallation TGA OG	2 Wochen	Mon 13.09.27	Fre 24.09.27	439	KG 400	441
441	Trockenbauwand Beplankung/Spachtelung	2 Wochen	Mon 27.09.27	Fre 08.10.27	440	Los 08 Trockenbau	442;447
442	Estrich Ausgleich/Dämmung OG	1 Woche	Mon 11.10.27	Fre 15.10.27	441	Los 11 Estrich	443
443	Trittschall/Systemplatten OG	1 Woche	Mon 18.10.27	Fre 22.10.27	442	KG 400	444
444	Estrichverlegung OG + Trocknungszeit	2 Wochen	Mon 25.10.27	Fre 05.11.27	443	Los 11 Estrich	446;445
445	Türzargen OG	1 Woche	Mon 08.11.27	Fre 12.11.27	444	Los 09 Tischler	
446	Brüstung Glas Tribüne	1 Woche	Mon 08.11.27	Fre 12.11.27	444	Los 10 Schlosser	
447	Rohinstallation TGA EG	2 Wochen	Mon 11.10.27	Fre 22.10.27	441	KG 400	448
448	Estrich Ausgleich/Dämmung EG	1 Woche	Mon 25.10.27	Fre 29.10.27	447	Los 11 Estrich	449
449	Trittschall/Systemplatten EG	1 Woche	Mon 01.11.27	Fre 05.11.27	448	KG 400	450
450	Estrichverlegung EG + Trocknungszeit	2 Wochen	Mon 08.11.27	Fre 19.11.27	449	Los 11 Estrich	451
451	Türzargen EG	1 Woche	Mon 22.11.27	Fre 26.11.27	450	Los 09 Tischler	452
452	Malervlies auf Beton OG	2 Wochen	Mon 29.11.27	Fre 10.12.27	451	Los 12 Maler	453;461
453	Ausgleich/Abdichtung/Fliesen OG	2 Wochen	Mon 13.12.27	Fre 24.12.27	452	Los 13 Fliesen	454;455
454	Fliesenarbeiten TRH 01	1 Woche	Mon 27.12.27	Fre 31.12.27	453	Los 13 Fliesen	463
455	Wandbeschichtung OG	2 Wochen	Mon 27.12.27	Fre 07.01.28	453	Los 12 Maler	457;456
456	Feininstallation OG	2 Wochen	Mon 10.01.28	Fre 21.01.28	455	KG 400	459
457	Bodenbelag OG	2 Wochen	Mon 10.01.28	Fre 21.01.28	455	Los 15 Bodenbelag	465;458
458	Türblätter OG	1 Woche	Mon 24.01.28	Fre 28.01.28	457	Los 09 Tischler	
459	Endbeschichtung OG	1 Woche	Mon 24.01.28	Fre 28.01.28	456	Los 12 Maler	460
460	Unterhangdecke OG	2 Wochen	Mon 31.01.28	Fre 11.02.28	459	Los 08 Trockenbau	
461	Malervlies auf Beton EG	2 Wochen	Mon 13.12.27	Fre 24.12.27	452	Los 12 Maler	462
462	Bodenbelag Technikräume EG	1 Woche	Mon 27.12.27	Fre 31.12.27	461	Los 15 Bodenbelag	
463	Ausgleich/Abdichtiung/Fliesen EG	2 Wochen	Mon 03.01.28	Fre 14.01.28	454	Los 13 Fliesen	464
464	Fliesenarbeiten TRH 02	1 Woche	Mon 17.01.28	Fre 21.01.28	463	Los 13 Fliesen	
465	Bodenbelag EG	2 Wochen	Mon 24.01.28	Fre 04.02.28	457	Los 15 Bodenbelag	466;434;477EA+2 Wochen
466	Feininstallation EG	2 Wochen	Mon 07.02.28	Fre 18.02.28	465	KG 400	467
467	Endbeschichtung EG	1 Woche	Mon 21.02.28	Fre 25.02.28	466	Los 12 Maler	470;471;472;473;474;475;46
468	Innenfensterbank	1 Woche	Mon 28.02.28	Fre 03.03.28	467	Los 06 Fenster	
469	Türblätter EG	1 Woche	Mon 28.02.28	Fre 03.03.28	467	Los 09 Tischler	
470	Unterhangdecke EG	2 Wochen	Mon 28.02.28	Fre 10.03.28	467	Los 08 Trockenbau	

Projekt: 240909_Bauablaufplan
Datum: 23.1.24

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Nachfolger
471	Feinmontage Fenster/Türen	1 Woche	Mon 28.02.28	Fre 03.03.28	467	Los 06 Fenster	
472	Feinmontage/Schließanlage Stahltüren	1 Woche	Mon 28.02.28	Fre 03.03.28	467	Los 10 Schlosser	
473	Feinmontage/Schließanlage Türen	1 Woche	Mon 28.02.28	Fre 03.03.28	467	Los 09 Tischler	
474	Bodenindikatoren (TRH)	1 Woche	Mon 28.02.28	Fre 03.03.28	467	Los 15 Bodenbelag	
475	Beschrifftung und Rettungsweg	1 Woche	Mon 28.02.28	Fre 03.03.28	467	Los 17 Beschriftung	476EA+1 Woche
476	Baureinigung	2 Wochen	Mon 13.03.28	Fre 24.03.28	475EA+1 Woch		
477	Vorbegehung	3 Wochen	Mon 21.02.28	Fre 10.03.28	465EA+2 Woch		
478	VOB-Abnahmen	35 Wochen	Mon 02.08.27	Fre 31.03.28	405		480EA+1 Woche;479EE-4 W
479	Mängelbeseitigung	4 Wochen	Mon 07.02.28	Fre 03.03.28	478EE-4 Woche		
480	Übergabe/Nutzungsaufnahme	2 Wochen	Mon 10.04.28	Fre 21.04.28	478EA+1 Woch		482
481	Bauabschnitt 2	415 Tage	Mon 21.12.26	Fre 11.08.28	377		
482	Abbruch Bestand	4 Wochen	Mon 24.04.28	Fre 19.05.28	480		490
483	Schulferien Weihnachten 2026/27	2 Tage	Mon 21.12.26	Fre 01.01.27			
484	Schulferien Winter 2027	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27			
485	Schulferien Ostern 2027	10 Tage	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27			
486	Schulferien Sommer 2027	6,4 Wochen	Don 01.07.27	Fre 13.08.27			
487	Schulferien Herbst 2027	2 Wochen	Mon 11.10.27	Fre 22.10.27			
488	Schulferien Weihnachten 2027/28	1,4 Wochen	Don 23.12.27	Fre 31.12.27			
489	Schulferien Winter 2028	1 Woche	Mon 31.01.28	Fre 04.02.28			
490	Aussenanlagen Bauabschnitt 2	12 Wochen	Mon 22.05.28	Fre 11.08.28	482		491
491	Fertigstellung	0 Tage	Fre 11.08.28	Fre 11.08.28	490		

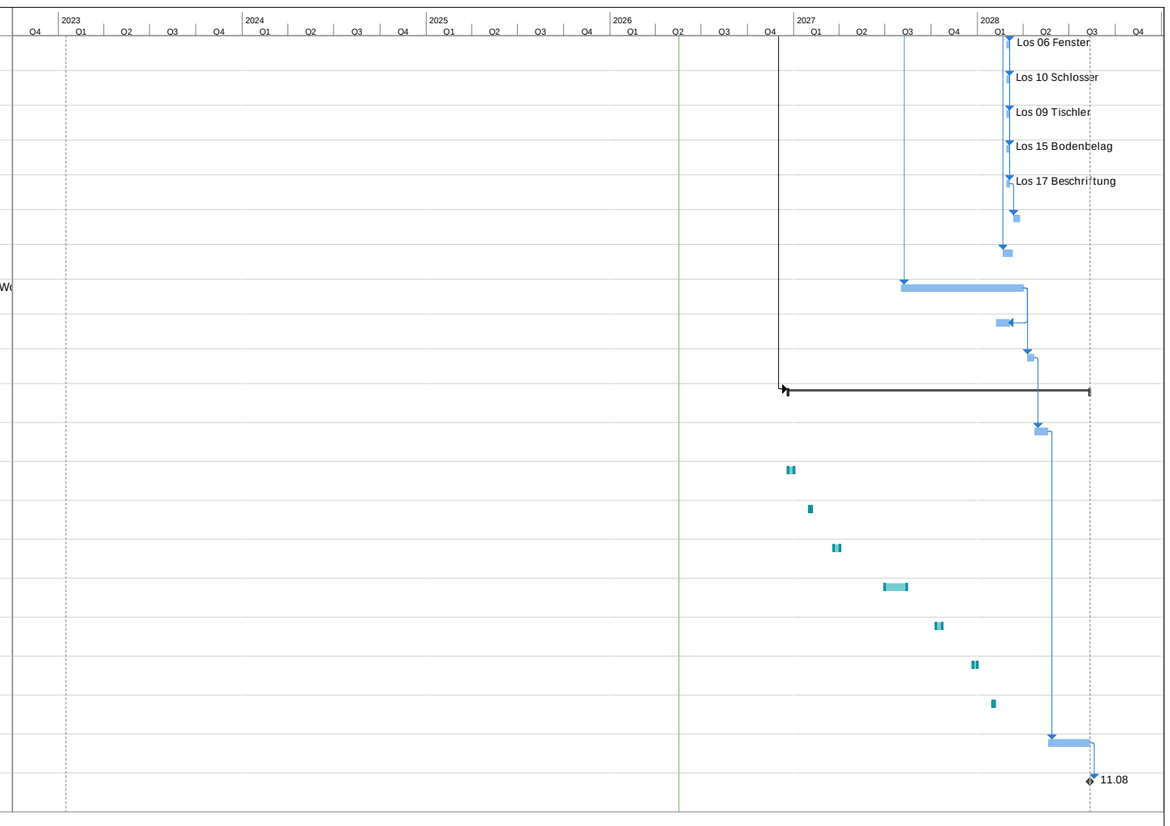

Projekt: 240909_Bauablaufplan
Datum: 23.1.24

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit
