Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
201	**0118_GWC_Zuschka 25-39_Cottbus_LP8**			
202	ORGA (zu beachten)_Abriss REWE	65at	Mo, 24.08.26	Fr, 20.11.26
203	**000_Baustelleneinrichtung**			
204	000_BE für BA1_HNr. 31-33	80at	Di, 01.09.26	Mo, 21.12.26
205	000_BE für BA1_HNr. 31-33	50at	Mo, 15.02.27	Di, 27.04.27
206	BA2/BA3	121at	Mo, 15.02.27	Fr, 06.08.27
207	**084_Abbrucharbeiten /Balkonbrüstungen**			
208	084_Abbrucharbeiten /Balkonbrüstungen BA1_HNr. 31-33	3at	Do, 03.09.26	Mo, 07.09.26
209	BA2/BA3	121at	Mo, 15.02.27	Fr, 06.08.27
210	**023a_Putz- und WDVS_BA1_HNr. 31-33**	163at	Mo, 07.09.26	Di, 27.04.27
210.1	Aufbau Gerüst HE-Seite	5at	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
210.2	vorbereitende Arbeiten / Reinigung der Flächen und fungizide Behandlung / Hinterfüllung bestehendes WDVS (Erreichung eines Klebeflächenanteils von ≥ 40 %) etc.	5at	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
210.3	Brandriegel (Verklebung+Verdübelung auf Beton) / teilweise Rückbau lose Putz- und Armierungsbereiche / Ausbesserungsarbeiten (Egalisierung) etc.	20at	Mo, 21.09.26	Fr, 16.10.26
210.4	WDVS-Arbeiten / Kleben, Dübeln, Armierung, Fensterbretter, Leibungsdämmung etc.	25at	Mo, 12.10.26	Fr, 13.11.26
210.5	Oberputz / Farbbeschichtung etc.	20at	Mo, 16.11.26	Fr, 11.12.26
210.6	Rückbau Gerüst	5at	Mo, 14.12.26	Fr, 18.12.26
210.7	Teilgiebel ZBV HNr.31 / z. B. Gerüst und Bearbeitung_**ACHTUNG Angabe Zeitraum ca. 3 Wochen**	60at	Mo, 21.09.26	Fr, 11.12.26
211	**BEARBEITUNG Sockel + Rampen/Vordächer**			
210.8	Bearbeitung Rampen (mittels Rollgerüst) / Vordächer HE	25at	Mo, 01.03.27	Di, 06.04.27
210.9	Sockelbearbeitung	20at	Mo, 08.03.27	Di, 06.04.27
212	**023b_Putz- und WDVS (inkl. Balkone)_BA1_HNr. 31-33 BEARBEITUNG bis 1. Brandriegel zwischen EG u 1.OG**			
210.10	Aufbau Gerüst Balkonseite	5at	Mo, 07.09.26	Fr, 11.09.26
210.11	vorbereitende Arbeiten / Beräumung bzw. Rückbau Balkonaufbauten (Bodenbeläge) etc.	5at	Mo, 14.09.26	Fr, 18.09.26
210.12	vorbereitende Arbeiten / Nass-Sandstrahlen der Balkonflächen	5at	Mo, 21.09.26	Fr, 25.09.26
210.13	vorbereitende Arbeiten / Reinigung der Flächen und fungizide Behandlung / Hinterfüllung bestehendes WDVS (Erreichung eines Klebeflächenanteils von ≥ 40 %) etc.	5at	Do, 24.09.26	Mi, 30.09.26
210.14	Brandriegel (Verklebung+Verdübelung auf Beton) / teilweise Rückbau lose Putz- und Armierungsbereiche / Ausbesserungsarbeiten (Egalisierung) etc.	20at	Di, 29.09.26	Mo, 26.10.26
210.15	Betoninstandsetzung / u.a. Überarbeitung Fugen BSW, Ausbesserungen DP, Egalisierung Oberflächen	24at	Di, 20.10.26	Fr, 20.11.26
210.16	WDVS-Arbeiten / Kleben, Dübeln, Armierung, Fensterbretter, Leibungsdämmung, Balkonvorbereitungsarbeiten etc.	34at	Di, 06.10.26	Fr, 20.11.26
210.17	Oberputz / Farbbeschichtung, Balkonbeschichtung etc.	20at	Mo, 16.11.26	Fr, 11.12.26
210.18	Rückbau Gerüst	4at	Di, 15.12.26	Fr, 18.12.26
210.19	Teilgiebel ZBV HNr.31 / z. B. Gerüst und Bearbeitung_**ACHTUNG Angabe Zeitraum ca. 3 Wochen**	54at	Di, 29.09.26	Fr, 11.12.26
213	**BEARBEITUNG ab 1. Brandriegel bis Sockelanschluss ca. -0,3m uGOK Gelände (inkl. Kellerlichtschächte)**			
210.20	Entnehmen Pflaster / Erdarbeiten / Kellerlichtschächte / Abdichtung etc.	15at	Mo, 15.02.27	Fr, 05.03.27
210.21	WDVS-Arbeiten / Kleben, Dübeln, Armierung, Fensterbretter, Leibungsdämmung, inkl. Sockelbearbeitung	15at	Mo, 08.03.27	Di, 30.03.27
210.22	Oberputz (strukturiert) / Farbbeschichtung etc.	15at	Mi, 31.03.27	Di, 20.04.27
210.23	Anarbeitung Außenanlagen	5at	Mi, 21.04.27	Di, 27.04.27
214	**026/027_Fenster- und Fenstertüren_BA1_HNr. 31-33** (Schnittstelle Los 023_WDVS inkl. Balkone)	55at	Mo, 31.08.26	Fr, 13.11.26
214.1	Aufmaß+Werkplanung	5at	Mo, 31.08.26	Fr, 04.09.26
214.2	Lieferzeit Fenster (ca. 3 Wochen)	15at	Mo, 07.09.26	Fr, 25.09.26
214.3	026_Fenster- und Außentüren / Schnittstelle Fassade WDVS_023a (Abstimmung von Zeitraum 3 Wochen bzw. 20 AT für Abriss/Neubau Fenster-/Fenstertüren)	30at	Mo, 28.09.26	Fr, 06.11.26
214.4	026_Fenster- und Außentüren / Schnittstelle Fassade WDVS_023b (Abstimmung von Zeitraum 3 Wochen bzw. 20 AT für Abriss/Neubau Fenster-/Fenstertüren)	34at	Di, 29.09.26	Fr, 13.11.26
215	**Los 031_Metallbauarbeiten-Geländerkonstruktion_BA1_HNr. 31-33** (Schnittstelle Los 023_WDVS inkl. Balkone)			
216	Vorbereitung der Montage Brüstungsplatten / Bolzen, Ankerplatten etc.	30at	Di, 20.10.26	Mo, 30.11.26
217	Montage Werbekästen EG (Schnittstelle 023b)	5at	Mi, 21.04.27	Di, 27.04.27
218	Montage Brüstungsplatten/Balkonerweiterung 10x 2,85m und 10x 5,90m / vorab Schwertermontage, Tropfbleche	2at	Mo, 14.12.26	Di, 15.12.26

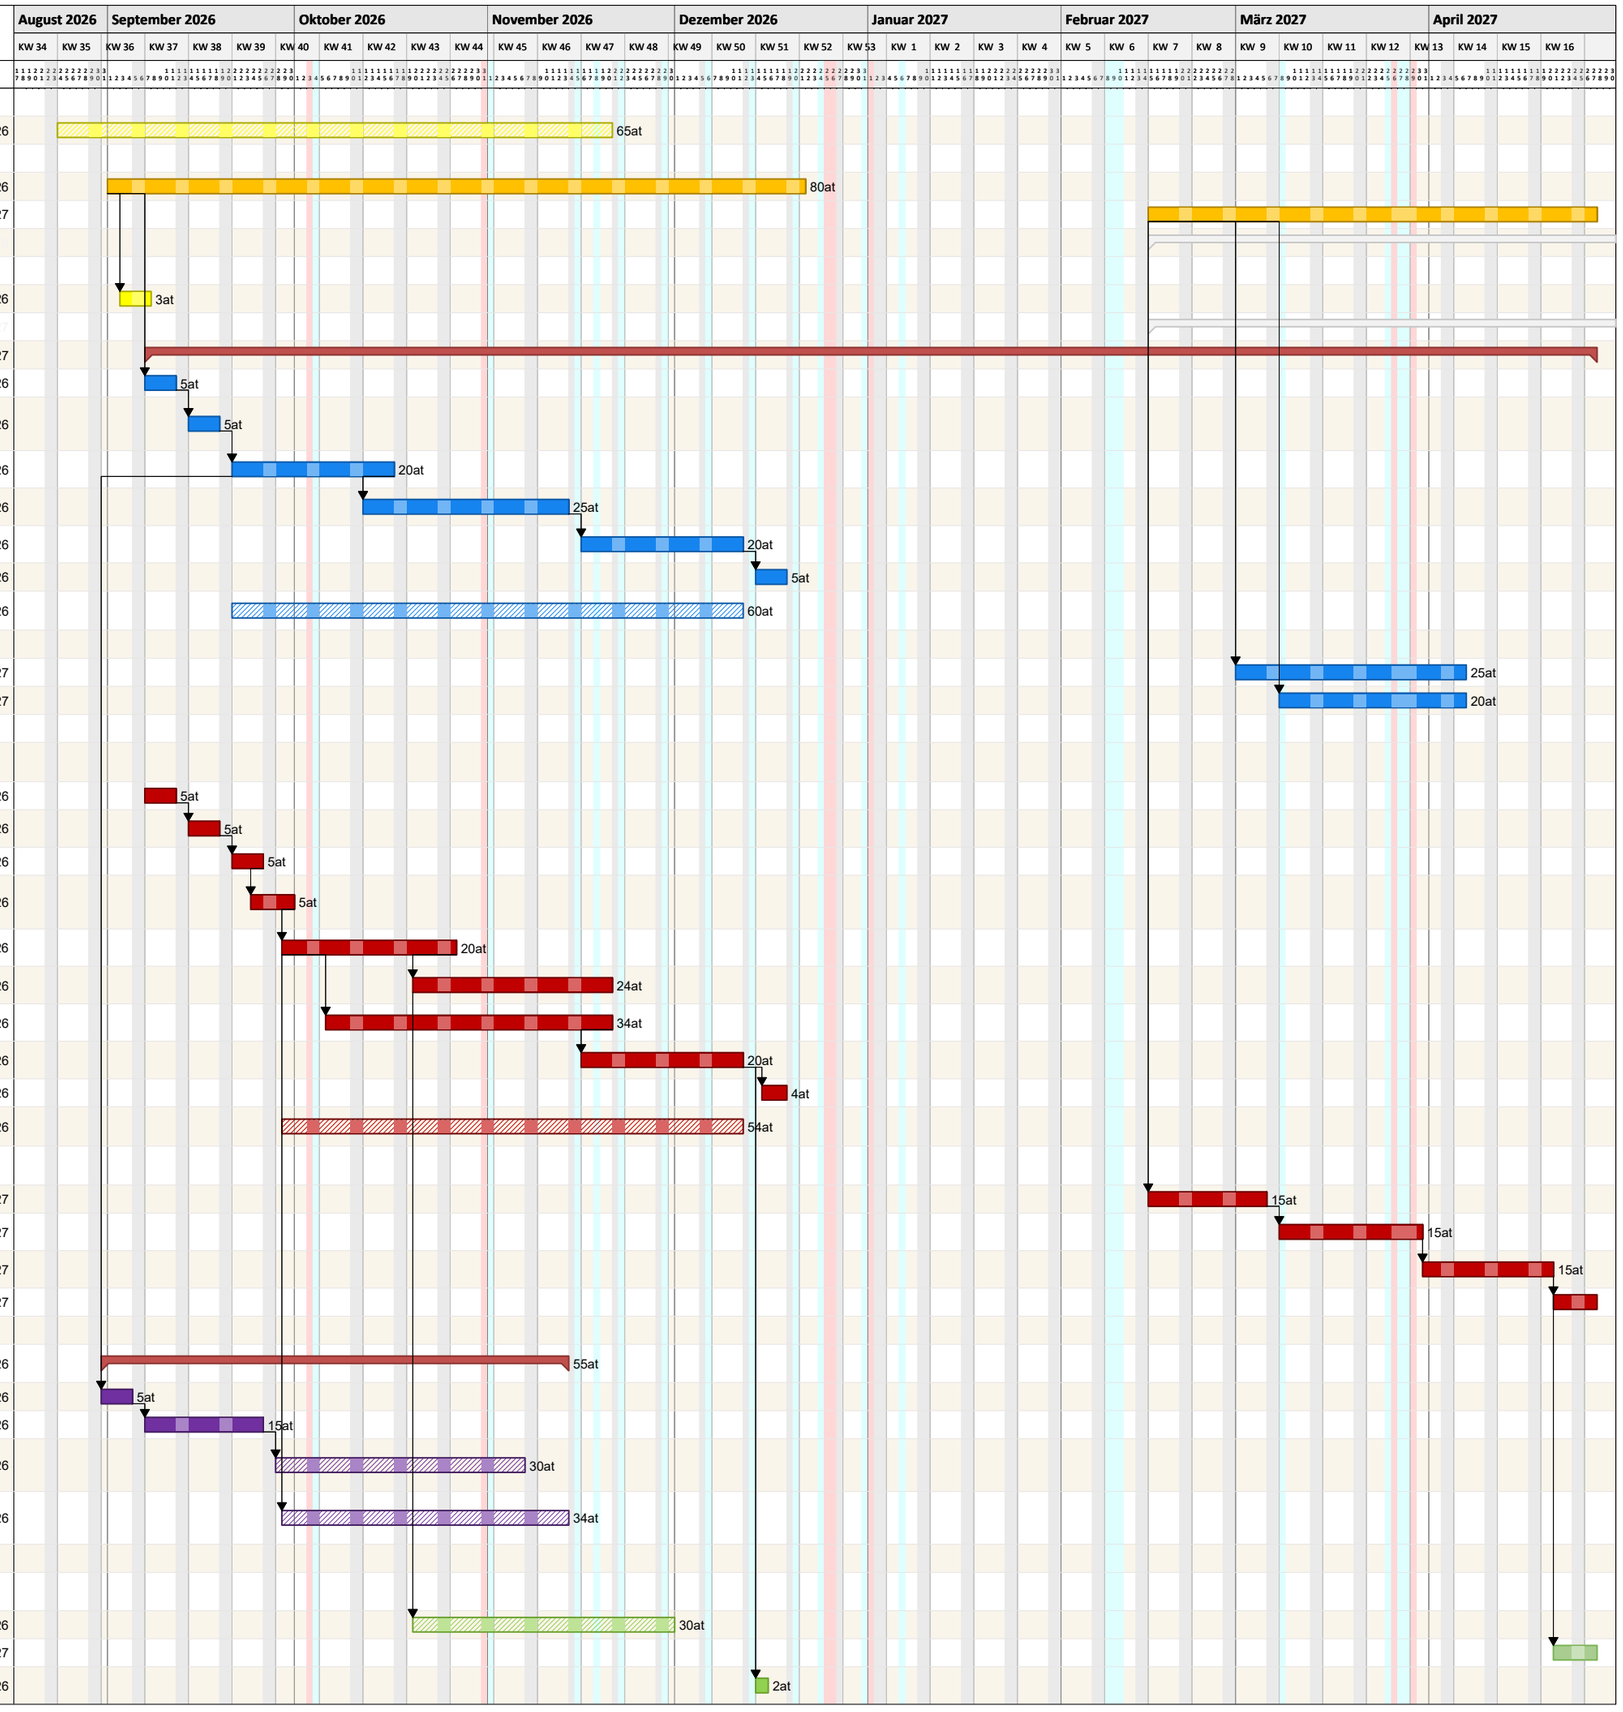

erstellt mit pro.Plan 2025 [pro.Plan 2025] Seriennr.: PP-25-2362098464 Lizenz für Kobel Architekten u. Ingenieure, Cottbus
