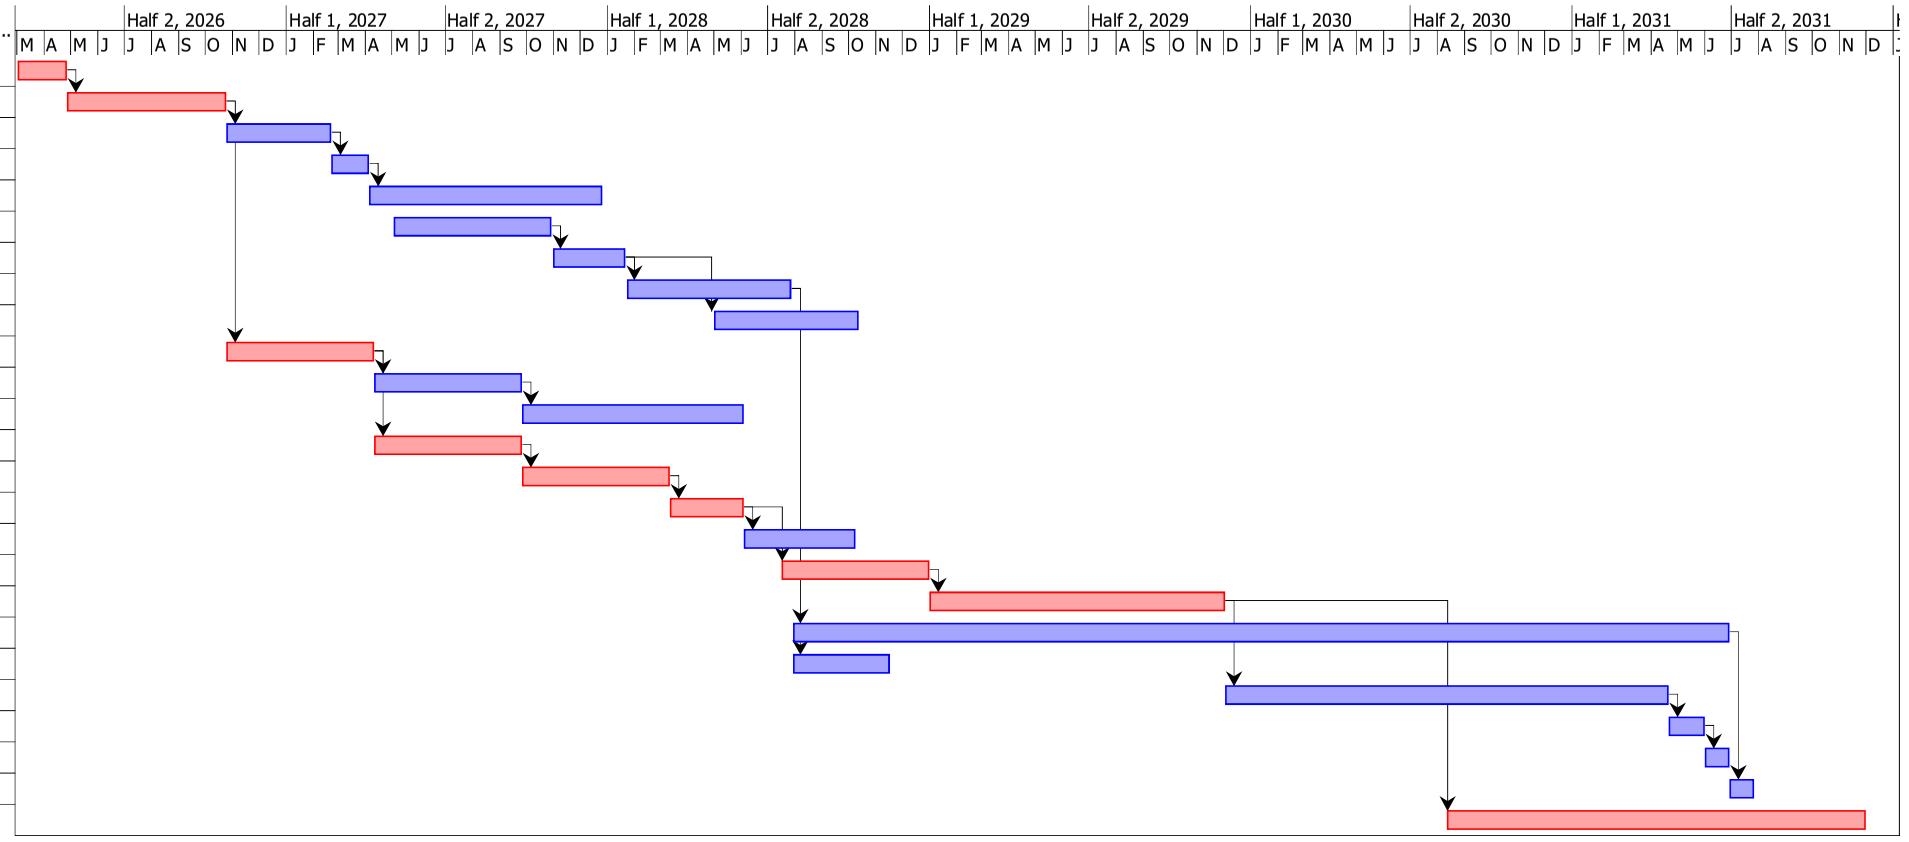		Name	Dauer	Start	Ende	Vorgän...	R...
1		Grundlagen, Vorbereitung	40 tage	02.03.26 09:00	27.04.26 09:00		
2		Ausschr. & Vergabe Planer LP 1-4	130 tage	27.04.26 09:00	26.10.26 09:00	1	
3		LP 1-3 Interim	85 tage	26.10.26 09:00	22.02.27 09:00	2	
4		LP 4 Interim	30 tage	22.02.27 09:00	05.04.27 09:00	3	
5		Bearbeitung Bauantrag (BOA)	190 tage	05.04.27 09:00	27.12.27 09:00	4	
6		LP 6-7 GU (Module / Container)	130 tage	03.05.27 08:00	29.10.27 17:00		
7		LP 5 GU (Module / Container)	60 tage	01.11.27 08:00	21.01.28 17:00	6	
8		LP 8 GU Gründung & Aufstellung Module / Container	135 tage	24.01.28 08:00	28.07.28 17:00	7	
9		LP 8 GU Außenanlagen	120 tage	29.04.28 08:00	13.10.28 17:00	7EA+...	
10		Ausschr. & Vergabe Planer Abbruch	120 tage	26.10.26 09:00	12.04.27 09:00	2	
11		LP 1-5 Abbruch	120 tage	12.04.27 09:00	27.09.27 09:00	10	
12		LP 6-7 Abbruch	180 tage	27.09.27 09:00	05.06.28 09:00	11	
13		Ausschr. & Vergabe Planer Neubau	120 tage	12.04.27 09:00	27.09.27 09:00	10	
14		LP 1-3 Neubau	120 tage	27.09.27 09:00	13.03.28 09:00	13	
15		LP 4 Neubau	60 tage	13.03.28 09:00	05.06.28 09:00	14	
16		Bearbeitung Bauantrag (BOA)	90 tage	05.06.28 09:00	09.10.28 09:00	15	
17		LP 5 Neubau	120 tage	17.07.28 09:00	01.01.29 09:00	15EA...	
18		LP 6-7 Neubau	240 tage	01.01.29 09:00	03.12.29 09:00	17	
19		Nutzungsdauer Interim	760,87...	31.07.28 08:00	30.06.31 16:00	8	
20		LP 8 Abbruch	80 tage	31.07.28 08:00	17.11.28 17:00	8	
21		LP 8 Neubau	360 tage	03.12.29 09:00	21.04.31 09:00	18	
22		Abnahmen & Möblierung	30 tage	21.04.31 09:00	02.06.31 09:00	21	
23		Umzug / Leerzug Interim	20 tage	02.06.31 09:00	30.06.31 09:00	22	
24		Rückbau Interim	20 tage	30.06.31 16:00	28.07.31 16:00	19	
25		LP 8 Außenanlagen	340 tage	12.08.30 09:00	01.12.31 09:00	18EA...
