Projektnummer: 664

664 Feuerwehrgerätehaus ZfP Schussenried / Stand 19.01.2026

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer
1	**Projektlaufzeit**				
2	**Gesamtlaufzeit LPH 3 - LPH 8**	539at	Di, 14.01.25	Di, 30.03.27	
3	**Lph 3 Überarbeitung Entwurf mit Kostenberechnung**	62at	Mo, 10.02.25	Fr, 09.05.25	
4	LPH 3 Kostenreduzierung, Kostenberechnung	25at	Do, 05.06.25	Fr, 11.07.25	
5	Freigabe LPH 3	1at	Mo, 28.07.25	Mo, 28.07.25	
6	**LPH 5 Werkplanung**	124at	Mi, 30.04.25	Mo, 27.10.25	
7	**LPH 6 Ausschreibung**	35at	Mo, 28.07.25	Fr, 12.09.25	Laufzeit Behörde
7.1	**Ausschreibungspaket HLS, E, Rohbau und Abbruch, Gerüst**	35at	Mo, 28.07.25	Fr, 12.09.25	
8	**LPH 6 Laufzeit des ersten Ausschreibungsblock**	14at	Mo, 15.09.25	Do, 02.10.25	
9	**LPH 7 Prüfen erster Ausschreibungsblock**	5at	Mo, 06.10.25	Fr, 10.10.25	
10	**LPH 8 Bauphase / ~ 14 Monate**	307at	Mo, 24.11.25	Fr, 05.03.27	
10.1	Baubeginn	1at	Mo, 24.11.25	Mo, 24.11.25	
11	**Abbruch / Rohbau**	165at	Mo, 01.12.25	Fr, 31.07.26	
11.1	Abbruch- und Umbaumaßnahmen; Fluchtwegstreppe, Hydrant;	10at	Mo, 01.12.25	Fr, 12.12.25	
11.2	AUSFALLTAGE WITTERUNGSBEDINGT	18at	Mi, 07.01.26	Fr, 30.01.26	
11.3	Aushub, Grundleitungen, Fundamente	49at	Mo, 15.12.25	Mi, 25.02.26	
11.4	Bodenplatte	8at	Do, 26.02.26	Mo, 09.03.26	
11.5	Lieferzeit Thermohohlwände	49at	Mo, 26.01.26	Do, 02.04.26	
11.6	Innenwände EG MW/STB	10at	Di, 10.03.26	Mo, 23.03.26	
11.7	Stellen der Thermowände	9at	Di, 07.04.26	Fr, 17.04.26	
11.8	Decke über EG aus Fertigteilen	13at	Mo, 20.04.26	Do, 07.05.26	
11.9	Wände OG	10at	Fr, 08.05.26	Fr, 22.05.26	
11.10	Decke über OG	11at	Di, 26.05.26	Mi, 10.06.26	
11.11	Wände DG	10at	Do, 11.06.26	Mi, 24.06.26	
11.12	Decke über DG + Attika	17at	Do, 25.06.26	Fr, 17.07.26	
11.13	Trockungszeit Decke 28 Tage	19at	Di, 07.07.26	Fr, 31.07.26	
12	**Fensterarbeiten**	48at	Fr, 22.05.26	Do, 30.07.26	
12.1	Vorlauf Fenster (Bestellung, Lieferung)	32at	Fr, 22.05.26	Mi, 08.07.26	
12.2	Einbau Fenster	8at	Di, 21.07.26	Do, 30.07.26	
13	**Abdichtungsarbeiten**	15at	Mo, 24.08.26	Fr, 11.09.26	
13.1	Abdichtung Flachdach 1. Lage	5at	Mo, 24.08.26	Fr, 28.08.26	
13.2	Dämmung + Abdichtung	10at	Mo, 31.08.26	Fr, 11.09.26	
14	Dachbegrünung + Kies				
15	**Trockenbau**	80at	Mo, 24.08.26	Fr, 11.12.26	
15.1	Wände / VSS EG	15at	Mo, 24.08.26	Fr, 11.09.26	
15.2	Wände / VSS OG	17at	Do, 27.08.26	Fr, 18.09.26	
15.3	Wände / VVS DG	17at	Do, 03.09.26	Fr, 25.09.26	
15.4	UK abgehängte Decke EG	5at	Mo, 02.11.26	Fr, 06.11.26	
15.5	UK abgehängte Decke OG-DG	15at	Mo, 09.11.26	Fr, 27.11.26	
15.6	Abgehängte Decke schließen EG-DG	10at	Mo, 30.11.26	Fr, 11.12.26	
16	**Estricharbeiten**	20at	Mo, 28.09.26	Fr, 23.10.26	
16.1	Dämmung + Tackerplatte EG - DG	6at	Mo, 28.09.26	Mo, 05.10.26	
16.2	Einbau Estrich EG - DG	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26	
17	Trocknungszeit + Aufheizprotokoll	35at	Mo, 26.10.26	Fr, 11.12.26	
18	**Gipser**	45at	Mo, 27.07.26	Fr, 16.10.26	
18.1	Innenputz an Außenwände	10at	Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26	
18.2	Grundputz Außen	5at	Mo, 27.07.26	Fr, 31.07.26	
18.3	Gewebespachtelung Außen	10at	Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26	
18.4	Außenputz	20at	Mo, 14.09.26	Fr, 09.10.26	
18.5	Anstrich Außenputz	5at	Mo, 12.10.26	Fr, 16.10.26	
19	**Sonnenschutz**	45at	Fr, 29.05.26	Fr, 31.07.26	
19.1	Lieferzeit	35at	Fr, 29.05.26	Fr, 17.07.26	
19.2	Einbau	10at	Mo, 20.07.26	Fr, 31.07.26	
20	**Bodenbelag**	20at	Mi, 25.11.26	Di, 22.12.26	
20.1	Kautschuk	15at	Mi, 25.11.26	Di, 15.12.26	
20.2	Nadelfilz	15at	Mi, 02.12.26	Di, 22.12.26	
21	**Fliesenarbeiten**	15at	Mo, 14.12.26	Di, 05.01.27	
21.1	Abdichtung	5at	Mo, 14.12.26	Fr, 18.12.26	
21.2	Wand- und Bodenfliesen	10at	Mo, 21.12.26	Di, 05.01.27	
22	**Malerarbeiten**	35at	Mo, 11.01.27	Fr, 26.02.27	
22.1	Malervlies an Wände	15at	Mo, 11.01.27	Fr, 29.01.27	
22.2	Kautschuk an Wände	5at	Mo, 25.01.27	Fr, 29.01.27	
22.3	Malerarbeiten	15at	Mo, 01.02.27	Fr, 19.02.27	
22.4	Restarbeiten	5at	Mo, 22.02.27	Fr, 26.02.27	
23	**Innentüren**	37at	Mo, 21.12.26	Fr, 12.02.27	
23.1	Lieferzeit	27at	Mo, 21.12.26	Fr, 29.01.27	
23.2	Einbau	10at	Mo, 01.02.27	Fr, 12.02.27	
24	**Gerüst**	121at	Mo, 13.04.26	Fr, 23.10.26	
24.1	Aufbau	44at	Mo, 13.04.26	Mi, 17.06.26	
24.2	Standzeit	115at	Mi, 15.04.26	Mo, 19.10.26	
24.3	Abbau	4at	Di, 20.10.26	Fr, 23.10.26	
25	**Elektro**	241at	Mo, 23.02.26	Fr, 26.02.27	
25.1	Blitzschutz	10at	Mo, 23.02.26	Fr, 06.03.26	
25.2	Einlegearbeiten Betonwände	69at	Mo, 09.03.26	Fr, 19.06.26	
26	Rohinsttallation				
25.3	Installationen Trockenbauwände	17at	Mo, 31.08.26	Di, 22.09.26	
25.4	Installationen Decke EG-DG	20at	Mo, 21.09.26	Fr, 16.10.26	
25.5	Fertiginstallation Elektro	15at	Mo, 08.02.27	Fr, 26.02.27	
27	**HLS**	154at	Do, 25.06.26	Fr, 19.02.27	
27.1	Rohinstallation	17at	Do, 25.06.26	Fr, 17.07.26	
27.2	Installationen Trockenbauwände	17at	Mo, 31.08.26	Di, 22.09.26	
27.3	Installatione Decke EG - DG	20at	Mo, 09.11.26	Fr, 04.12.26	
27.4	Einbau Fußbodenheizung EG - DG	10at	Mo, 05.10.26	Fr, 16.10.26	
27.5	Fertiginstallation HLS	15at	Mo, 01.02.27	Fr, 19.02.27	
28	**Außenanlagen**	20at	Mo, 05.10.26	Fr, 30.10.26	
28.1	Taufstreifen, Asphalt anarbeiten	20at	Mo, 05.10.26	Fr, 30.10.26	
29	**Einbau Küchen**	5at	Mo, 01.03.27	Fr, 05.03.27	
10.2	**Fertigstellung Bauvorhaben / Einzug März 2025**	1at	Fr, 05.03.27	Fr, 05.03.27	

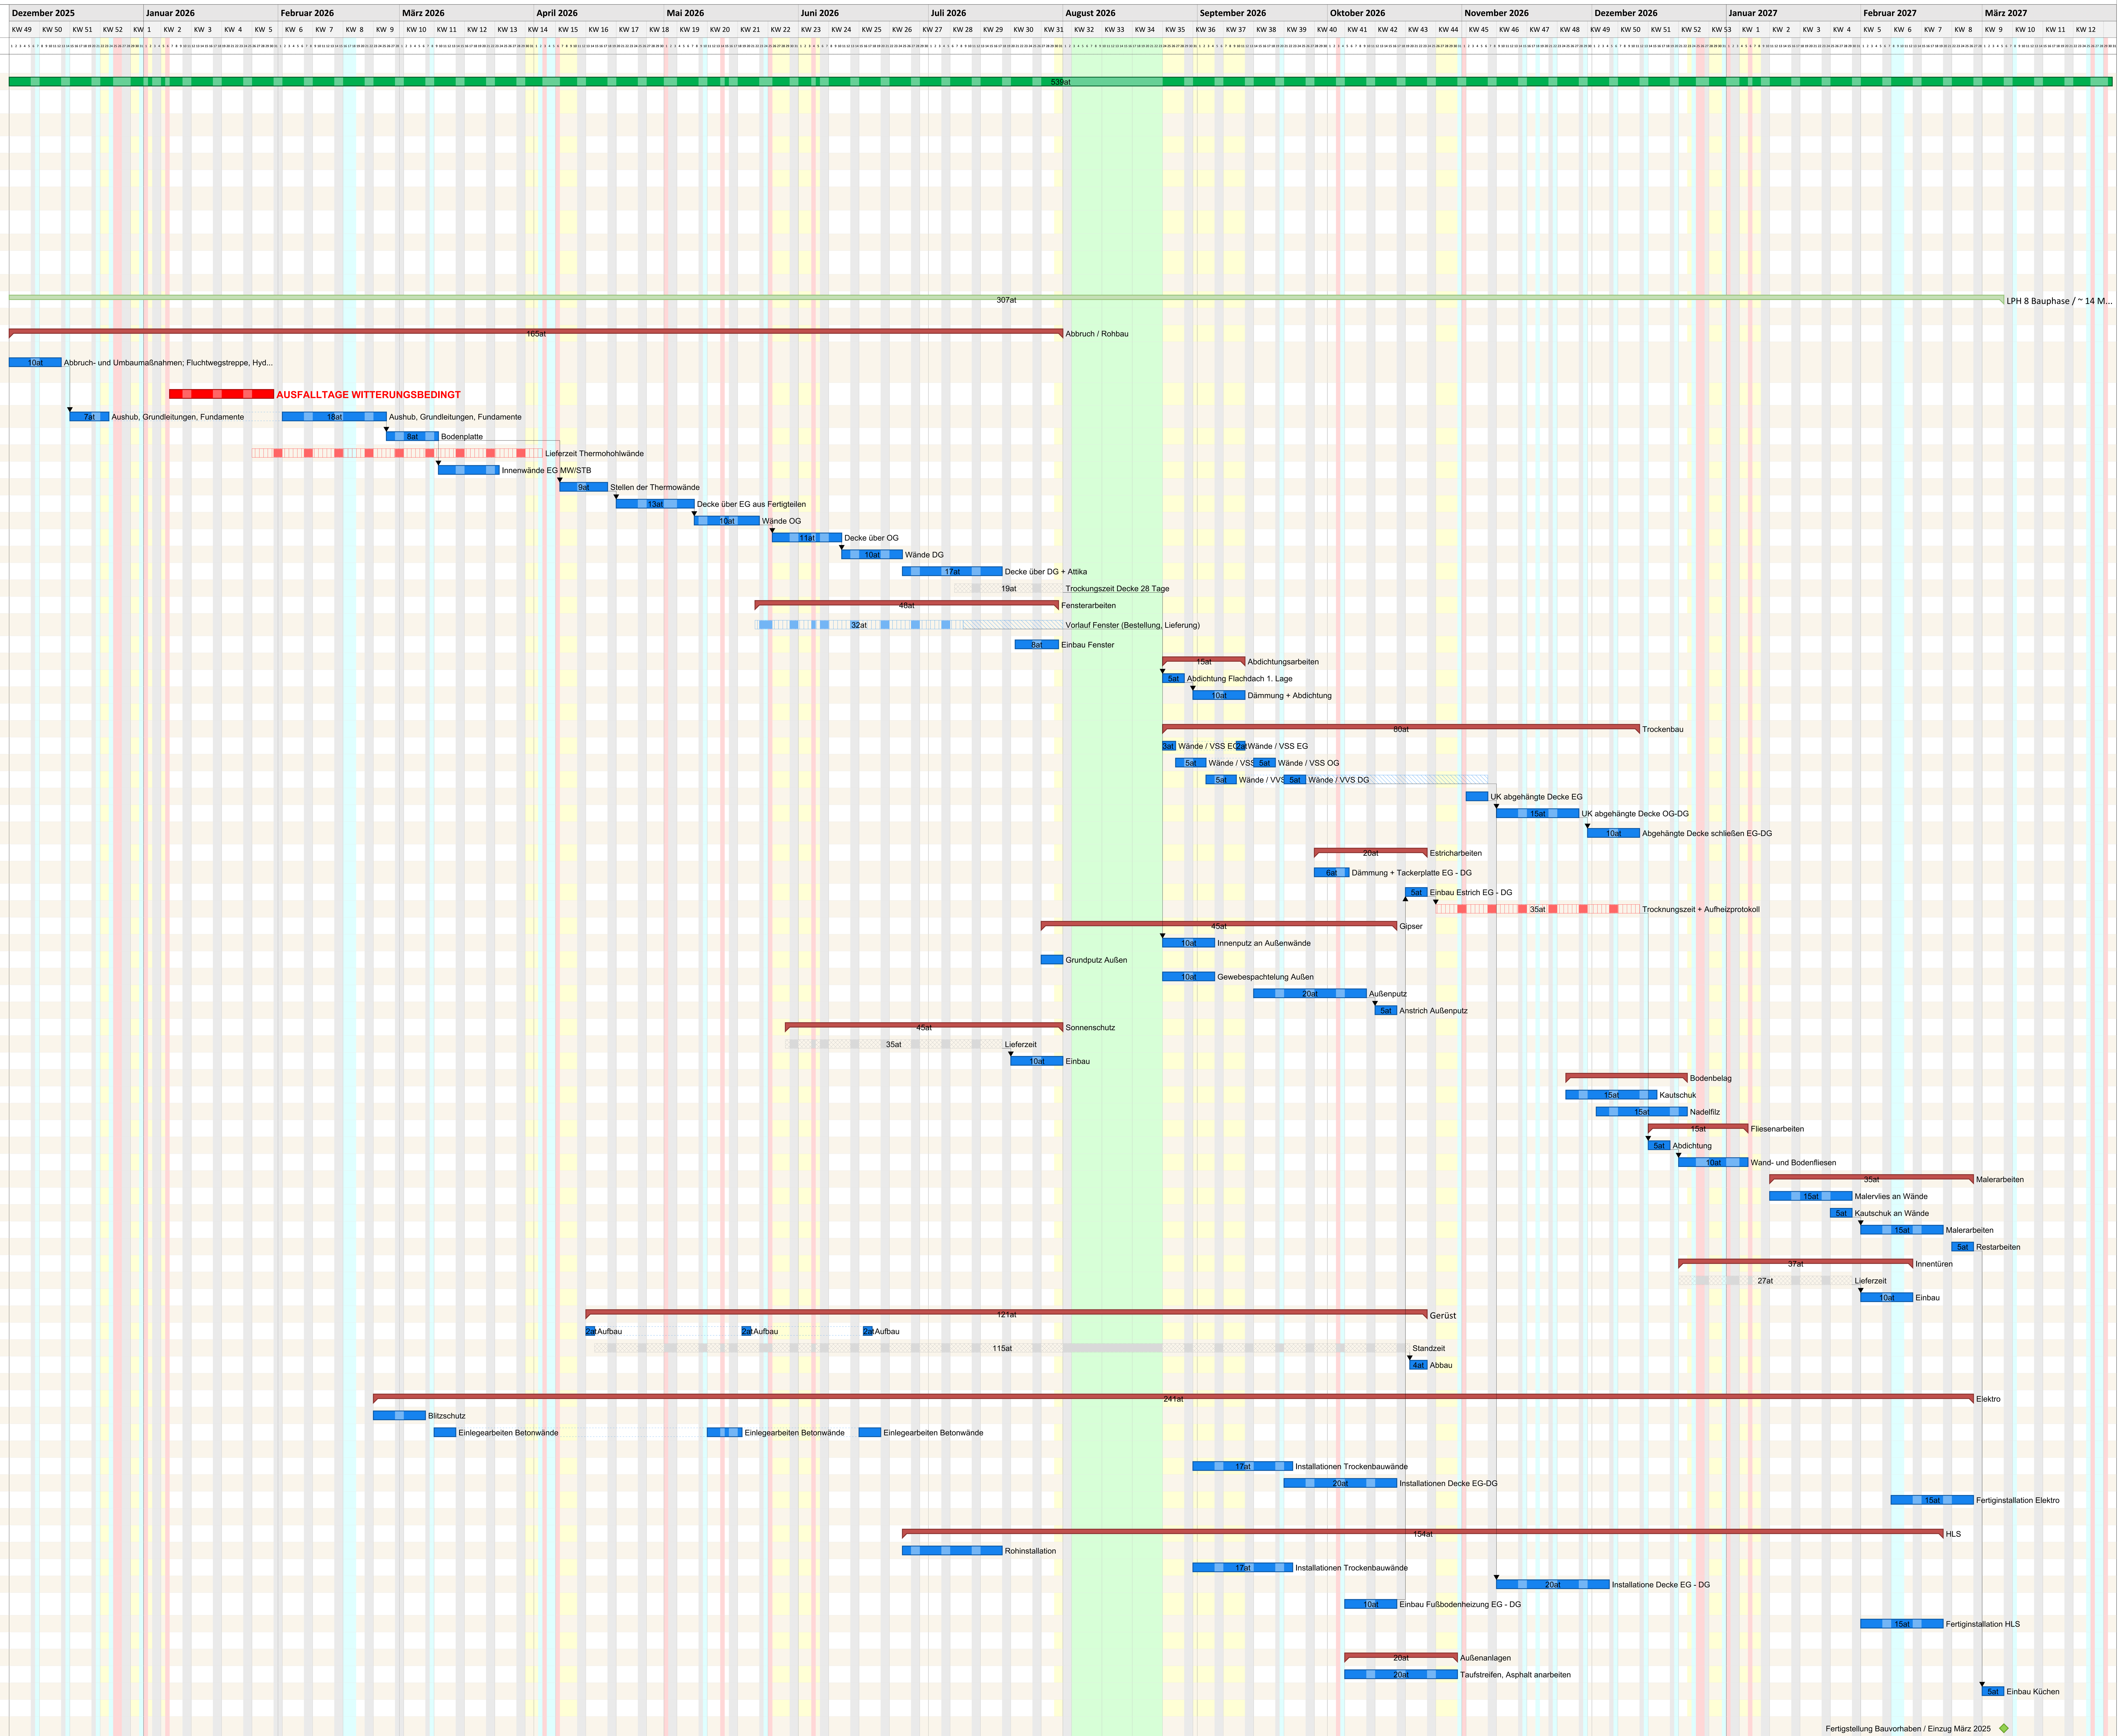

Projektzeitrahmen von Mi, 01.01.25 bis Mi, 31.03.27
Kalender: BW mit Handwerkerferien
Druckdatum: 23.01.2026 12:13
Filter:
Bearbeiter: winterkorn

Feiertag
Infotag
Urlaub
Schulferien

erstellt mit pro-Plan 2025 (pro-Plan 2025) Serien Nr.: PPL25-24AA61253D94 Lizenz für mlw architekten morent lutz winterkorn PartG mbB,

mlw architekten
morent | lutz | winterkorn
mlw architekten gbr
Gartenstr. 14
Ravensburg
Tel. +49 751 3555990
Fax +49 751 35559999
e-Mail: mlw@architekturravensburg.de
