POS. 1 KANALABDECKPLATTE/FERTIGTEIL (16 x) B300

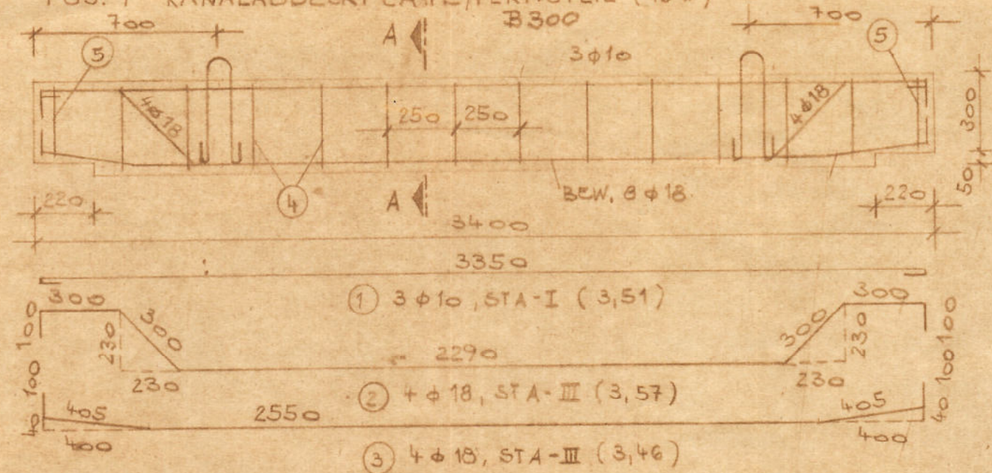

① 3ϕ10, STA-I (3,51)

② 4ϕ18, STA-III (3,57)

③ 4ϕ18, STA-III (3,46)

SCHNITT A-A

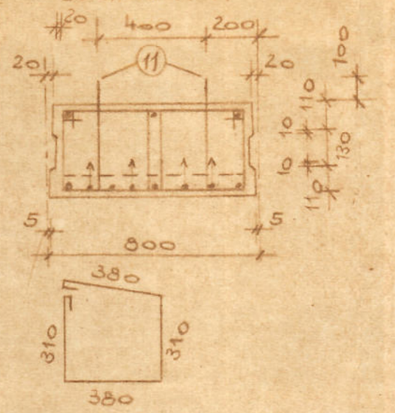

④ 24ϕ10, STA-I (1,48)



⑤ 2ϕ10, STA-I (1,96)

POS. 3 RANDBALKEN (2 x) B225

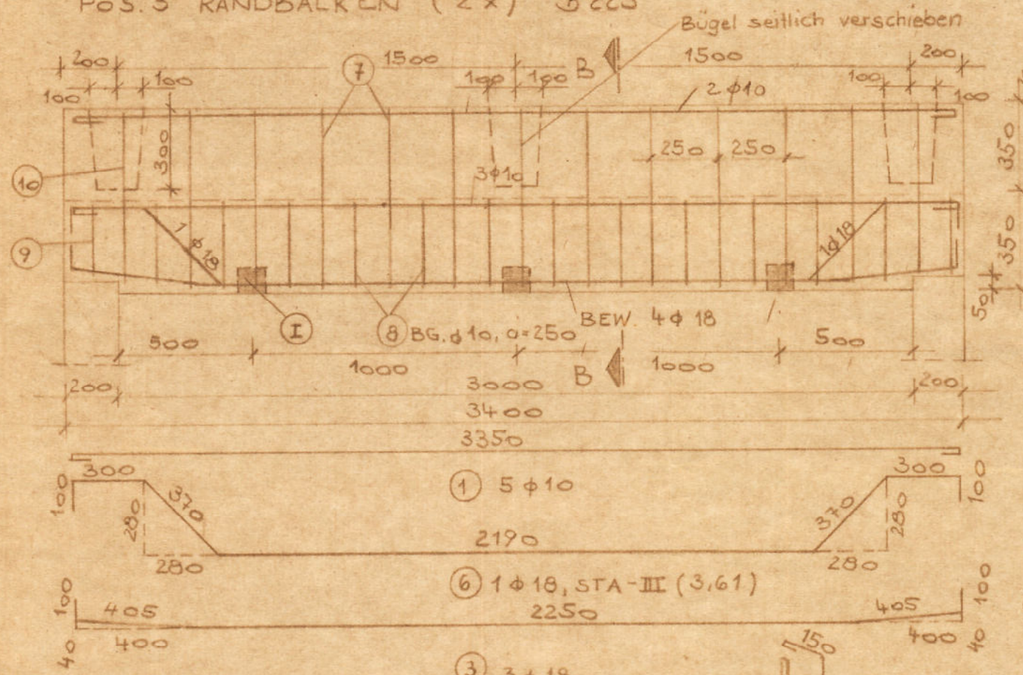

① 5ϕ10

⑥ 1ϕ18, STA-III (3,61)

③ 3ϕ18

SCHNITT B-B

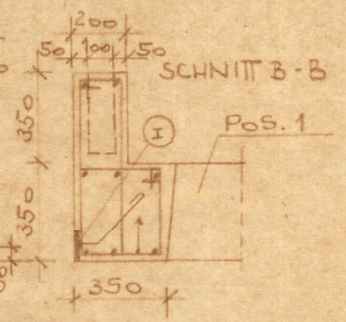





6 BLECHE 100/100/8
12 ANKER ϕ10, L= 0,41 m

⑦ 11ϕ10, STA-I (1,70)



⑨ 2ϕ10 (1,20)



⑩ 2ϕ10 (1,60)



⑧ 11ϕ10 (1,30)

POS.	NR.	STCK	ϕ	LÄNGE	STA-I ϕ 10	STA-III ϕ 18	STA-I ϕ 14
1 (16x)	1	3	10	3,51	10,53		
	2	4	18	3,57		14,28	
	3	4	18	3,46		13,84	
	4	24	10	1,48	35,52		
	5	2	10	1,96	3,92		
	11	4	14	1,10			4,40
				m	49,97	28,12	4,40
				kg	30,83	56,24	5,33
				kg (16x)	493,28	899,84	85,28
3 (2x)	6	1	18	3,61		3,61	
	3	3	18	3,46		10,38	
	7	11	10	1,70	18,70		
	8	11	10	1,30	14,30		
	9	2	10	1,20	2,40		
	10	2	10	1,60	3,20		
	1	5	10	3,51	17,55		
			m		38,60	13,99	
			kg (1 x)		23,81	27,98	
			kg (2 x)		57,62	55,96	

Maßgebend für die
Herstellung: TGL 0-1045, 0-4225
Betongüte B 225, B 300
Betonstahl STA-I, STA-III
Zementart PZ TGL 927
Kornfrennung gem. TGL 0-1045, § 8,1
Mindestzementgehalt gem. TGL 0-1045, § 8,2

Verschweißung:
Schweißverfahren: E (CO2) SG
Zusatzwerkstoff: Ti VIII si 1o Mn si G
Nahtart: ▷4
Ausführung TGL 1176 IIB
9.11.73
Datum Schweißfachmann

Montagegewicht für Pos. 1 G ≅ 2380 kp

GEPRÜFT
STATIK:
ENTWURF:
Prüfingenieur
Prüfingenieur
Rat des Bezirkes Rostock
Bezirksbauamt
STATISCHE BAUAUFSICHT
— Prüfgruppe 1 Rostock —
Rostock, den 1.Q. UEZ 1973
Prüfungsnr. 497/73

WOHNUNGSBAUKOMBINAT ROSTOCK

ABTEILUNG 0511	GRUPPE STATIK		AUFTRAGSNR. 2500/00-06.8/51
INVEST. VORHABEN	ROSTOCK EVERSHAGEN		Br. 139
TEILVORHABEN	ZUSATZBEBAUUNG		
OBJEKT (BAUTEIL)	ABSENKUNG DER FERNHEIZLEITUNG, BAUTEIL		
ZEICHNER Rodemacher	DATUM 30.10.73	BEARBEITER	DATUM 30.10.73	ABT. LTR.
MASSE GEPR.	DATUM 19.11.73	GRUPPENL.	DATUM	MASSTAB 1:20, 1:10
BLATTBEZEICHNUNG	POS. 1 U. POS. 3			ZEICH. NR. 6

0,15 m²
