Nr.	Vorgangsm	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1						
2		**LP 5**	**20 Tage**	**Mon 23.02.26**	**Fre 20.03.26**	
3		Fortschriebung Planung nach Genehmigung KC	20 Tage	Mon 23.02.26	Fre 20.03.26	
4						
5		**LP 6**	**20 Tage**	**Mon 16.03.26**	**Fre 17.04.26**	
6		LV Erstellung	20 Tage	Mon 16.03.26	Fre 17.04.26	3EE+15 Tage
7						
8		**LP 7**	**30 Tage**	**Mon 01.06.26**	**Fre 10.07.26**	
9		Auswertungen	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26	6EA+30 Tage
10		Beauftragungen	20 Tage	Mon 15.06.26	Fre 10.07.26	9
11						
12		**LP 8 Baudurchführung BA**	**390 Tage?**	**Mon 29.06.26**	**Fre 28.01.28**	
13		**BA 1.1: 14-17 West**	**115 Tage?**	**Mon 29.06.26**	**Fre 04.12.26**	
14		**BE**	**93 Tage?**	**Mon 20.07.26**	**Mit 25.11.26**	
15		Aufbau Bauzaun	3 Tage	Mon 20.07.26	Mit 22.07.26	19AA+5 Tage
16		Containerstellung	1 Tag?	Mon 27.07.26	Mon 27.07.26	23AA
17		Abbau Bauzaun	3 Tage	Mon 23.11.26	Mit 25.11.26	21
18		**Gerüst**	**95 Tage?**	**Mon 13.07.26**	**Fre 20.11.26**	
19		Aufbau	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26	10
20		Vorhaltung	81 Tage?	Mon 27.07.26	Mon 16.11.26	19
21		Demontage	5 Tage	Mon 16.11.26	Fre 20.11.26	39
22		**Fassadenarbeiten**	**75 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Fre 06.11.26**	
23		Vorarbeiten	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26	19
24		Fensterbänke	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	23;10EA+20 Tage
25		Dämmung	30 Tage	Mon 17.08.26	Fre 25.09.26	23
26		Putz	25 Tage	Mon 14.09.26	Fre 16.10.26	25AA+20 Tage
27		Anstrich	25 Tage	Mon 05.10.26	Fre 06.11.26	26AA+15 Tage
28		**Metall- und Fenster**	**100 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 20.11.26**	
29		Demontagen Anbauten	5 Tage	Mon 06.07.26	Mon 13.07.26	19AE
30		Abdichtung Bestandsfenster	15 Tage	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26	25AE+5 Tage
31		neue Anschlüsse	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26	26
32		Vordächer Aufbau	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	27
33		**Malerarbeiten**	**50 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 06.11.26**	
34		Überholungsanst Bestandsfenster	25 Tage	Mon 31.08.26	Fre 02.10.26	25EE+5 Tage
35		Maler innen	15 Tage	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26	27EE
36		**Dacharbeiten**	**70 Tage**	**Mon 10.08.26**	**Fre 13.11.26**	
37		Aufnehmen Dach	5 Tage	Mon 10.08.26	Mon 17.08.26	38AE
38		neuer Dachrandanschlu	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	25AA
39		Dachklempner	15 Tage	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26	27EE+5 Tage
40		**Außenanlagen**	**115 Tage**	**Mon 29.06.26**	**Fre 04.12.26**	
41		Baufreiheit Gerüstaufbau	10 Tage	Mon 29.06.26	Mon 13.07.26	19AE
42		Traufstreifen herstellen	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26	21
43						
44		**BA 1.2: 14-17 Ost**	**115 Tage?**	**Mon 18.01.27**	**Fre 02.07.27**	
45		**BE**	**93 Tage?**	**Mon 08.02.27**	**Mit 23.06.27**	
46		Aufbau Bauzaun	3 Tage	Mon 08.02.27	Mit 10.02.27	50AA+5 Tage
47		Containerstellung	1 Tag?	Mon 15.02.27	Mon 15.02.27	54AA
48		Abbau Bauzaun	3 Tage	Mon 21.06.27	Mit 23.06.27	52
49		**Gerüst**	**95 Tage?**	**Mon 01.02.27**	**Fre 18.06.27**	
50		Aufbau	10 Tage	Mon 01.02.27	Fre 12.02.27	
51		Vorhaltung	81 Tage?	Mon 15.02.27	Mon 14.06.27	50
52		Demontage	5 Tage	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	70
53		**Fassadenarbeiten**	**75 Tage**	**Mon 15.02.27**	**Fre 04.06.27**	
54		Vorarbeiten	15 Tage	Mon 15.02.27	Fre 05.03.27	50
55		Fensterbänke	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27	54;10EA+20 Tage
56		Dämmung	30 Tage	Mon 08.03.27	Fre 23.04.27	54
57		Putz	25 Tage	Mon 12.04.27	Fre 14.05.27	56AA+20 Tage
58		Anstrich	25 Tage	Mon 03.05.27	Fre 04.06.27	57AA+15 Tage
59		**Metall- und Fenster**	**100 Tage**	**Mon 25.01.27**	**Fre 18.06.27**	
60		Demontagen Anbauten	5 Tage	Mon 25.01.27	Mon 01.02.27	50AE
61		Abdichtung Bestandsfenster	15 Tage	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27	56AE+5 Tage
62		neue Anschlüsse	10 Tage	Mon 17.05.27	Fre 28.05.27	57
63		Vordächer Aufbau	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	58
64		**Malerarbeiten**	**50 Tage**	**Mon 22.03.27**	**Fre 04.06.27**	
65		Überholungsanst Bestandsfenster	25 Tage	Mon 22.03.27	Fre 30.04.27	56EE+5 Tage
66		Maler innen	15 Tage	Mon 17.05.27	Fre 04.06.27	58EE
67		**Dacharbeiten**	**70 Tage**	**Mon 01.03.27**	**Fre 11.06.27**	
68		Aufnehmen Dach	5 Tage	Mon 01.03.27	Mon 08.03.27	69AE
69		neuer Dachrandanschlu	10 Tage	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27	56AA
70		Dachklempner	15 Tage	Mon 24.05.27	Fre 11.06.27	58EE+5 Tage

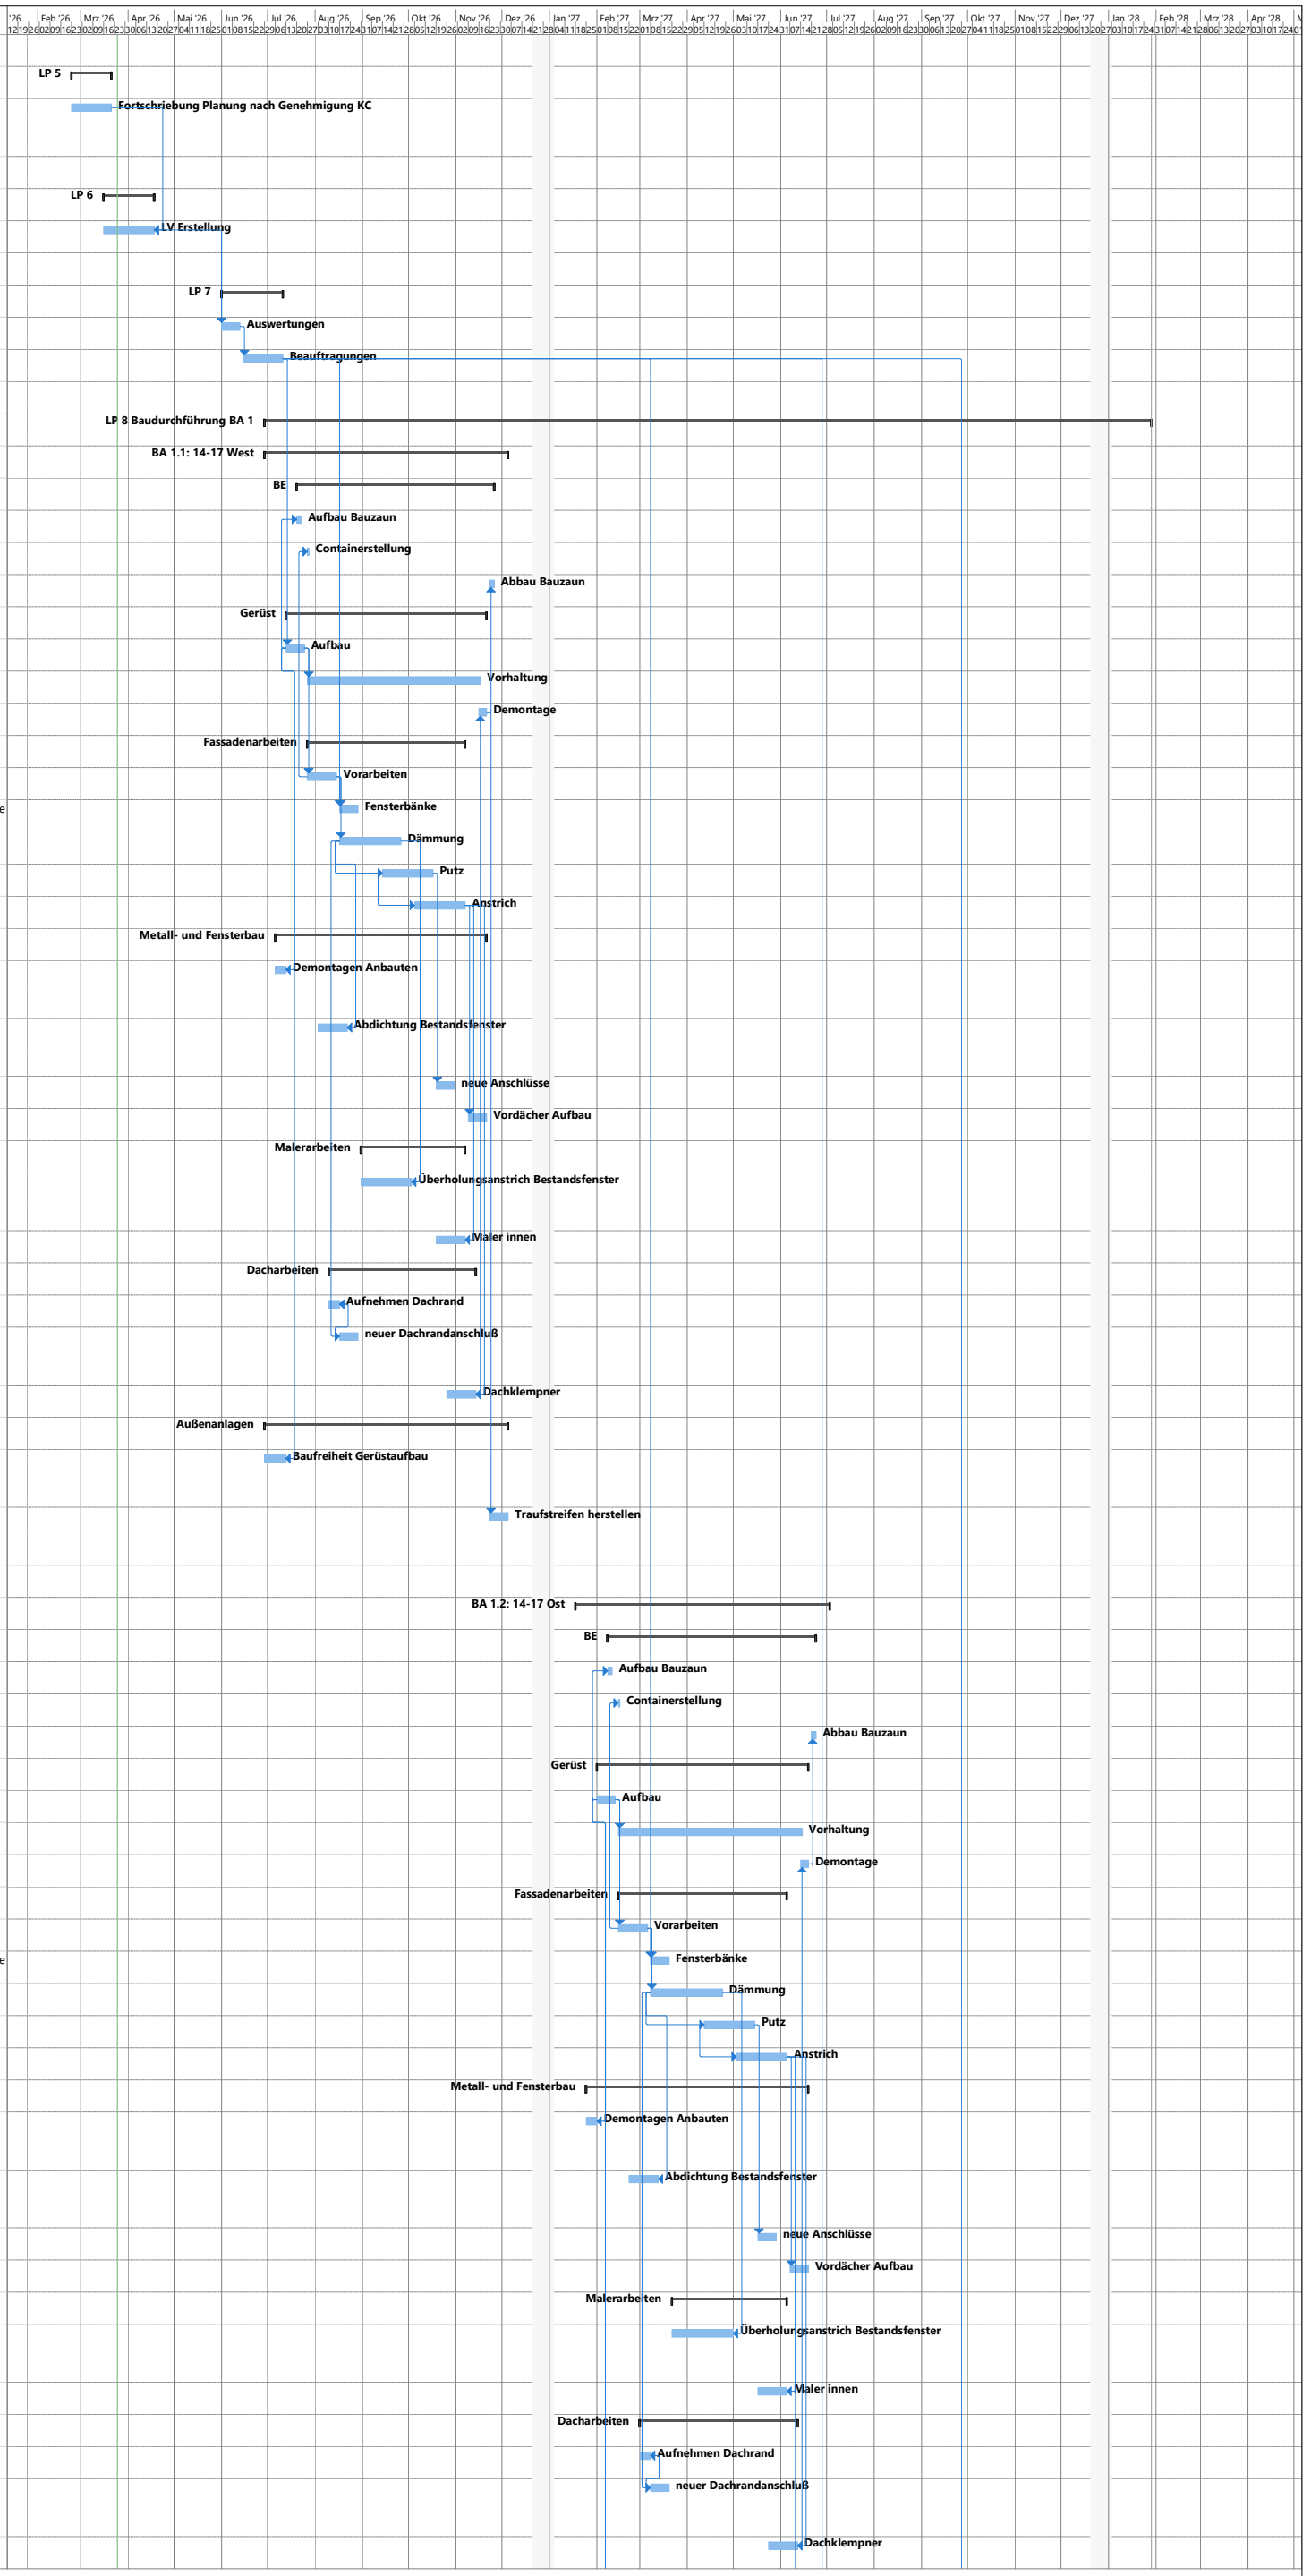

Projekt: 260325-Bauzeitenplan
Datum: Mit 25.03.26

Vorgang · Unterbrechung · Meilenstein · Sammelvorgang · Projektsammelvorgang · Inaktiver Vorgang · Inaktiver Meilenstein · Inaktiver Sammelvorgang · Manueller Vorgang · Nur Dauer · Manueller Sammelrollup · Manueller Sammelvorgang · Nur Anfang · Nur Ende · Externe Vorgänge · Externer Meilenstein · Stichtag · In Arbeit · Manueller Fortschritt

Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
71		**Außenanlagen**	**115 Tage**	**Mon 18.01.27**	**Fre 02.07.27**	
72		Baufreiheit Gerüstaufbau	10 Tage	Mon 18.01.27	Mon 01.02.27	50AE
73		Traufstreifen herstellen	10 Tage	Mon 21.06.27	Fre 02.07.27	52
74						
75						
76		**BA 2.1: 10-13 Ost, 7-11 Süd**	**115 Tage?**	**Mon 10.05.27**	**Fre 15.10.27**	
77		**BE**	**93 Tage?**	**Mon 31.05.27**	**Mit 06.10.27**	
78		Aufbau Bauzaun	3 Tage	Mon 31.05.27	Mit 02.06.27	82AA+5 Tage
79		Containerstellung	1 Tag?	Mon 07.06.27	Mon 07.06.27	86AA
80		Abbau Bauzaun	3 Tage	Mon 04.10.27	Mit 06.10.27	84
81		**Gerüst**	**95 Tage?**	**Mon 24.05.27**	**Fre 01.10.27**	
82		Aufbau	10 Tage	Mon 24.05.27	Fre 04.06.27	58EE
83		Vorhaltung	81 Tage?	Mon 07.06.27	Mon 27.09.27	82
84		Demontage	5 Tage	Mon 27.09.27	Fre 01.10.27	102
85		**Fassadenarbeiten**	**75 Tage**	**Mon 07.06.27**	**Fre 17.09.27**	
86		Vorarbeiten	15 Tage	Mon 07.06.27	Fre 25.06.27	82
87		Fensterbänke	10 Tage	Mon 28.06.27	Fre 09.07.27	86;10EA+20 Tage
88		Dämmung	30 Tage	Mon 28.06.27	Fre 06.08.27	86
89		Putz	25 Tage	Mon 26.07.27	Fre 27.08.27	88AA+20 Tage
90		Anstrich	25 Tage	Mon 16.08.27	Fre 17.09.27	89AA+15 Tage
91		**Metall- und Fenster**	**100 Tage**	**Mon 17.05.27**	**Fre 01.10.27**	
92		Demontagen Anbauten	5 Tage	Mon 17.05.27	Mon 24.05.27	82AE
93		Abdichtung Bestandsfenster	15 Tage	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27	88AE+5 Tage
94		neue Anschlüsse	10 Tage	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27	89
95		Vordächer Aufbau	10 Tage	Mon 20.09.27	Fre 01.10.27	90
96		**Malerarbeiten**	**50 Tage**	**Mon 12.07.27**	**Fre 17.09.27**	
97		Überholungsanst Bestandsfenster	25 Tage	Mon 12.07.27	Fre 13.08.27	88EE+5 Tage
98		Maler innen	15 Tage	Mon 30.08.27	Fre 17.09.27	90EE
99		**Dacharbeiten**	**70 Tage**	**Mon 21.06.27**	**Fre 24.09.27**	
100		Aufnehmen Dach	5 Tage	Mon 21.06.27	Mon 28.06.27	101AE
101		neuer Dachrandanschlu	10 Tage	Mon 28.06.27	Fre 09.07.27	88AA
102		Dachklempner	15 Tage	Mon 06.09.27	Fre 24.09.27	90EE+5 Tage
103		**Außenanlagen**	**115 Tage**	**Mon 10.05.27**	**Fre 15.10.27**	
104		Baufreiheit Gerüstaufbau	10 Tage	Mon 10.05.27	Mon 24.05.27	82AE
105		Traufstreifen herstellen	10 Tage	Mon 04.10.27	Fre 15.10.27	84
106						
107		**BA 2.2: 10-13 West**	**115 Tage?**	**Mon 09.08.27**	**Fre 28.01.28**	
108		**BE**	**93 Tage?**	**Mon 30.08.27**	**Mit 19.01.28**	
109		Aufbau Bauzaun	3 Tage	Mon 30.08.27	Mit 01.09.27	113AA+5 Tage
110		Containerstellung	1 Tag?	Mon 06.09.27	Mon 06.09.27	117AA
111		Abbau Bauzaun	3 Tage	Mon 17.01.28	Mit 19.01.28	115
112		**Gerüst**	**95 Tage?**	**Mon 23.08.27**	**Fre 14.01.28**	
113		Aufbau	10 Tage	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27	90EE-10 Tage
114		Vorhaltung	81 Tage?	Mon 06.09.27	Mon 10.01.28	113
115		Demontage	5 Tage	Mon 10.01.28	Fre 14.01.28	133
116		**Fassadenarbeiten**	**75 Tage**	**Mon 06.09.27**	**Fre 17.12.27**	
117		Vorarbeiten	15 Tage	Mon 06.09.27	Fre 24.09.27	113
118		Fensterbänke	10 Tage	Mon 27.09.27	Fre 08.10.27	117;10EA+20 Tag
119		Dämmung	30 Tage	Mon 27.09.27	Fre 05.11.27	117
120		Putz	25 Tage	Mon 25.10.27	Fre 26.11.27	119AA+20 Tage
121		Anstrich	25 Tage	Mon 15.11.27	Fre 17.12.27	120AA+15 Tage
122		**Metall- und Fenster**	**100 Tage**	**Mon 16.08.27**	**Fre 14.01.28**	
123		Demontagen Anbauten	5 Tage	Mon 16.08.27	Mon 23.08.27	113AE
124		Abdichtung Bestandsfenster	15 Tage	Mon 13.09.27	Fre 01.10.27	119AE+5 Tage
125		neue Anschlüsse	10 Tage	Mon 29.11.27	Fre 10.12.27	120
126		Vordächer Aufbau	10 Tage	Mon 03.01.28	Fre 14.01.28	121
127		**Malerarbeiten**	**50 Tage**	**Mon 11.10.27**	**Fre 17.12.27**	
128		Überholungsanst Bestandsfenster	25 Tage	Mon 11.10.27	Fre 12.11.27	119EE+5 Tage
129		Maler innen	15 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.12.27	121EE
130		**Dacharbeiten**	**70 Tage**	**Mon 20.09.27**	**Fre 07.01.28**	
131		Aufnehmen Dach	5 Tage	Mon 20.09.27	Mon 27.09.27	132AE
132		neuer Dachrandanschlu	10 Tage	Mon 27.09.27	Fre 08.10.27	119AA
133		Dachklempner	15 Tage	Mon 06.12.27	Fre 07.01.28	121EE+5 Tage
134		**Außenanlagen**	**115 Tage**	**Mon 09.08.27**	**Fre 28.01.28**	
135		Baufreiheit Gerüstaufbau	10 Tage	Mon 09.08.27	Mon 23.08.27	113AE
136		Traufstreifen herstellen	10 Tage	Mon 17.01.28	Fre 28.01.28	115

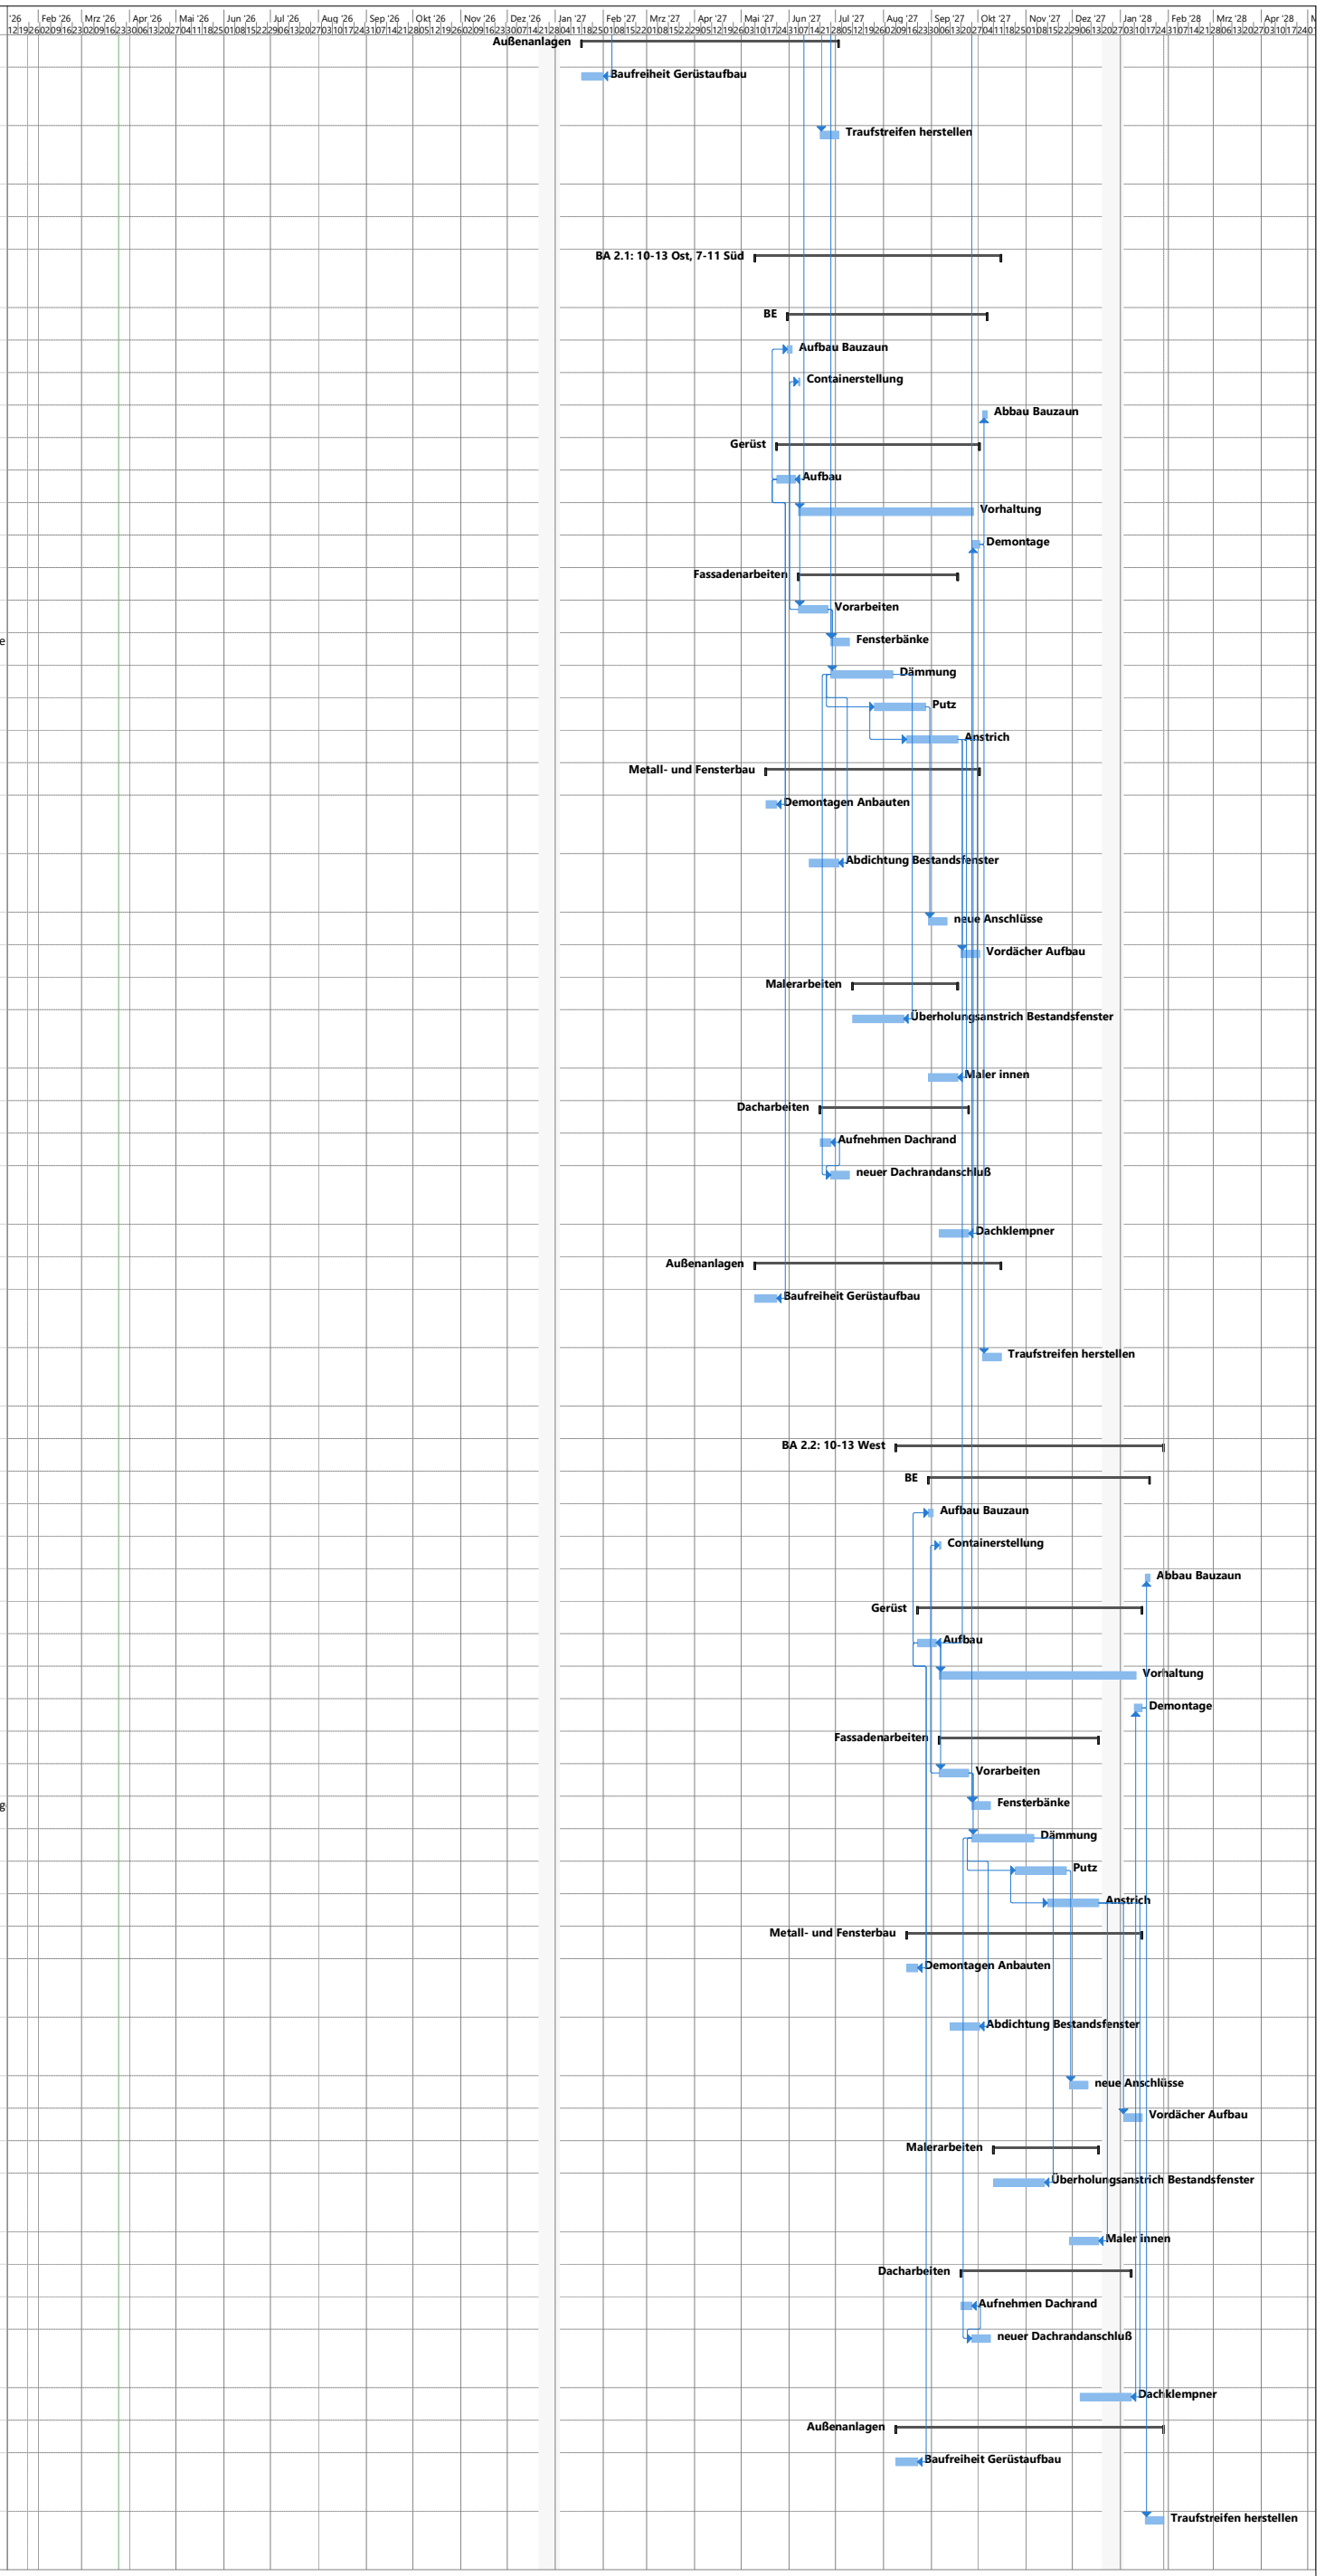

Projekt: 260325-Bauzeitenplan
Datum: Mit 25.03.26

Vorgang	Sammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	Externer Meilenstein	Manueller Fortschritt
Unterbrechung	Projektsammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende	Stichtag	
Meilenstein	Inaktiver Vorgang	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Externe Vorgänge	In Arbeit	
