A 11, km 68,915 - 73,355 linke RF; grundhafter Ausbau der linken RF einschl. Instandsetzung BW31a-1 und Erneuerung BW 32-1 und BW 33-1 und Anpassung der AS Warnitz

Nr.	Vorgangsname
1	Bauzeitbeschränkung Schreialder 2026
2	Bauzeitbeschränkung Kranich 2026
3	Bauzeitbeschränkung Schreialder 2027
4	Bauzeitbeschränkung Kranich 2027
5	Bauzeitbeschränkung Schreialder 2028
6	Bauzeitbeschränkung Kranich 2028
7	Bauzeitbeschränkung Schreialder 2029
8	Bauzeitbeschränkung Kranich 2029
9	sperrfreie Zeit - Ostern 2026
10	sperrfreie Zeit - Ostern 2027
11	sperrfreie Zeit - Ostern 2028
12	sperrfreie Zeit - Ostern 2029
13	**Vorarbeiten**
14	Erstellung der Anordnungspläne/Verkehrszeichenpläne
15	Prüfung und Genehmigung der Verkehrszeichenpläne - Erteilung verkehrsrechtliche Anordnung
16	Erstellung der Ausführungsplanung für Bauwerke, Durchlässe, Verbauten u. Kragarme
17	Prüfung und Freigabe der Ausführungsplanungen (AG)
18	Gleichstellung der Ausführungsunterlagen für Bauwerke, Durchlässe, Verbauten u. Kragarme
19	Erstellung Ausführungsplanung Schutzeinrichtungen
20	Prüfung und Freigabe der Ausführungsplanungen (AG)
21	**A11, km 68,915 - km 73,355**
22	**Staumanagement einrichten, betreiben, Rückbauen**
23	Einrichten der mobilen Stauwarnanlage inkl. Umleitungsstrecke (beidseitig)
24	Probebetrieb der mobilen Stauwarnanlage
25	Inbetriebnahme der mobilen Stauwarnanlage
26	Rückbauen der mobilen Stauwarnanlage inkl. Umleitungsstrecke (beidseitig)
27	**Vorabmaßnahmen an der rechten RF**
28	**Verkehrsführung**
29	Einrichten der 2+1 Verkehrsführung ohne TSE
30	Inbetriebnahme 2+1 Verkehrsführung ohne TSE
31	Rückbau der 2+1 Verkehrsführung ohne TSE
32	Verkehrsfreigabe vor Winter
33	**Vorabmaßnahmen**
34	Demontage Stahlschutzeinrichtung und Leitpfosten
35	Abbau der Verkehrszeichen im Bankettbereich
36	Bankettarbeiten am äußeren Fahrbahnrand
37	Zaunarbeiten
38	Montage Stahlschutzeinrichtung und Leitpfosten (mit 2 Kollonnen)
39	Wiederaufbau der Verkehrszeichen und Kilometertafeln im Bankettbereich
40	**Bauphase 1**
41	**Verkehrsführung**
42	Einrichten der 1+1 Verkehrsführung inkl. TSE beidseitig
43	Inbetriebnahme 1+1 Verkehrsführung für Bauphase 1
44	Umbau der 1+1 Verkehrsführung zu einer 2+0 Verkehrsführung inkl. TSE
45	**Bauphase 1 - Vorbereitende Arbeiten**
46	**Streckenabschnitt A11, km 68,915 - km 73,355**
47	Vollsperrung AS Warnitz (beidseitig)
48	Abbau der Verkehrszeichen im Mittelstreifen
49	Demontage Stahlschutzeinrichtung (Mittelstreifen)
50	Abbruch Betonschutzwände inkl. Fundamente (Mittelstreifen)
51	Baupause - Winter 2026/2027
52	Herstellung Mittelstreifenüberfahrten und Baustellenzufahrten
53	Verbauarbeiten Durchlässe - Bohrungen einschließlich Trägermontage (64 Stk.)
54	**Bauphase 2**
55	**Verkehrsführung**
56	Inbetriebnahme 2+0 Verkehrsführung für Bauphase 2a
57	Umbau der 2+0 Verkehrsführung zu einer zu 1+1 Verkehrsführung
58	Inbetriebnahme 1+1 Verkehrsführung für Bauphase 2b
59	Rückbau der 1+1 Verkehrsführung inkl TSE beidseitig inkl. vollständige Demarkierung Gelb
60	Verkehrsfreigabe vor Winter
61	**Streckenabschnitt A11, km 68,915 - km 73,000**
62	**Bauphase 2a - Ausbau linke RF inkl. Bauwerke und AS Warnitz**
63	Vollsperrung AS Warnitz - RF Stettin
64	Vollsperrung AS Warnitz - RF Berlin
65	Baufeldfreimachung, Rodung Wurzelstöcke
66	Abbau Umsetzen der Kilometertafeln an den Mittelstreifen
67	Abbau der Verkehrszeichen im Bankettbereich
68	Beseitigung der vorhandenen Markierung
69	Demontage Stahlschutzeinrichtung und Leitpfosten (äußerer Fahrbahnrand)
70	Ausbau Bankette (äußeren Fahrbahnrand, Mittelstreifen und AS Warnitz)
71	Oberbodenabtrag
72	Abbrucharbeiten im Randbereich (Nebenflächen, Entwässerung, Fundamente Kragarme)
73	Asphalt fräsen einschließlich Rampen der AS Warnitz
74	Abbruch vorhandene Betondecke
75	Abbruch Pflaster der Rampen der AS Warnitz (grundhafter Bereich)
76	Abtrag Boden
77	Bodenverbesserung und Dammnachverdichtung
78	Fundamente und Sockel der Kragarme herstellen, Baugrube verfüllen
79	Auftrag Boden
80	Verbauarbeiten an Durchlässen - Anker und Bohlen einbringen
81	Durchlassarbeiten inkl. Baugruben verfüllen
82	Entwässerungseinrichtungen im Mittelstreifen wiederherstellen
83	teilw. Ersatzneubau Irritationsschutzwand BW 32Ü1 - Grünbrücke
84	Entwässerungseinrichtungen im Bankett herstellen
85	Planum herstellen
86	Frostschutzschicht herstellen
87	**Ersatzneubau BW 32-1**
88	baubegleitende Kampfmittelsondierung am BW 32-1
89	Verbauarbeiten
90	Abbruch Bauwerk 32-1
91	Neubau Bauwerk 32-1
92	Fertigstellung Ersatzneubau BW32-1
93	**Ersatzneubau BW 33-1**
94	baubegleitende Kampfmittelsondierung am BW 33-1
95	Verbauarbeiten
96	Abbruch Bauwerk 33-1
97	Vollsperrung K 7315 - Abbruch Überbau
98	Neubau Bauwerk 33-1
99	Vollsperrung K 7315 - Herstellung Traggerüst Überbau
100	Vollsperrung K 7315 - Rückbau Traggerüst Überbau
101	Fertigstellung Ersatzneubau BW33-1
102	Instandsetzung BW 31a-1
103	Schottertragschicht herstellen
104	Asphalttragschicht herstellen
105	Asphaltbinderschicht herstellen einschl. Rampen AS Warnitz
106	Asphaltdeckschicht (SMA/MA) herstellen (inkl. Fugen) einschl. Rampen AS Warnitz
107	Bankettarbeiten inkl. Rampen AS Warnitz
108	Pflasterarbeiten (Mulden, Kaskaden, Böschungsausläufe)
109	Oberbodenauftrag
110	Mulden und Erdschwellen herstellen einschl. Oberbodenandeckung
111	Herstellung Wildschutzzaun und Böschungstreppen inkl. Geländer
112	Montage Schutzeinrichtungen und Leitpfosten am äußeren Fahrbahnrand
113	Montage Stahlkonstruktion Kragarme
114	Herstellung Endmarkierung (Folie) der linken RF inkl. AS Warnitz, Nachmarkierung u. Beschilderung
115	Fertigstellung Streckenabschnitt km 68,915 - km 73,000
116	**Streckenabschnitt A11, km 73,000 - km 73,355**
117	**Bauphase 2a - Ausbau linke RF inkl. Bauwerke und AS Warnitz**
118	Baufeldfreimachung, Rodung Wurzelstöcke
119	Abbau Umsetzen der Kilometertafeln an den Mittelstreifen
120	Abbau der Verkehrszeichen im Bankettbereich
121	Beseitigung der vorhandenen Markierung
122	Demontage Stahlschutzeinrichtung und Leitpfosten (äußerer Fahrbahnrand)
123	Ausbau Bankette (äußeren Fahrbahnrand, Mittelstreifen und AS Warnitz)
124	Oberbodenabtrag
125	Abbrucharbeiten im Randbereich (Nebenflächen, Entwässerung, Fundamente Kragarme)
126	Asphalt fräsen
127	Abbruch vorhandene Betondecke
128	Baupause - Bauzeitbeschränkung bis 30.09.
129	Abtrag Boden
130	Bodenverbesserung und Dammnachverdichtung
131	Fundamente und Sockel der Kragarme herstellen, Baugrube verfüllen
132	Auftrag Boden
133	Verbauarbeiten an Durchlässen - Anker und Bohlen einbringen
134	Durchlassarbeiten inkl. Baugruben verfüllen
135	Entwässerungseinrichtungen im Mittelstreifen wiederherstellen
136	Entwässerungseinrichtungen im Bankett herstellen
137	Planum herstellen
138	Frostschutzschicht herstellen
139	Schottertragschicht herstellen
140	Asphalttragschicht herstellen
141	Asphaltbinderschicht herstellen
142	Asphaltdeckschicht (SMA/MA) herstellen (inkl. Fugen)
143	Herstellung Endmarkierung (Folie) der linken RF inkl. Nachmarkierung
144	Bankettarbeiten
145	Pflasterarbeiten (Mulden, Kaskaden, Böschungsausläufe)
146	Oberbodenauftrag
147	Mulden und Erdschwellen herstellen einschl. Oberbodenandeckung
148	Herstellung Wildschutzzaun und Böschungstreppen inkl. Geländer
149	Montage Schutzeinrichtungen und Leitpfosten am äußeren Fahrbahnrand
150	Montage Stahlkonstruktion Kragarme
151	Montage Beschilderung
152	Fertigstellung Streckenabschnitt km 73,000 - km 73,355
153	**Bauphase 2b - Restarbeiten am Mittelstreifen**
154	**Streckenabschnitt A11, km 68,915 - km 73,355**
155	Rückbau der Mittelstreifenüberfahrten
156	Bankettarbeiten
157	Höhenanpassung der Schächte im Mittelstreifen
158	Oberbodenauftrag und Profilierung Mittelstreifen
159	Montage Schutzeinrichtung (Mittelstreifen)
160	Baupause - Winter bis 31.03
161	**Folgemaßnahmen an der rechten RF**
162	Verkehrssicherung Tagesbaustellen
163	Markierungsarbeiten (Endmarkierung und Auffrischung)
164	Zaunarbeiten an der rechte RF

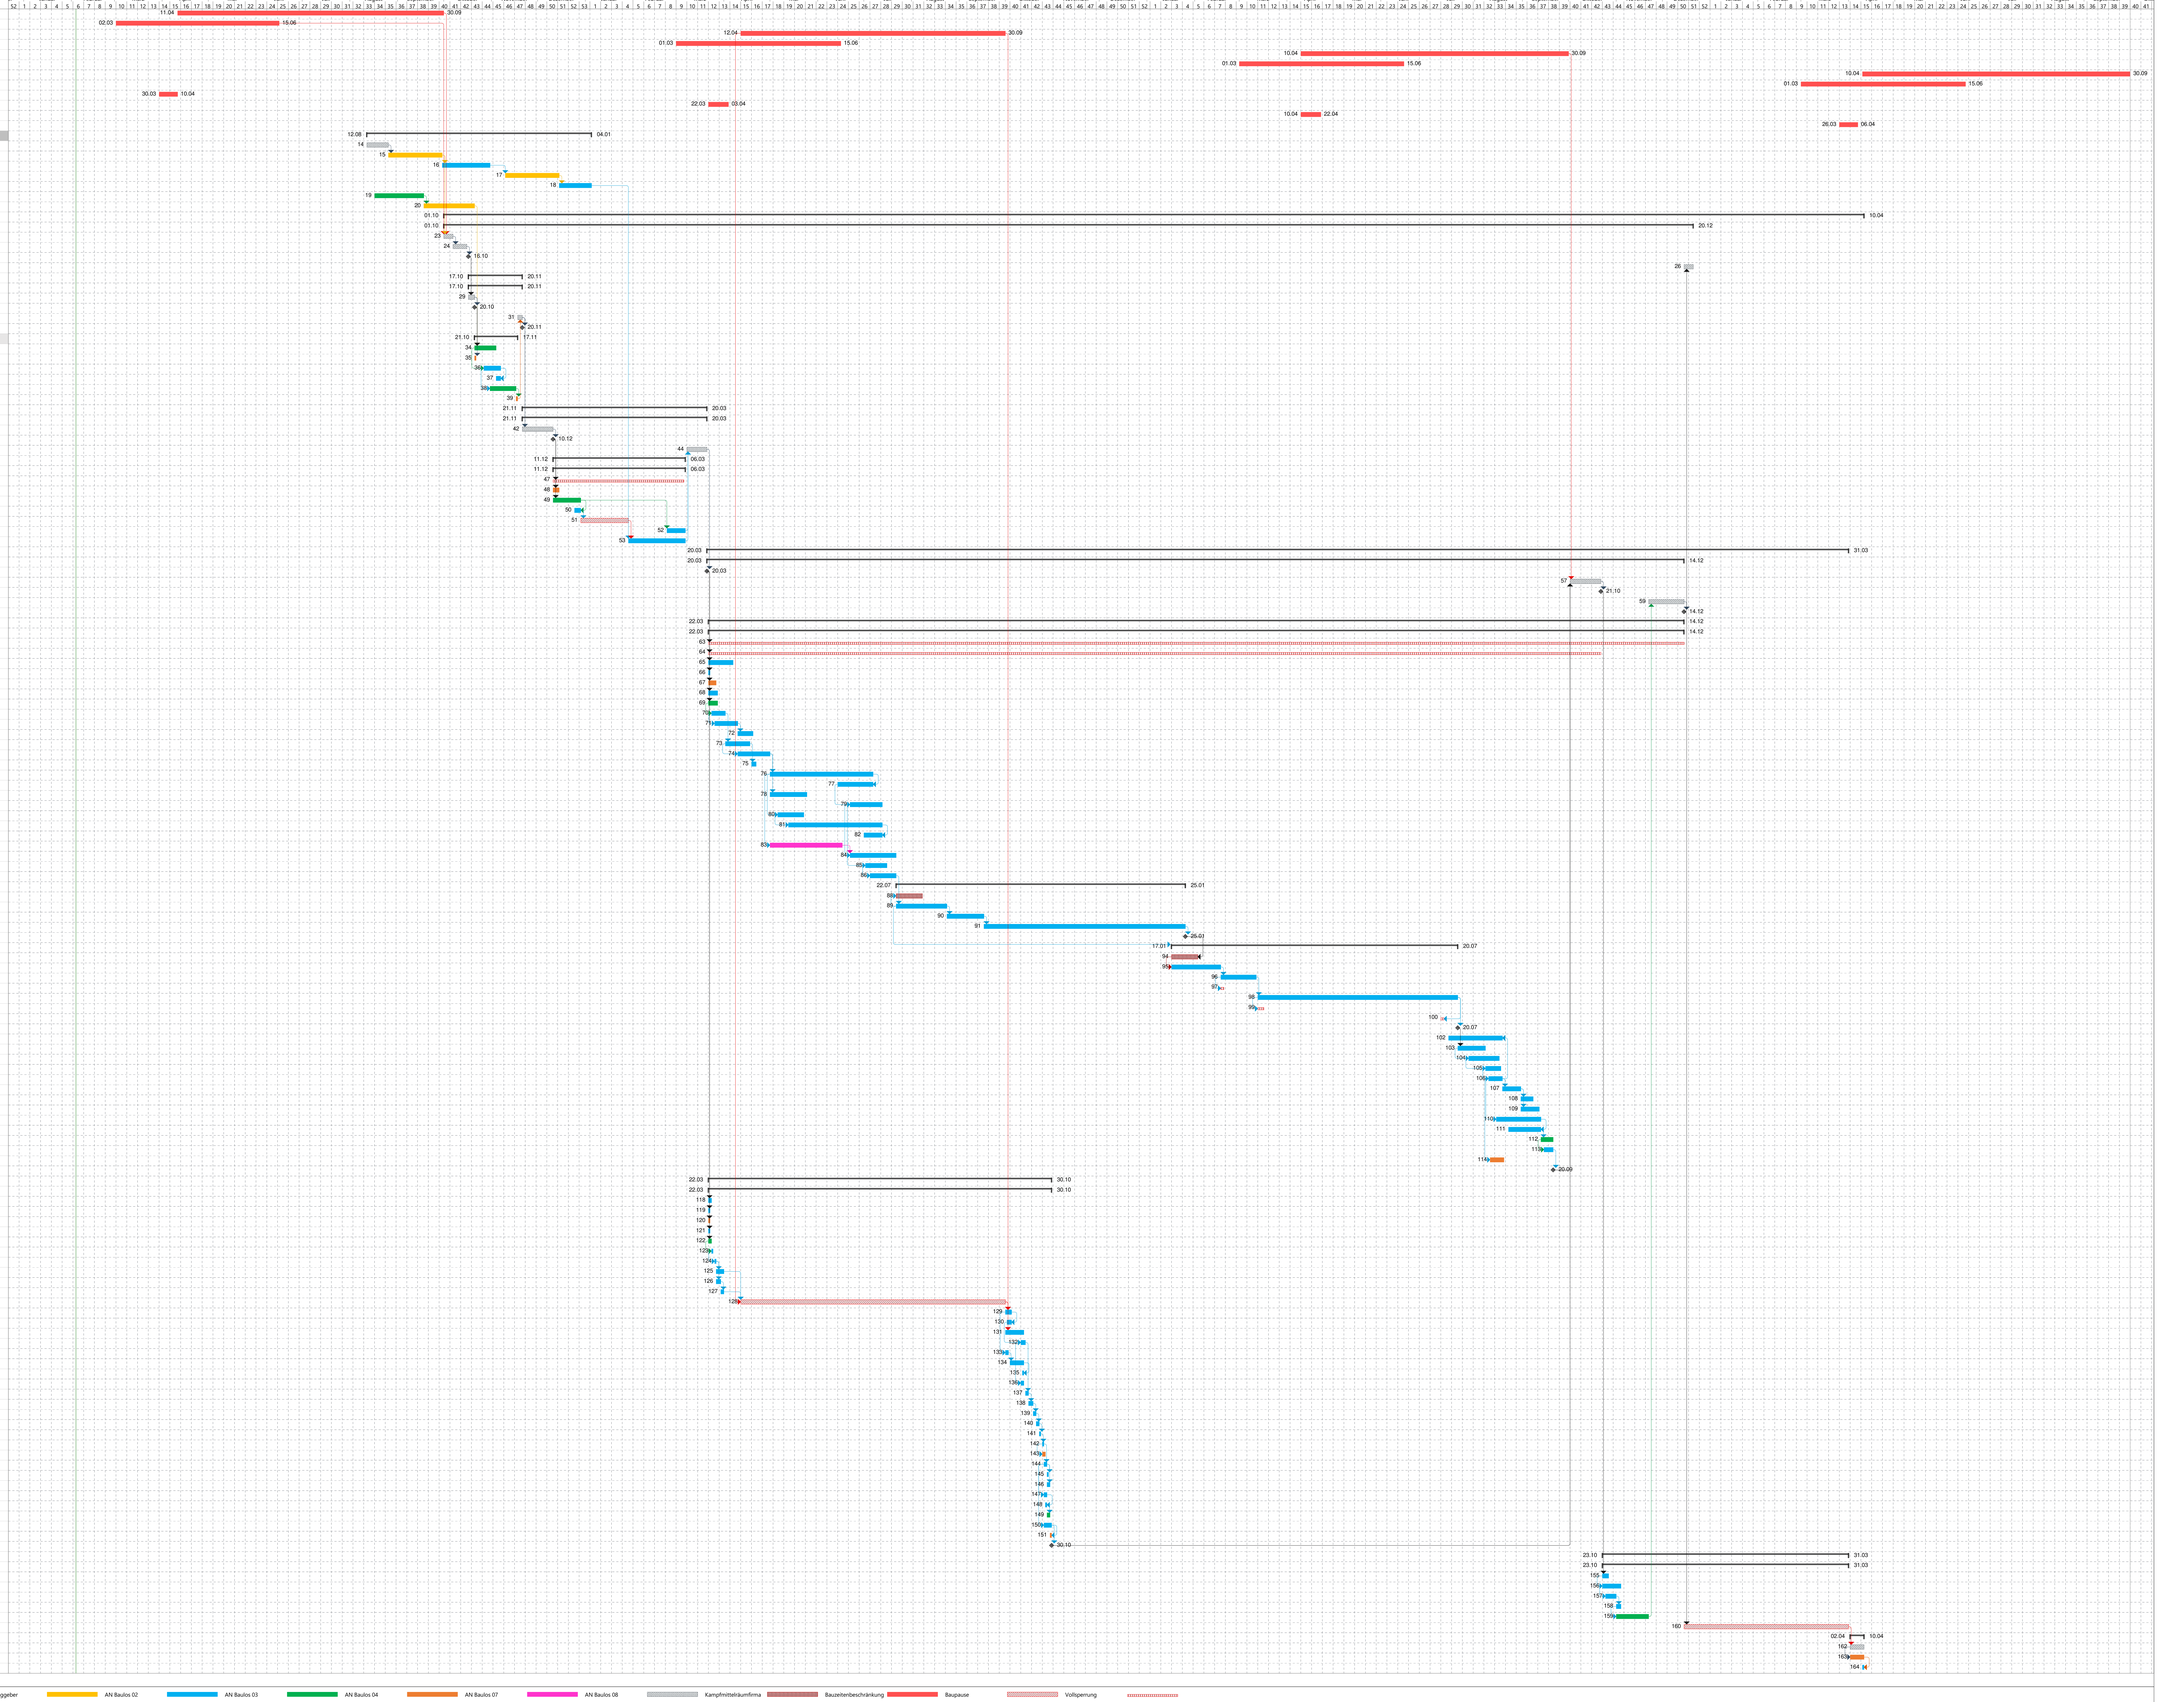

Datum: Mit 04.02.26 | Meilenstein | Sammelvorgang | Auftraggeber | AN Baulos 02 | AN Baulos 03 | AN Baulos 04 | AN Baulos 07 | AN Baulos 08 | Kampfmittelräumfirma | Bauzeitenbeschränkung | Baupause | Vollsperrung
