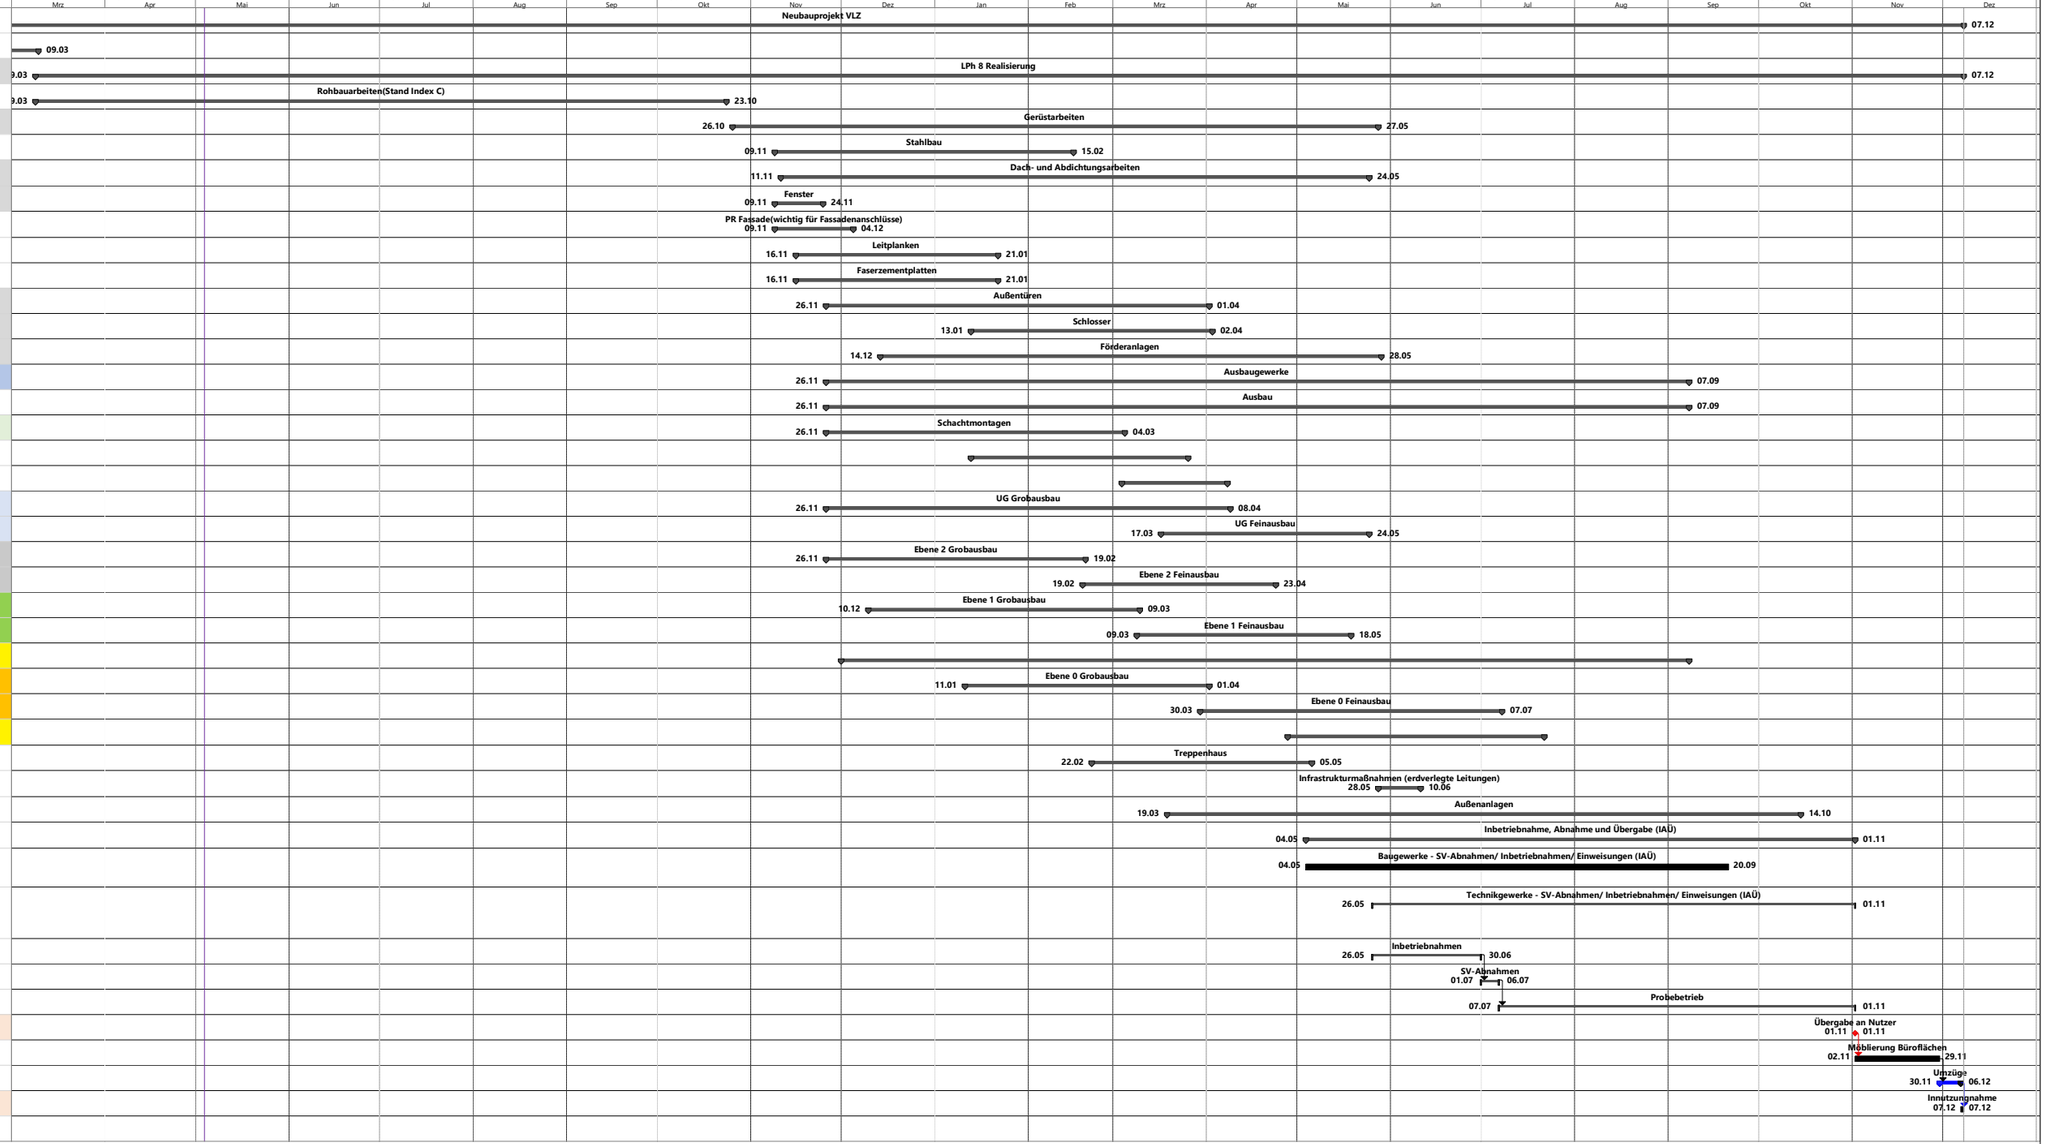Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Neubauprojekt VLZ	529 Tage	Die 11.11.25	Die 07.12.27
2	**Projektstart**	**85 Tage**	**Die 11.11.25**	**Mon 09.03.26**
5	**LPh 8 Realisierung**	**445 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Die 07.12.27**
6	**Rohbauarbeiten(Stand Index C)**	**165 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Fre 23.10.26**
26	**Gerüstarbeiten**	**142 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Don 27.05.27**
32	**Stahlbau**	**59 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Mon 15.02.27**
38	**Dach- und Abdichtungsarbeiten**	**127 Tage**	**Mit 11.11.26**	**Mon 24.05.27**
48	**Fenster**	**12 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Die 24.11.26**
52	**PR Fassade(wichtig für Fassadenanschlüsse)**	**20 Tage**	**Mon 09.11.26**	**Fre 04.12.26**
59	**Leitplanken**	**37 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Don 21.01.27**
63	**Faserzementplatten**	**37 Tage**	**Mon 16.11.26**	**Don 21.01.27**
67	**Außentüren**	**79 Tage**	**Don 26.11.26**	**Don 01.04.27**
71	**Schlosser**	**58 Tage**	**Mit 13.01.27**	**Fre 02.04.27**
75	**Förderanlagen**	**108 Tage**	**Mon 14.12.26**	**Fre 28.05.27**
79	**Ausbaugewerke**	**192 Tage**	**Don 26.11.26**	**Die 07.09.27**
80	**Ausbau**	**192 Tage**	**Don 26.11.26**	**Die 07.09.27**
81	**Schachtmontagen**	**59 Tage**	**Don 26.11.26**	**Don 04.03.27**
107	**Ebene3 Dach Grobausbau**	**52 Tage**	**Mit 13.01.27**	**Don 25.03.27**
119	**Ebene 3/Dach Feinausbau**	**25 Tage**	**Don 04.03.27**	**Mit 07.04.27**
123	**UG Grobausbau**	**84 Tage**	**Don 26.11.26**	**Don 08.04.27**
144	**UG Feinausbau**	**49 Tage**	**Mit 17.03.27**	**Mon 24.05.27**
153	**Ebene 2 Grobausbau**	**50 Tage**	**Don 26.11.26**	**Fre 19.02.27**
176	**Ebene 2 Feinausbau**	**46 Tage**	**Fre 19.02.27**	**Fre 23.04.27**
197	**Ebene 1 Grobausbau**	**52 Tage**	**Don 10.12.26**	**Die 09.03.27**
219	**Ebene 1 Feinausbau**	**51 Tage**	**Die 09.03.27**	**Die 18.05.27**
241	**Ausbau Leitraum**	**189 Tage**	**Die 01.12.26**	**Die 07.09.27**
256	**Ebene 0 Grobausbau**	**59 Tage**	**Mon 11.01.27**	**Don 01.04.27**
276	**Ebene 0 Feinausbau**	**72 Tage**	**Die 30.03.27**	**Mit 07.07.27**
299	**Serverrraum Ebene 0 Ausbau**	**61 Tage**	**Mit 28.04.27**	**Mit 21.07.27**
306	**Treppenhaus**	**53 Tage**	**Mon 22.02.27**	**Mit 05.05.27**
313	**Infrastrukturmaßnahmen (erdverlegte Leitungen)**	**10 Tage**	**Fre 28.05.27**	**Don 10.06.27**
319	**Außenanlagen**	**150 Tage**	**Fre 19.03.27**	**Don 14.10.27**
326	**Inbetriebnahme, Abnahme und Übergabe**	**130 Tage**	**Die 04.05.27**	**Mon 01.11.27**
327	Baugewerke - SV-Abnahmen/ Inbetriebnahmen/	5 Monate	Die 04.05.27	Mon 20.09.27
328	**Technikgewerke - SV-Abnahmen/ Inbetriebnahmen/ Einweisungen (IAÜ)**	**114 Tage**	**Mit 26.05.27**	**Mon 01.11.27**
329	**Inbetriebnahmen**	**26 Tage**	**Mit 26.05.27**	**Mit 30.06.27**
334	**SV-Abnahmen**	**4 Tage**	**Don 01.07.27**	**Die 06.07.27**
339	**Probebetrieb**	**84 Tage**	**Mit 07.07.27**	**Mon 01.11.27**
347	**Übergabe an Nutzer**	**0 Tage**	**Mon 01.11.27**	**Mon 01.11.27**
348	Möblierung Büroflächen	20 Tage	Die 02.11.27	Mon 29.11.27
349	Umzüge	5 Tage	Die 30.11.27	Mon 06.12.27
350	**Innutzungnahme**	**1 Tag**	**Die 07.12.27**	**Die 07.12.27**
351
