Überdachungen Hallen Autobahnmeisterei Kandel

Autobahn GmbH

Druckdatum: 31.03.2026

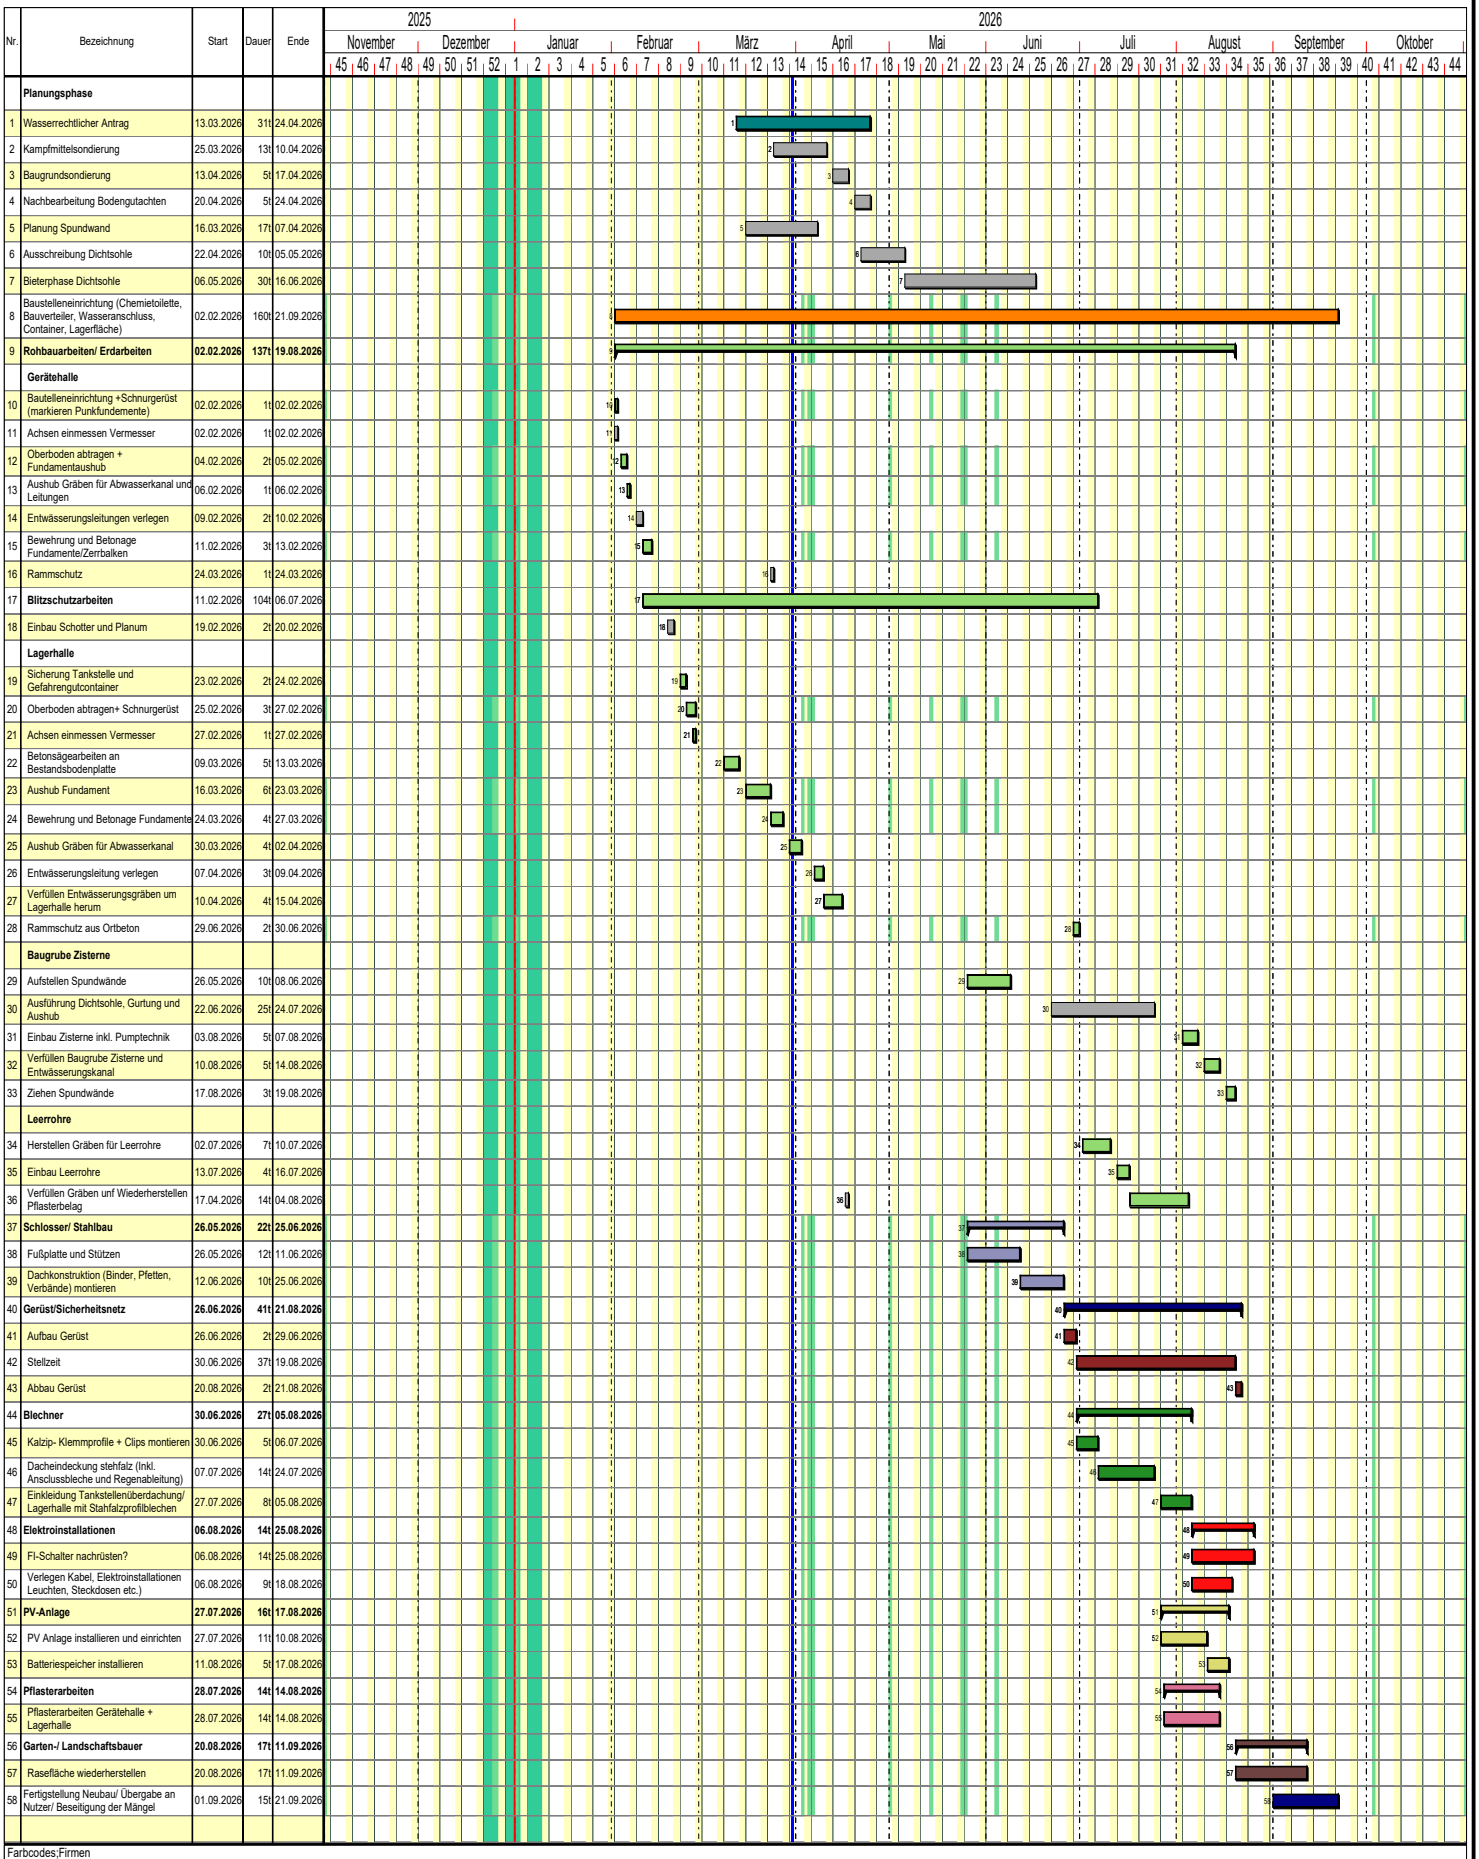

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
	Planungsphase			
1	Wasserrechtlicher Antrag	13.03.2026	31t	24.04.2026
2	Kampfmittelsondierung	25.03.2026	13t	10.04.2026
3	Baugrundsondierung	13.04.2026	5t	17.04.2026
4	Nachbearbeitung Bodengutachten	20.04.2026	5t	24.04.2026
5	Planung Spundwand	16.03.2026	17t	07.04.2026
6	Ausschreibung Dichtsohle	22.04.2026	10t	05.05.2026
7	Bieterphase Dichtsohle	06.05.2026	30t	16.06.2026
8	Baustelleneinrichtung (Chemietoilette, Bauverteiler, Wasseranschluss, Container, Lagerfläche)	02.02.2026	160t	21.09.2026
9	**Rohbauarbeiten/ Erdarbeiten**	**02.02.2026**	**137t**	**19.08.2026**
	Gerätehalle			
10	Bautelleneinrichtung +Schnurgerüst (markieren Punkfundemente)	02.02.2026	1t	02.02.2026
11	Achsen einmessen Vermesser	02.02.2026	1t	02.02.2026
12	Oberboden abtragen + Fundamentaushub	04.02.2026	2t	05.02.2026
13	Aushub Gräben für Abwasserkanal und Leitungen	06.02.2026	1t	06.02.2026
14	Entwässerungsleitungen verlegen	09.02.2026	2t	10.02.2026
15	Bewehrung und Betonage Fundamente/Zerrbalken	11.02.2026	3t	13.02.2026
16	Rammschutz	24.03.2026	1t	24.03.2026
17	**Blitzschutzarbeiten**	11.02.2026	104t	06.07.2026
18	Einbau Schotter und Planum	19.02.2026	2t	20.02.2026
	Lagerhalle			
19	Sicherung Tankstelle und Gefahrengutcontainer	23.02.2026	2t	24.02.2026
20	Oberboden abtragen+ Schnurgerüst	25.02.2026	3t	27.02.2026
21	Achsen einmessen Vermesser	27.02.2026	1t	27.02.2026
22	Betonsägearbeiten an Bestandsbodenplatte	09.03.2026	5t	13.03.2026
23	Aushub Fundament	16.03.2026	6t	23.03.2026
24	Bewehrung und Betonage Fundamente	24.03.2026	4t	27.03.2026
25	Aushub Gräben für Abwasserkanal	30.03.2026	4t	02.04.2026
26	Entwässerungsleitung verlegen	07.04.2026	3t	09.04.2026
27	Verfüllen Entwässerungsgräben um Lagerhalle herum	10.04.2026	4t	15.04.2026
28	Rammschutz aus Ortbeton	29.06.2026	2t	30.06.2026
	Baugrube Zisterne			
29	Aufstellen Spundwände	26.05.2026	10t	08.06.2026
30	Ausführung Dichtsohle, Gurtung und Aushub	22.06.2026	25t	24.07.2026
31	Einbau Zisterne inkl. Pumptechnik	03.08.2026	5t	07.08.2026
32	Verfüllen Baugrube Zisterne und Entwässerungskanal	10.08.2026	5t	14.08.2026
33	Ziehen Spundwände	17.08.2026	3t	19.08.2026
	Leerrohre			
34	Herstellen Gräben für Leerrohre	02.07.2026	7t	10.07.2026
35	Einbau Leerrohre	13.07.2026	4t	16.07.2026
36	Verfüllen Gräben unf Wiederherstellen Pflasterbelag	17.04.2026	14t	04.08.2026
37	**Schlosser/ Stahlbau**	**26.05.2026**	**22t**	**25.06.2026**
38	Fußplatte und Stützen	26.05.2026	12t	11.06.2026
39	Dachkonstruktion (Binder, Pfetten, Verbände) montieren	12.06.2026	10t	25.06.2026
40	**Gerüst/Sicherheitsnetz**	**26.06.2026**	**41t**	**21.08.2026**
41	Aufbau Gerüst	26.06.2026	2t	29.06.2026
42	Stellzeit	30.06.2026	37t	19.08.2026
43	Abbau Gerüst	20.08.2026	2t	21.08.2026
44	**Blechner**	**30.06.2026**	**27t**	**05.08.2026**
45	Kalzip- Klemmprofile + Clips montieren	30.06.2026	5t	06.07.2026
46	Dacheindeckung stehfalz (Inkl. Ansclussbleche und Regenableitung)	07.07.2026	14t	24.07.2026
47	Einkleidung Tankstellenüberdachung/ Lagerhalle mit Stahfalzprofilblechen	27.07.2026	8t	05.08.2026
48	**Elektroinstallationen**	**06.08.2026**	**14t**	**25.08.2026**
49	FI-Schalter nachrüsten?	06.08.2026	14t	25.08.2026
50	Verlegen Kabel, Elektroinstallationen Leuchten, Steckdosen etc.)	06.08.2026	9t	18.08.2026
51	**PV-Anlage**	**27.07.2026**	**16t**	**17.08.2026**
52	PV Anlage installieren und einrichten	27.07.2026	11t	10.08.2026
53	Batteriespeicher installieren	11.08.2026	5t	17.08.2026
54	**Pflasterarbeiten**	**28.07.2026**	**14t**	**14.08.2026**
55	Pflasterarbeiten Gerätehalle + Lagerhalle	28.07.2026	14t	14.08.2026
56	**Garten-/ Landschaftsbauer**	**20.08.2026**	**17t**	**11.09.2026**
57	Rasefläche wiederherstellen	20.08.2026	17t	11.09.2026
58	Fertigstellung Neubau/ Übergabe an Nutzer/ Beseitigung der Mängel	01.09.2026	15t	21.09.2026

Farbcodes;Firmen

Behörden | Nübold Architekten GmbH | Roh- und Kanalbauarbeiten | Schlosser | Gewerke | Gerüstbau | Blechner | Elektroinstallationen | PV-Installationen | Pflasterarbeiten | Garten/ -landschaftsbauer

Projektdatei: N:\01_PROJEKTE\50-Bauvorhaben_gewerblich\50-9154_Kandel_Ueberdachungshallen_AM\F_Bauzeitenplan\50-9154_BZP_2026-03-23.pp
