Neuausrichtung Focke-Museum
Bauzeitenplan
Stand 05.05.2026

SPRINGER ARCHITEKTEN BDA
CAMPE JANDA ARCHITEKTEN BDA
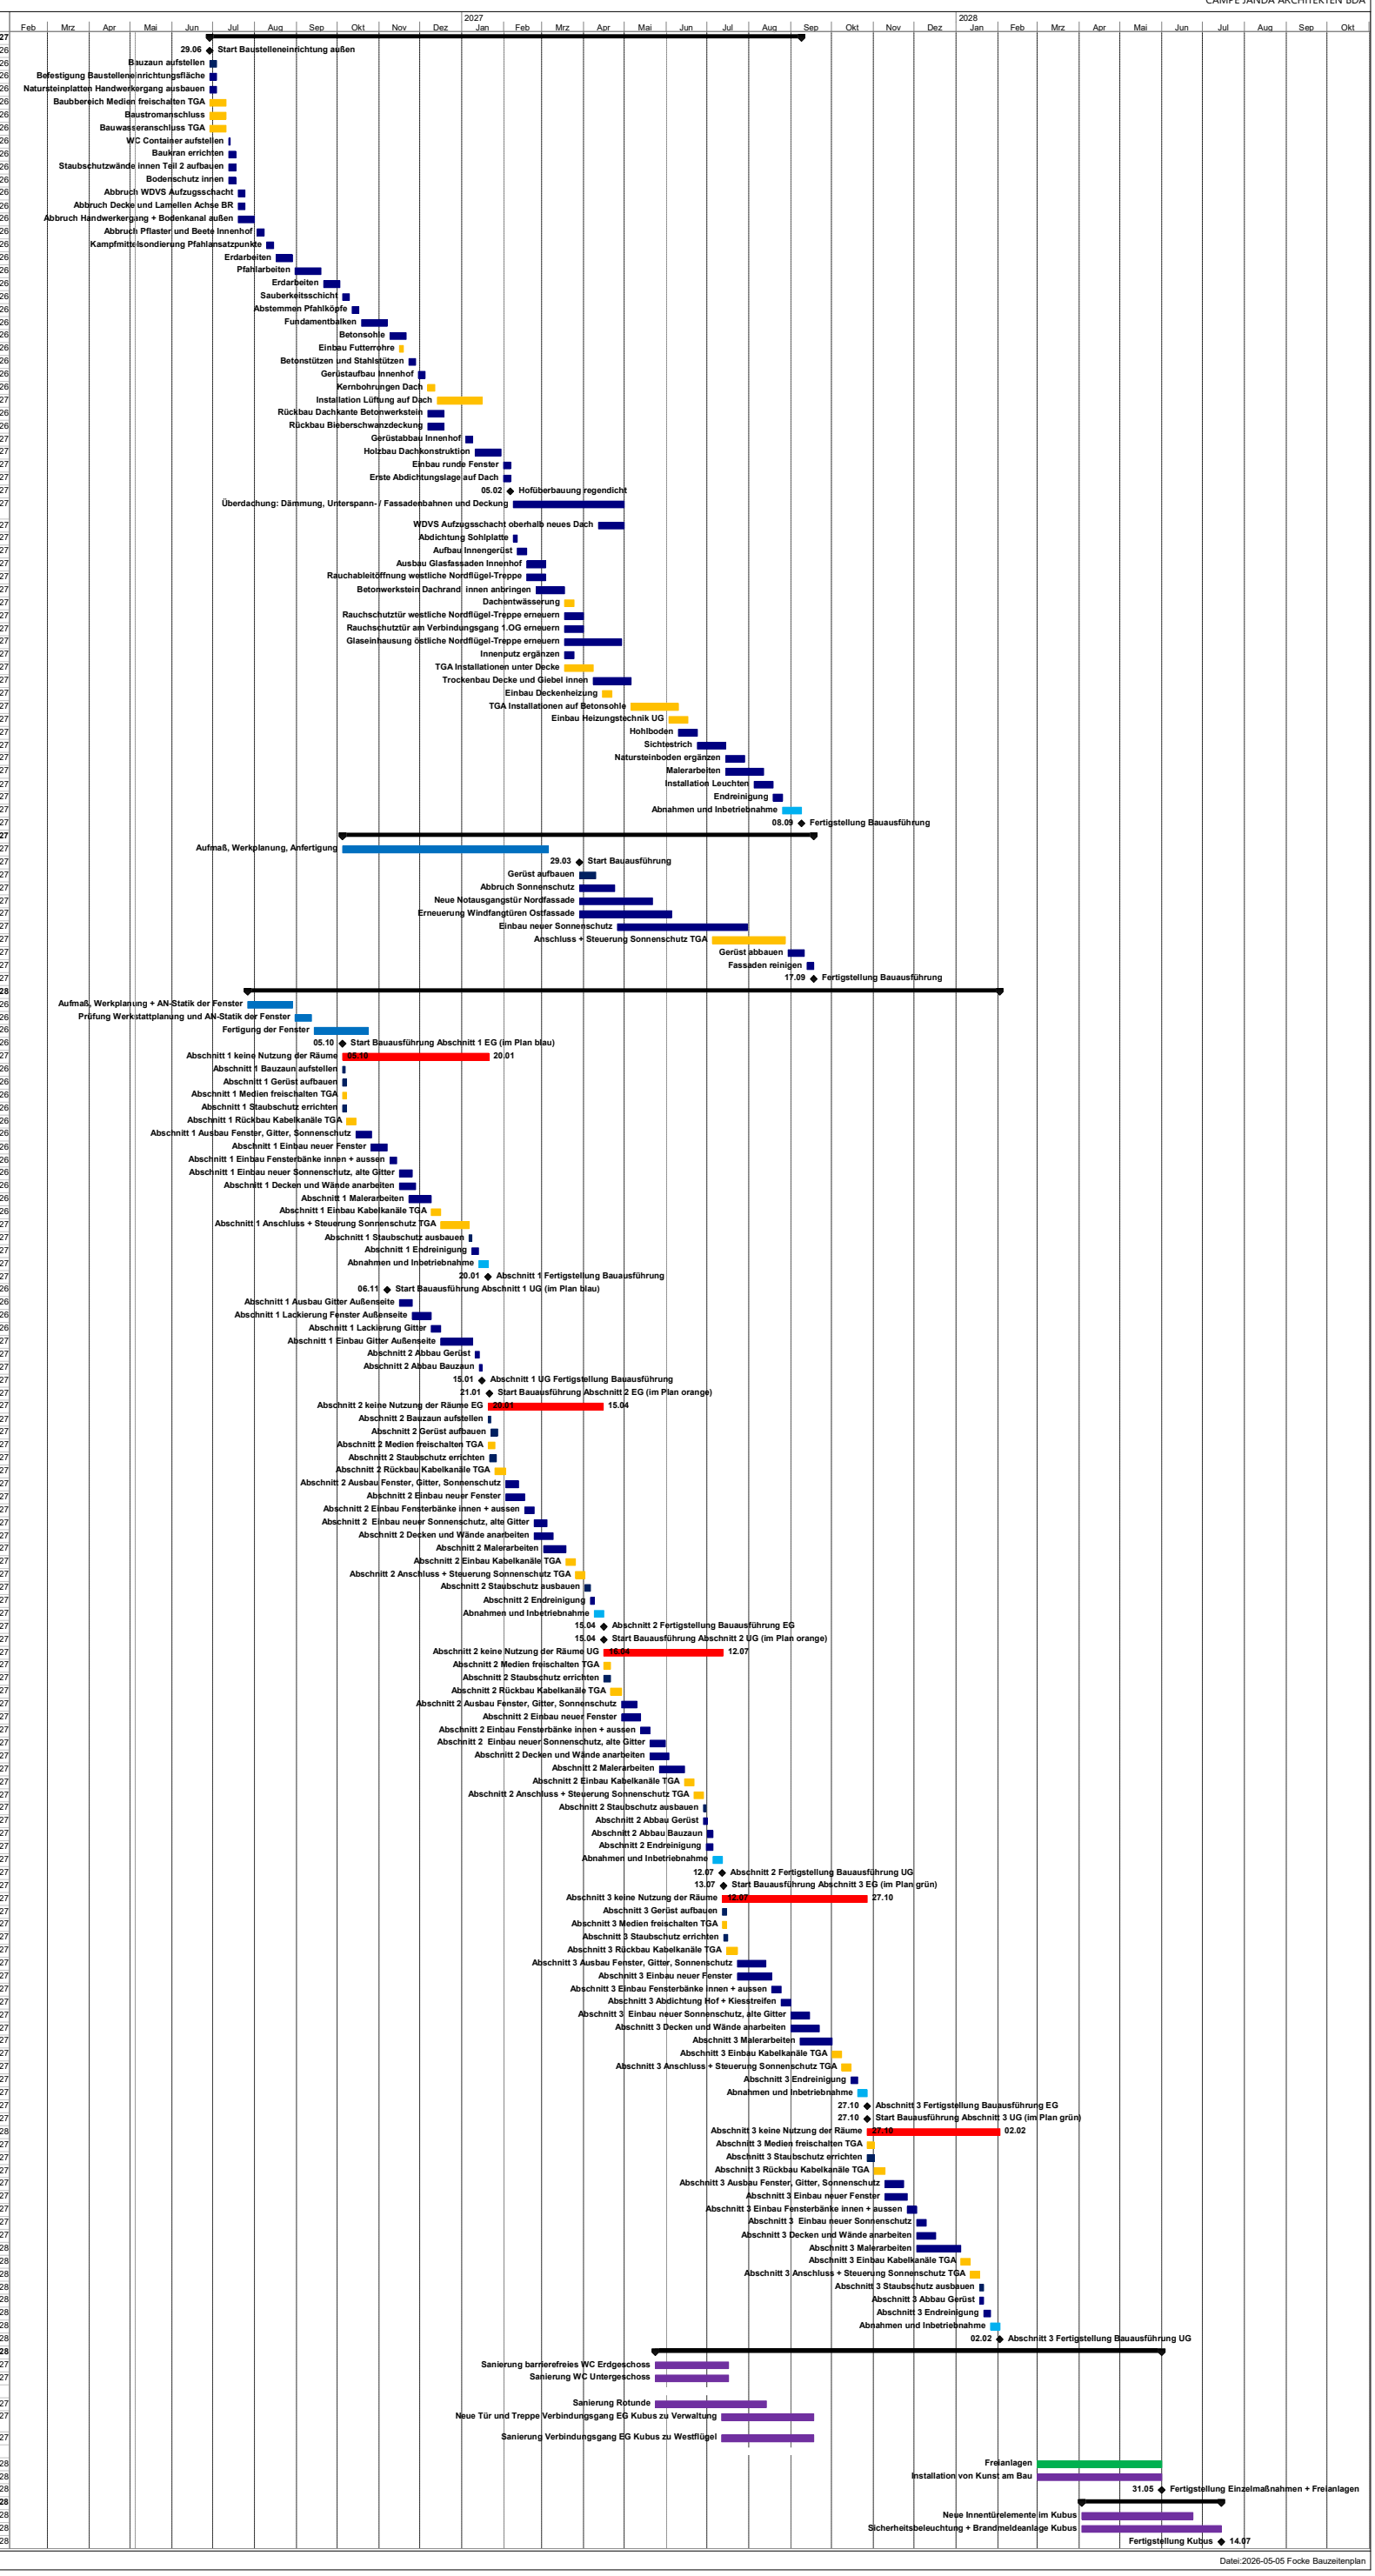
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Hofüberbauung**	**303 t**	**Mon 29.06.26**	**Mit 08.09.27**
2	Start Baustelleneinrichtung außen	0 t	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26
3	Bauzaun aufstellen	1 W	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26
4	Befestigung Baustelleneinrichtungsfläche	1 W	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26
5	Natursteinplatten Handwerkergang ausbauen	1 W	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26
6	Baubbereich Medien freischalten TGA	2 W	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
7	Baustromanschluss	2 W	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
8	Bauwasseranschluss TGA	2 W	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
9	WC Container aufstellen	1 t	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26
10	Baukran errichten	1 W	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26
11	Staubschutzwände innen Teil 2 aufbauen	1 W	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26
12	Bodenschutz innen	1 W	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26
13	Abbruch WDVS Aufzugsschacht	1 W	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
14	Abbruch Decke und Lamellen Achse BR	1 W	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
15	Abbruch Handwerkergang + Bodenkanal außen	2 W	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26
16	Abbruch Pflaster und Beete Innenhof	1 W	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26
17	Kampfmittelsondierung Pfahlansatzpunkte	1 W	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26
18	Erdarbeiten	2 W	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
19	Pfahlarbeiten	3 W	Mon 31.08.26	Fre 18.09.26
20	Erdarbeiten	2 W	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
21	Sauberkeitsschicht	1 W	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
22	Abstemmen Pfahlköpfe	1 W	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26
23	Fundamentbalken	3 W	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26
24	Betonsohle	2 W	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
25	Einbau Futterrohre	3 t	Mon 16.11.26	Mit 18.11.26
26	Betonstützen und Stahlstützen	1 W	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26
27	Gerüstaufbau Innenhof	1 W	Mon 30.11.26	Fre 04.12.26
28	Kernbohrungen Dach	1 W	Mon 07.12.26	Fre 11.12.26
29	Installation Lüftung auf Dach	3 W	Mon 14.12.26	Fre 15.01.27
30	Rückbau Dachkante Betonwerkstein	2 W	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26
31	Rückbau Bieberschwanzdeckung	2 W	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26
32	Gerüstabbau Innenhof	1 W	Mon 04.01.27	Fre 08.01.27
33	Holzbau Dachkonstruktion	3 W	Mon 11.01.27	Fre 29.01.27
34	Einbau runde Fenster	1 W	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27
35	Erste Abdichtungslage auf Dach	1 W	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27
36	Hofüberbauung regendicht	0 t	Fre 05.02.27	Fre 05.02.27
37	Überdachung: Dämmung, Unterspann- / Fassadenbahnen und Deckung	12 W	Mon 08.02.27	Fre 30.04.27
38	WDVS Aufzugsschacht oberhalb neues Dach	3 W	Mon 12.04.27	Fre 30.04.27
39	Abdichtung Sohlplatte	3 t	Mon 08.02.27	Mit 10.02.27
40	Aufbau Innengerüst	1 W	Don 11.02.27	Mit 17.02.27
41	Ausbau Glasfassaden Innenhof	2 W	Don 18.02.27	Mit 03.03.27
42	Rauchableitöffnung westliche Nordflügel-Treppe	2 W	Don 18.02.27	Mit 03.03.27
43	Betonwerkstein Dachrand innen anbringen	3 W	Don 25.02.27	Mit 17.03.27
44	Dachentwässerung	1 W	Don 18.03.27	Mit 24.03.27
45	Rauchschutztür westliche Nordflügel-Treppe erneuern	2 W	Don 18.03.27	Mit 31.03.27
46	Rauchschutztür am Verbindungsgang 1.OG erneuern	2 W	Don 18.03.27	Mit 31.03.27
47	Glaseinhausung östliche Nordflügel-Treppe erneuern	6 W	Don 18.03.27	Mit 28.04.27
48	Innenputz ergänzen	1 W	Don 18.03.27	Mit 24.03.27
49	TGA Installationen unter Decke	3 W	Don 18.03.27	Mit 07.04.27
50	Trockenbau Decke und Giebel innen	4 W	Don 08.04.27	Mit 05.05.27
51	Einbau Deckenheizung	1 W	Don 15.04.27	Mit 21.04.27
52	TGA Installationen auf Betonsohle	5 W	Don 06.05.27	Mit 09.06.27
53	Einbau Heizungstechnik UG	2 W	Don 03.06.27	Mit 16.06.27
54	Hohlboden	2 W	Don 10.06.27	Mit 23.06.27
55	Sichtestrich	3 W	Don 24.06.27	Mit 14.07.27
56	Natursteinboden ergänzen	2 W	Don 15.07.27	Mit 28.07.27
57	Malerarbeiten	4 W	Don 15.07.27	Mit 11.08.27
58	Installation Leuchten	2 W	Don 05.08.27	Mit 18.08.27
59	Endreinigung	1 W	Don 19.08.27	Mit 25.08.27
60	Abnahmen und Inbetriebnahme	2 W	Don 26.08.27	Mit 08.09.27
61	Fertigstellung Bauausführung	0 t	Mit 08.09.27	Mit 08.09.27
62	**Sonnenschutz + Türen West-, Nord-, Ost-, Südflügel**	**240 t**	**Mon 05.10.26**	**Fre 17.09.27**
63	Aufmaß, Werkplanung, Anfertigung	20 W	Mon 05.10.26	Fre 05.03.27
64	Start Bauausführung	0 t	Mon 29.03.27	Mon 29.03.27
65	Gerüst aufbauen	2 W	Mon 29.03.27	Fre 09.04.27
66	Abbruch Sonnenschutz	4 W	Mon 29.03.27	Fre 23.04.27
67	Neue Notausgangstür Nordfassade	8 W	Mon 29.03.27	Fre 21.05.27
68	Erneuerung Windfangtüren Ostfassade	10 W	Mon 29.03.27	Fre 04.06.27
69	Einbau neuer Sonnenschutz	14 W	Mon 26.04.27	Fre 30.07.27
70	Anschluss + Steuerung Sonnenschutz TGA	8 W	Mon 05.07.27	Fre 27.08.27
71	Gerüst abbauen	2 W	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27
72	Fassaden reinigen	1 W	Mon 13.09.27	Fre 17.09.27
73	Fertigstellung Bauausführung	0 t	Fre 17.09.27	Fre 17.09.27
74	**Verwaltung**	**377,...**	**Mon 27.07.26**	**Mit 02.02.28**
75	Aufmaß, Werkplanung + AN-Statik der Fenster	5 W	Mon 27.07.26	Fre 28.08.26
76	Prüfung Werkstattplanung und AN-Statik der Fenster	2 W	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26
77	Fertigung der Fenster	6 W	Mon 14.09.26	Fre 23.10.26
78	**Start Bauausführung Abschnitt 1 EG (im Plan blau)**	0 t	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26
79	Abschnitt 1 keine Nutzung der Räume	68 t	Mon 05.10.26	Mit 20.01.27
80	Abschnitt 1 Bauzaun aufstellen	2 t	Mon 05.10.26	Die 06.10.26
81	Abschnitt 1 Gerüst aufbauen	3 t	Mon 05.10.26	Mit 07.10.26
82	Abschnitt 1 Medien freischalten TGA	3 t	Mon 05.10.26	Mit 07.10.26
83	Abschnitt 1 Staubschutz errichten	3 t	Mon 05.10.26	Mit 07.10.26
84	Abschnitt 1 Rückbau Kabelkanäle TGA	1 W	Don 08.10.26	Mit 14.10.26
85	Abschnitt 1 Ausbau Fenster, Gitter, Sonnenschutz	1,5 W	Don 15.10.26	Mon 26.10.26
86	Abschnitt 1 Einbau neuer Fenster	2 W	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26
87	Abschnitt 1 Einbau Fensterbänke innen + aussen	1 W	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26
88	Abschnitt 1 Einbau neuer Sonnenschutz, alte Gitter	1,5 W	Mon 16.11.26	Mit 25.11.26
89	Abschnitt 1 Decken und Wände anarbeiten	2 W	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26
90	Abschnitt 1 Malerarbeiten	2,5 W	Mon 23.11.26	Mit 09.12.26
91	Abschnitt 1 Einbau Kabelkanäle TGA	1 W	Mit 09.12.26	Mit 16.12.26
92	Abschnitt 1 Anschluss + Steuerung Sonnenschutz TGA	1 W	Mit 16.12.26	Mit 06.01.27
93	Abschnitt 1 Staubschutz ausbauen	2 t	Mit 06.01.27	Fre 08.01.27
94	Abschnitt 1 Endreinigung	3 t	Fre 08.01.27	Mit 13.01.27
95	Abnahmen und Inbetriebnahme	5 t	Mit 13.01.27	Mit 20.01.27
96	Abschnitt 1 Fertigstellung Bauausführung	0 t	Mit 20.01.27	Mit 20.01.27
97	**Start Bauausführung Abschnitt 1 UG (im Plan blau)**	0 t	Fre 06.11.26	Fre 06.11.26
98	Abschnitt 1 Ausbau Gitter Außenseite	1,5 W	Mon 16.11.26	Mit 25.11.26
99	Abschnitt 1 Lackierung Fenster Außenseite	2 W	Mit 25.11.26	Mit 09.12.26
100	Abschnitt 1 Lackierung Gitter	1 W	Mit 09.12.26	Mit 16.12.26
101	Abschnitt 1 Einbau Gitter Außenseite	1,5 W	Mit 16.12.26	Fre 08.01.27
102	Abschnitt 2 Abbau Gerüst	3 t	Mon 11.01.27	Mit 13.01.27
103	Abschnitt 2 Abbau Bauzaun	2 t	Don 14.01.27	Fre 15.01.27
104	Abschnitt 1 UG Fertigstellung Bauausführung	0 t	Fre 15.01.27	Fre 15.01.27
105	**Start Bauausführung Abschnitt 2 EG (im Plan orange)**	0 t	Don 21.01.27	Don 21.01.27
106	Abschnitt 2 keine Nutzung der Räume EG	61 t	Mit 20.01.27	Don 15.04.27
107	Abschnitt 2 Bauzaun aufstellen	2 t	Mit 20.01.27	Fre 22.01.27
108	Abschnitt 2 Gerüst aufbauen	3 t	Fre 22.01.27	Mit 27.01.27
109	Abschnitt 2 Medien freischalten TGA	3 t	Mit 20.01.27	Mon 25.01.27
110	Abschnitt 2 Staubschutz errichten	3 t	Don 21.01.27	Die 26.01.27
111	Abschnitt 2 Rückbau Kabelkanäle TGA	6 t	Mon 25.01.27	Die 02.02.27
112	Abschnitt 2 Ausbau Fenster, Gitter, Sonnenschutz	1,5 W	Die 02.02.27	Don 11.02.27
113	Abschnitt 2 Einbau neuer Fenster	2 W	Die 02.02.27	Die 16.02.27
114	Abschnitt 2 Einbau Fensterbänke innen + aussen	1 W	Die 16.02.27	Die 23.02.27
115	Abschnitt 2 Einbau neuer Sonnenschutz, alte Gitter	1,5 W	Die 23.02.27	Don 04.03.27
116	Abschnitt 2 Decken und Wände anarbeiten	2 W	Die 23.02.27	Die 09.03.27
117	Abschnitt 2 Malerarbeiten	2,5 W	Die 02.03.27	Don 18.03.27
118	Abschnitt 2 Einbau Kabelkanäle TGA	1 W	Fre 19.03.27	Don 25.03.27
119	Abschnitt 2 Anschluss + Steuerung Sonnenschutz TGA	1 W	Fre 26.03.27	Don 01.04.27
120	Abschnitt 2 Staubschutz ausbauen	2 t	Fre 02.04.27	Mon 05.04.27
121	Abschnitt 2 Endreinigung	3 t	Die 06.04.27	Don 08.04.27
122	Abnahmen und Inbetriebnahme	1 W	Fre 09.04.27	Don 15.04.27
123	Abschnitt 2 Fertigstellung Bauausführung EG	0 t	Don 15.04.27	Don 15.04.27
124	**Start Bauausführung Abschnitt 2 UG (im Plan orange)**	0 t	Don 15.04.27	Don 15.04.27
125	Abschnitt 2 keine Nutzung der Räume UG	62 t	Fre 16.04.27	Mon 12.07.27
126	Abschnitt 2 Medien freischalten TGA	3 t	Fre 16.04.27	Die 20.04.27
127	Abschnitt 2 Staubschutz errichten	3 t	Fre 16.04.27	Die 20.04.27
128	Abschnitt 2 Rückbau Kabelkanäle TGA	6 t	Mit 21.04.27	Mit 28.04.27
129	Abschnitt 2 Ausbau Fenster, Gitter, Sonnenschutz	1,5 W	Don 29.04.27	Mon 10.05.27
130	Abschnitt 2 Einbau neuer Fenster	2 W	Don 29.04.27	Mit 12.05.27
131	Abschnitt 2 Einbau Fensterbänke innen + aussen	1 W	Don 13.05.27	Mit 19.05.27
132	Abschnitt 2 Einbau neuer Sonnenschutz, alte Gitter	1,5 W	Don 20.05.27	Mon 31.05.27
133	Abschnitt 2 Decken und Wände anarbeiten	2 W	Don 20.05.27	Mit 02.06.27
134	Abschnitt 2 Malerarbeiten	2,5 W	Don 27.05.27	Mon 14.06.27
135	Abschnitt 2 Einbau Kabelkanäle TGA	1 W	Mon 14.06.27	Mon 21.06.27
136	Abschnitt 2 Anschluss + Steuerung Sonnenschutz TGA	1 W	Mon 21.06.27	Mon 28.06.27
137	Abschnitt 2 Staubschutz ausbauen	2 t	Mon 28.06.27	Mit 30.06.27
138	Abschnitt 2 Abbau Gerüst	3 t	Mon 28.06.27	Don 01.07.27
139	Abschnitt 2 Abbau Bauzaun	2 t	Don 01.07.27	Mon 05.07.27
140	Abschnitt 2 Endreinigung	3 t	Mit 30.06.27	Mon 05.07.27
141	Abnahmen und Inbetriebnahme	1 W	Mon 05.07.27	Mon 12.07.27
142	Abschnitt 2 Fertigstellung Bauausführung UG	0 t	Mon 12.07.27	Mon 12.07.27
143	**Start Bauausführung Abschnitt 3 EG (im Plan grün)**	0 t	Die 13.07.27	Die 13.07.27
144	Abschnitt 3 keine Nutzung der Räume	77 t	Mon 12.07.27	Mit 27.10.27
145	Abschnitt 3 Gerüst aufbauen	3 t	Mon 12.07.27	Don 15.07.27
146	Abschnitt 3 Medien freischalten TGA	3 t	Mon 12.07.27	Don 15.07.27
147	Abschnitt 3 Staubschutz errichten	3 t	Die 13.07.27	Fre 16.07.27
148	Abschnitt 3 Rückbau Kabelkanäle TGA	6 t	Don 15.07.27	Fre 23.07.27
149	Abschnitt 3 Ausbau Fenster, Gitter, Sonnenschutz	3 W	Fre 23.07.27	Fre 13.08.27
150	Abschnitt 3 Einbau neuer Fenster	3,5 W	Fre 23.07.27	Die 17.08.27
151	Abschnitt 3 Einbau Fensterbänke innen + aussen	1 W	Mit 18.08.27	Die 24.08.27
152	Abschnitt 3 Abdichtung Hof + Kiesstreifen	1 W	Mit 25.08.27	Die 31.08.27
153	Abschnitt 3 Einbau neuer Sonnenschutz, alte Gitter	2 W	Mit 01.09.27	Die 14.09.27
154	Abschnitt 3 Decken und Wände anarbeiten	3 W	Mit 01.09.27	Die 21.09.27
155	Abschnitt 3 Malerarbeiten	3,5 W	Mit 08.09.27	Fre 01.10.27
156	Abschnitt 3 Einbau Kabelkanäle TGA	1 W	Fre 01.10.27	Fre 08.10.27
157	Abschnitt 3 Anschluss + Steuerung Sonnenschutz TGA	1 W	Fre 08.10.27	Fre 15.10.27
158	Abschnitt 3 Endreinigung	3 t	Fre 15.10.27	Mit 20.10.27
159	Abnahmen und Inbetriebnahme	1 W	Mit 20.10.27	Mit 27.10.27
160	Abschnitt 3 Fertigstellung Bauausführung EG	0 t	Mit 27.10.27	Mit 27.10.27
161	**Start Bauausführung Abschnitt 3 UG (im Plan grün)**	0 t	Mit 27.10.27	Mit 27.10.27
162	Abschnitt 3 keine Nutzung der Räume	60 t	Mit 27.10.27	Mit 02.02.28
163	Abschnitt 3 Medien freischalten TGA	3 t	Mit 27.10.27	Mon 01.11.27
164	Abschnitt 3 Staubschutz errichten	3 t	Mit 27.10.27	Mon 01.11.27
165	Abschnitt 3 Rückbau Kabelkanäle TGA	6 t	Mon 01.11.27	Die 09.11.27
166	Abschnitt 3 Ausbau Fenster, Gitter, Sonnenschutz	2 W	Die 09.11.27	Die 23.11.27
167	Abschnitt 3 Einbau neuer Fenster	2,5 W	Die 09.11.27	Don 25.11.27
168	Abschnitt 3 Einbau Fensterbänke innen + aussen	1 W	Fre 26.11.27	Don 02.12.27
169	Abschnitt 3 Einbau neuer Sonnenschutz	1 W	Fre 03.12.27	Don 09.12.27
170	Abschnitt 3 Decken und Wände anarbeiten	2 W	Fre 03.12.27	Don 16.12.27
171	Abschnitt 3 Malerarbeiten	2,5 W	Fre 03.12.27	Die 04.01.28
172	Abschnitt 3 Einbau Kabelkanäle TGA	1 W	Die 04.01.28	Die 11.01.28
173	Abschnitt 3 Anschluss + Steuerung Sonnenschutz TGA	1 W	Die 11.01.28	Die 18.01.28
174	Abschnitt 3 Staubschutz ausbauen	3 t	Die 18.01.28	Fre 21.01.28
175	Abschnitt 3 Abbau Gerüst	3 t	Die 18.01.28	Fre 21.01.28
176	Abschnitt 3 Endreinigung	3 t	Fre 21.01.28	Mit 26.01.28
177	Abnahmen und Inbetriebnahme	1 W	Mit 26.01.28	Mit 02.02.28
178	Abschnitt 3 Fertigstellung Bauausführung UG	0 t	Mit 02.02.28	Mit 02.02.28
179	**Einzelmaßnahmen**	**258 t**	**Mon 24.05.27**	**Mit 31.05.28**
180	Sanierung barrierefreies WC Erdgeschoss	8 W	Mon 24.05.27	Fre 16.07.27
181	Sanierung WC Untergeschoss	8 W	Mon 24.05.27	Fre 16.07.27
182	Abtrennung Westflügel Türanlage			
183	Sanierung Rotunde	12 W	Mon 24.05.27	Fre 13.08.27
184	Neue Tür und Treppe Verbindungsgang EG Kubus zu Verwaltung	10 W	Mon 12.07.27	Fre 17.09.27
185	Sanierung Verbindungsgang EG Kubus zu Westflügel	10 W	Mon 12.07.27	Fre 17.09.27
186	Windfang Haupteingang			
187	Freianlagen	66 t	Mit 01.03.28	Mit 31.05.28
188	Installation von Kunst am Bau	66 t	Mit 01.03.28	Mit 31.05.28
189	Fertigstellung Einzelmaßnahmen + Freianlagen	0 t	Mit 31.05.28	Mit 31.05.28
190	**Maßnahmen im Kubus**	**75 t**	**Mon 03.04.28**	**Fre 14.07.28**
191	Neue Innentürelemente im Kubus	12 W	Mon 03.04.28	Fre 23.06.28
192	Sicherheitsbeleuchtung + Brandmeldeanlage Kubus	15 W	Mon 03.04.28	Fre 14.07.28
193	Fertigstellung Kubus	0 t	Fre 14.07.28	Fre 14.07.28
