Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**LPH 2**	**49 Tage?**	**Don 21.11.24**	**Fre 31.01.25**
6	Prüfung LPH2	5 Tage	Mon 03.02.25	Fre 07.02.25
7	Einarbeiten	5 Tage	Mon 10.02.25	Fre 14.02.25
8	**LPH 3**	**48 Tage**	**Mon 17.02.25**	**Fre 25.04.25**
10	Prüfung LPH 3	5 Tage	Mon 28.04.25	Mon 05.05.25
11	Einarbeiten LPH 3	5 Tage	Mon 05.05.25	Fre 09.05.25
12	**LPH 4**	**44 Tage**	**Mon 12.05.25**	**Die 15.07.25**
15	**LPH 5**	**74 Tage?**	**Mon 09.06.25**	**Fre 19.09.25**
17	**Bemusterungstermin**	2 Tage	Mon 29.09.25	Die 30.09.25
18	**LPH 6 Bodenplatte**	**5 Tage?**	**Mon 22.09.25**	**Fre 26.09.25**
20	Prüfung LPH6	5 Tage	Mon 29.09.25	Fre 03.10.25
21	Einarbeiten LPH6	5 Tage	Mon 06.10.25	Fre 10.10.25
22	Vergabestelle	2 Tage	Don 16.10.25	Fre 17.10.25
23	**LPH 6**	**54 Tage**	**Mon 08.09.25**	**Fre 21.11.25**
25	Prüfung LPH 6	6 Tage	Mon 24.11.25	Mon 01.12.25
26	Einarbeiten LPH6	6 Tage	Mon 24.11.25	Mon 01.12.25
27	Vergabestelle	3 Tage	Die 02.12.25	Don 04.12.25
28	**LPH 7 Bodenplatte**	**37 Tage**	**Mon 22.12.25**	**Fre 13.02.26**
38	**LPH7**	**57 Tage**	**Fre 05.12.25**	**Don 26.02.26**
48	**LPH 8**	**207 Tage?**	**Mon 16.02.26**	**Mit 09.12.26**
49	**Bodenplatte**	**66 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Fre 22.05.26**
50	Vorlauf Bodenplatte	5 Tage	Mon 16.02.26	Fre 20.02.26
51	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 23.02.26	Fre 27.02.26
52	Einmessen Baustelle	1 Tag	Don 19.02.26	Don 19.02.26
53	Erdarbeiten	2 Tage	Mon 02.03.26	Die 03.03.26
54	Grundleitungen unter BoPla	8 Tage	Mit 04.03.26	Fre 13.03.26
55	Blitzschutz Ringerder verlegen	2 Tage	Mon 16.03.26	Die 17.03.26
56	Schaumglasschotter einbringen	5 Tage	Mit 18.03.26	Die 24.03.26
57	Schalung stellen und Bewährung legen	5 Tage	Mit 25.03.26	Die 31.03.26
58	Blitzschutz in Bodenplatte	2 Tage	Mit 01.04.26	Don 02.04.26
59	Bodenplatte gießen	4 Tage	Mon 06.04.26	Fre 10.04.26
60	Bodenplatte abbinden	23 Tage	Mon 13.04.26	Fre 15.05.26
61	Herstellung Sockelaufkantung	9 Tage	Mon 20.04.26	Don 30.04.26
62	Sockel abdichten und dämmen	9 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26
63	Hinterfüllen, Sockeldämmung schützen	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26
64	**Fertigstellung Paket Bodenplatte**	0 Tage	Fre 22.05.26	Fre 22.05.26
65	**Holzbau**	**79 Tage**	**Mon 16.02.26**	**Fre 12.06.26**
66	Vorlauf HMB	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26
67	HMB Werkplanung	28 Tage	Mon 02.03.26	Fre 10.04.26
68	Holzmassivbau Vorfertigung	26 Tage	Mon 13.04.26	Mit 20.05.26
69	Holzmassivbau stellen	14 Tage	Mon 25.05.26	Fre 12.06.26
70	**Fertigstellung Holzbau**	**0 Tage**	**Fre 12.06.26**	**Fre 12.06.26**
71	Gerüst stellen	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26
72	**Fenster und Türen**	**69 Tage**	**Mon 30.03.26**	**Fre 10.07.26**
73	Herstellung Stahlprofile	27 Tage	Mon 11.05.26	Fre 19.06.26
74	Fassade Profilglas	15 Tage	Mon 22.06.26	Fre 10.07.26
75	Entwicklung Zargenprofile	22 Tage	Mon 30.03.26	Don 30.04.26
76	Vorfertigung Fen. U. Tü.	31 Tage	Mon 04.05.26	Don 18.06.26
77	Fassade Fenster und Türen	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26
78	**Luftdichtigkeitsmessung Holzbau**	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26
79	**Dämmarbeiten**	**30 Tage**	**Mon 22.06.26**	**Fre 31.07.26**
80	Dämmarbeiten Dach + Abdichtungsbahn	9 Tage	Mon 22.06.26	Don 02.07.26
81	Dämmarbeiten Fassade + Abdichtungsbahn	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26
82	**Dacharbeiten**	**15 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 24.07.26**
83	Dachbelag mit Schalung u. UK	15 Tage	Mon 06.07.26	Fre 24.07.26
84	Regenrinne und- rohr	10 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26
85	**Abschluss Dacharbeiten**	0 Tage	Fre 24.07.26	Fre 24.07.26
86	**Fassadenarbeiten**	**45 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 02.10.26**
87	Sockelverkleidung	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
88	Holzfassade anbringen	20 Tage	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26
89	Vorfertigung Sitznischen	15 Tage	Mon 17.08.26	Fre 04.09.26
90	Sitznischen Ausbau	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
91	Abbau Gerüst	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
92	Fassadenrinne	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
93	**Abschluss Fassadenarbeiten**	0 Tage	Fre 02.10.26	Fre 02.10.26
94	**Innenausbau**	**115 Tage?**	**Mon 15.06.26**	**Fre 20.11.26**
95	Vorwandinstallationen	9 Tage	Mon 15.06.26	Don 25.06.26
96	Estrich in Außenschränken herstellen	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26
97	Podest unter Lüftungsgerät herstellen	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26
98	Vorwände schließen	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
99	Estricharbeiten (oder mit Beschleuniger!)	40 Tage?	Mon 27.07.26	Fre 18.09.26
100	Kautschuk Boden	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
101	Kautschuk Sockelbereich	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
102	Fliesenarbeiten	20 Tage	Mon 21.09.26	Fre 16.10.26
103	Vorfertigung Einbauten Tischler	35 Tage	Mon 24.08.26	Fre 09.10.26
104	Toilettenkabienen	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26
105	Innentüren und - Fenster	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26
106	Einbauten Tischler	30 Tage	Mon 12.10.26	Fre 20.11.26
107	**TGA**	**110 Tage**	**Mon 29.06.26**	**Fre 27.11.26**
108	Abwasserinstallationen	9 Tage	Mon 29.06.26	Don 09.07.26
109	Rohmontage Trinkwasser	9 Tage	Mon 29.06.26	Don 09.07.26
110	Rohmontage Heizung	9 Tage	Mon 29.06.26	Don 09.07.26
111	Fußbodenheizung	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
112	Montage Lüftung	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
113	Rohmontage Elektro	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
114	Montage PV	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26
115	Blitzschutz	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
116	Endmontage Sanitär	15 Tage	Mon 02.11.26	Fre 20.11.26
117	Endmontage Elektro	15 Tage	Mon 02.11.26	Fre 20.11.26
118	Endmontage / Einregulierung Lüftung	10 Tage	Mon 16.11.26	Fre 27.11.26
119	**Luftdichtigkeitsmessung GEG**	0 Tage	Mon 30.11.26	Mon 30.11.26
120	***Abnahmen***	4 Tage	Die 01.12.26	Fre 04.12.26
121	**Alle Arbeiten und Abnahmen abgeschlossen**	0 Tage	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26
122				
123				VORABZUG

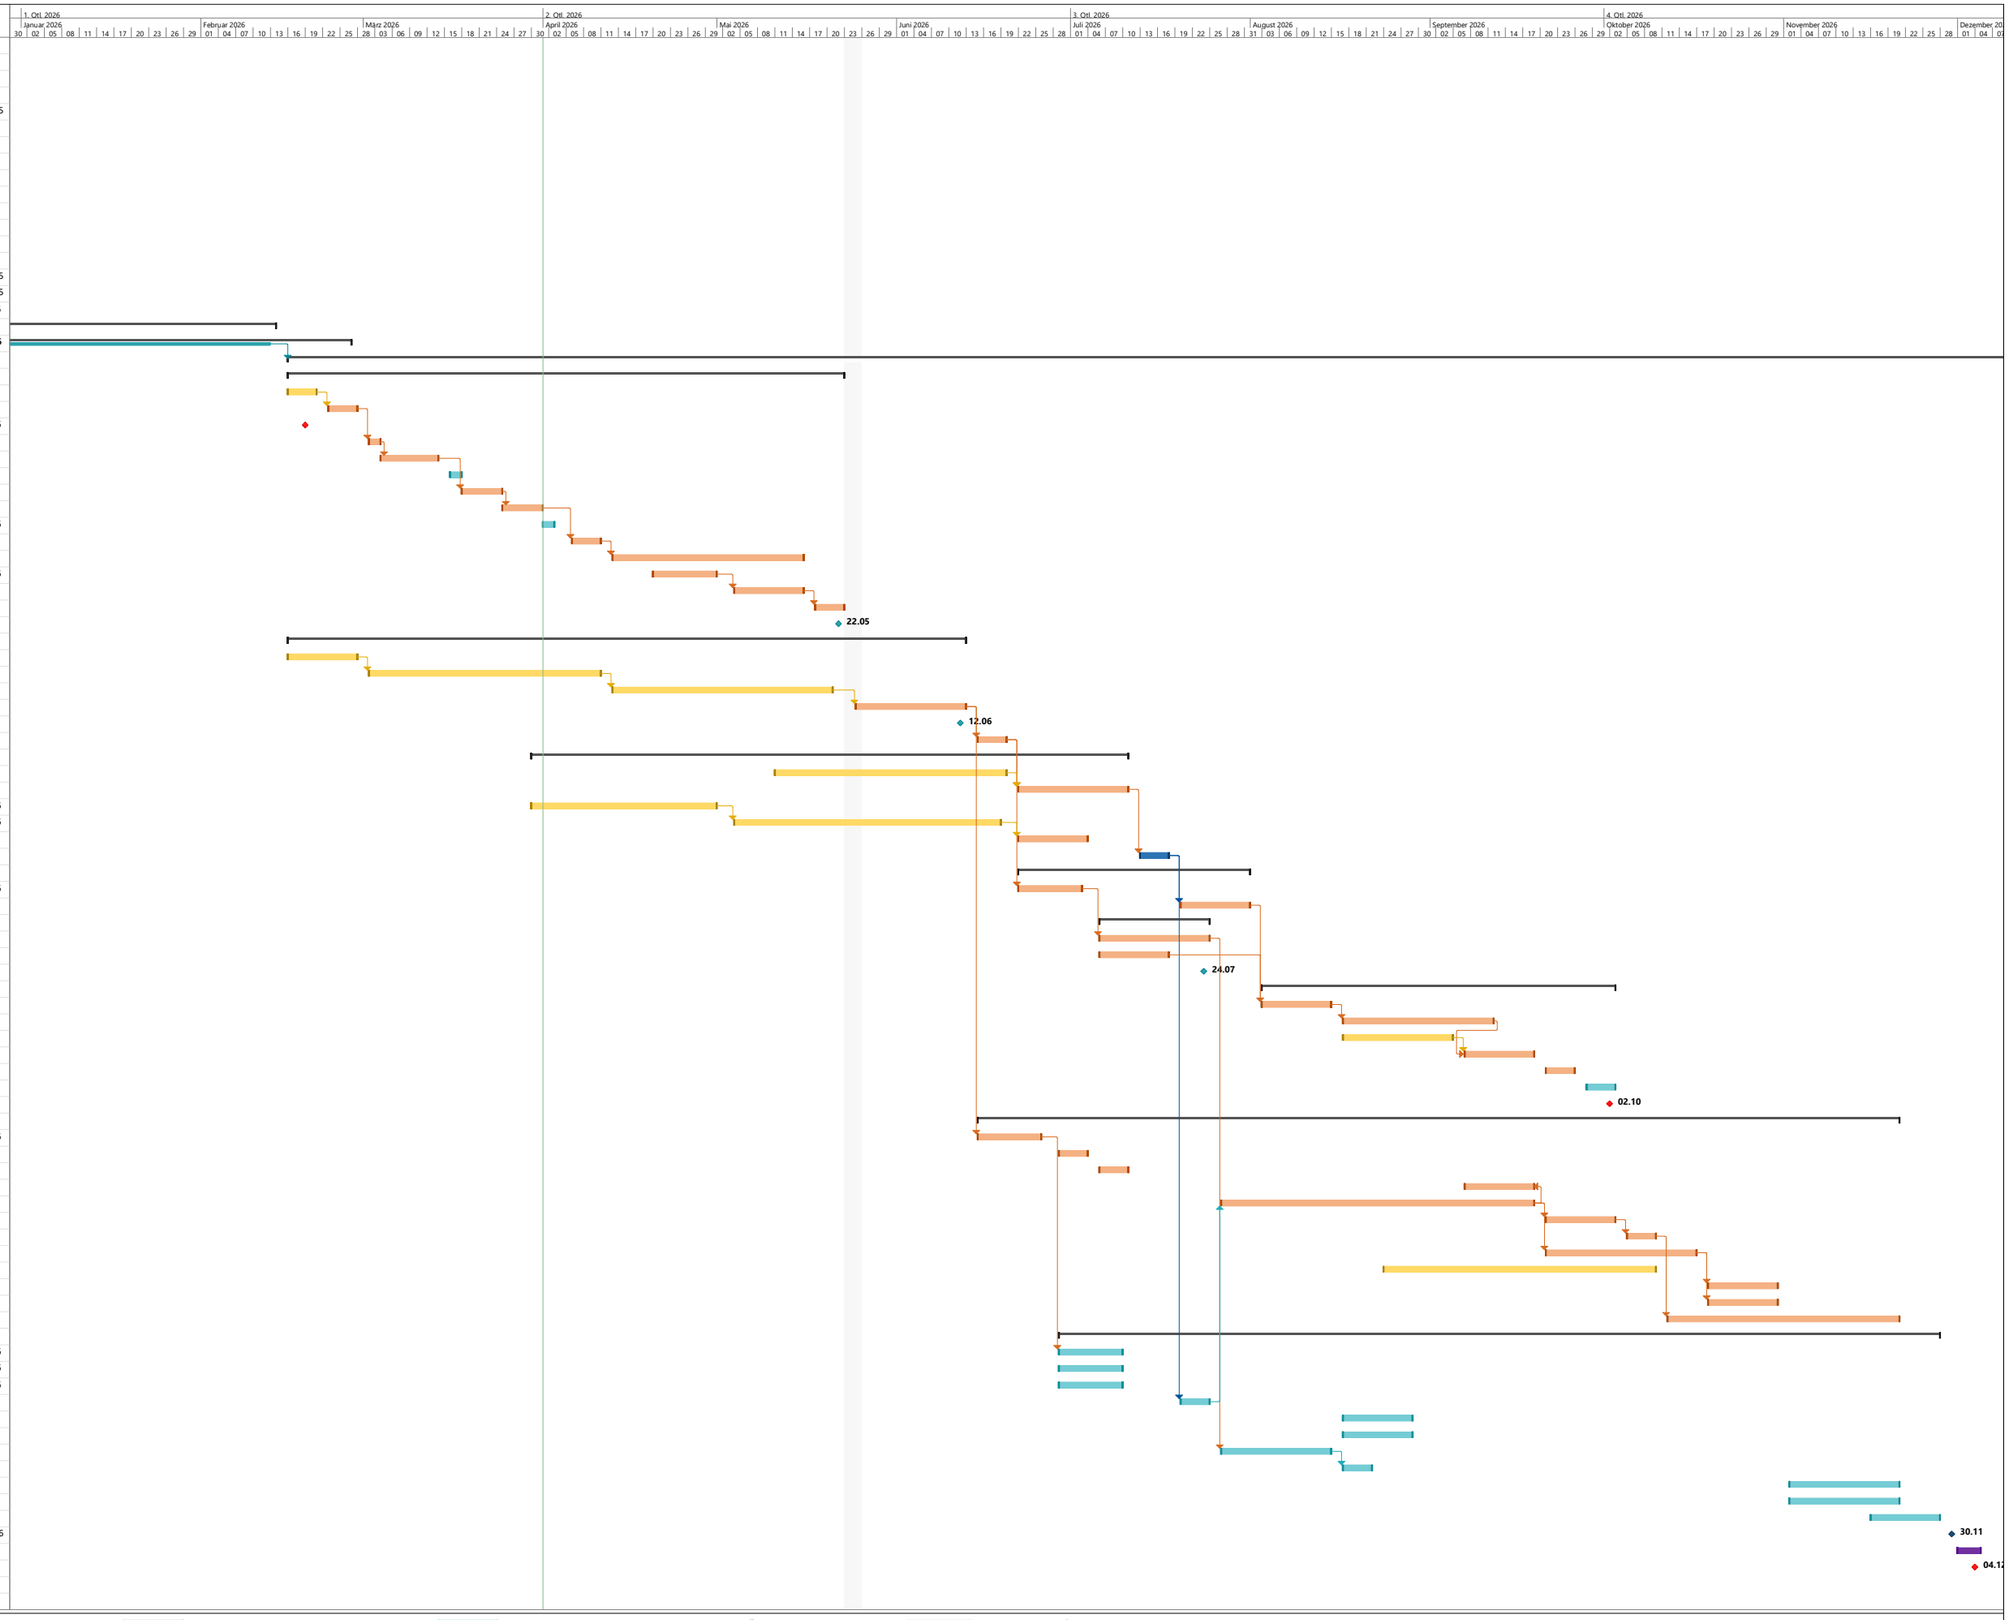

Project: Sportpavillion LGS 2027
Date: Mit 01.04.26

Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · External Tasks · External Milestone · Deadline · Progress · Manual Progress
