ASZ Heidelberg

Rahmenterminplan

20-kV-Mittelspannungsnetz für den Zentralbetriebshof der ASZ

CONSULECTRA
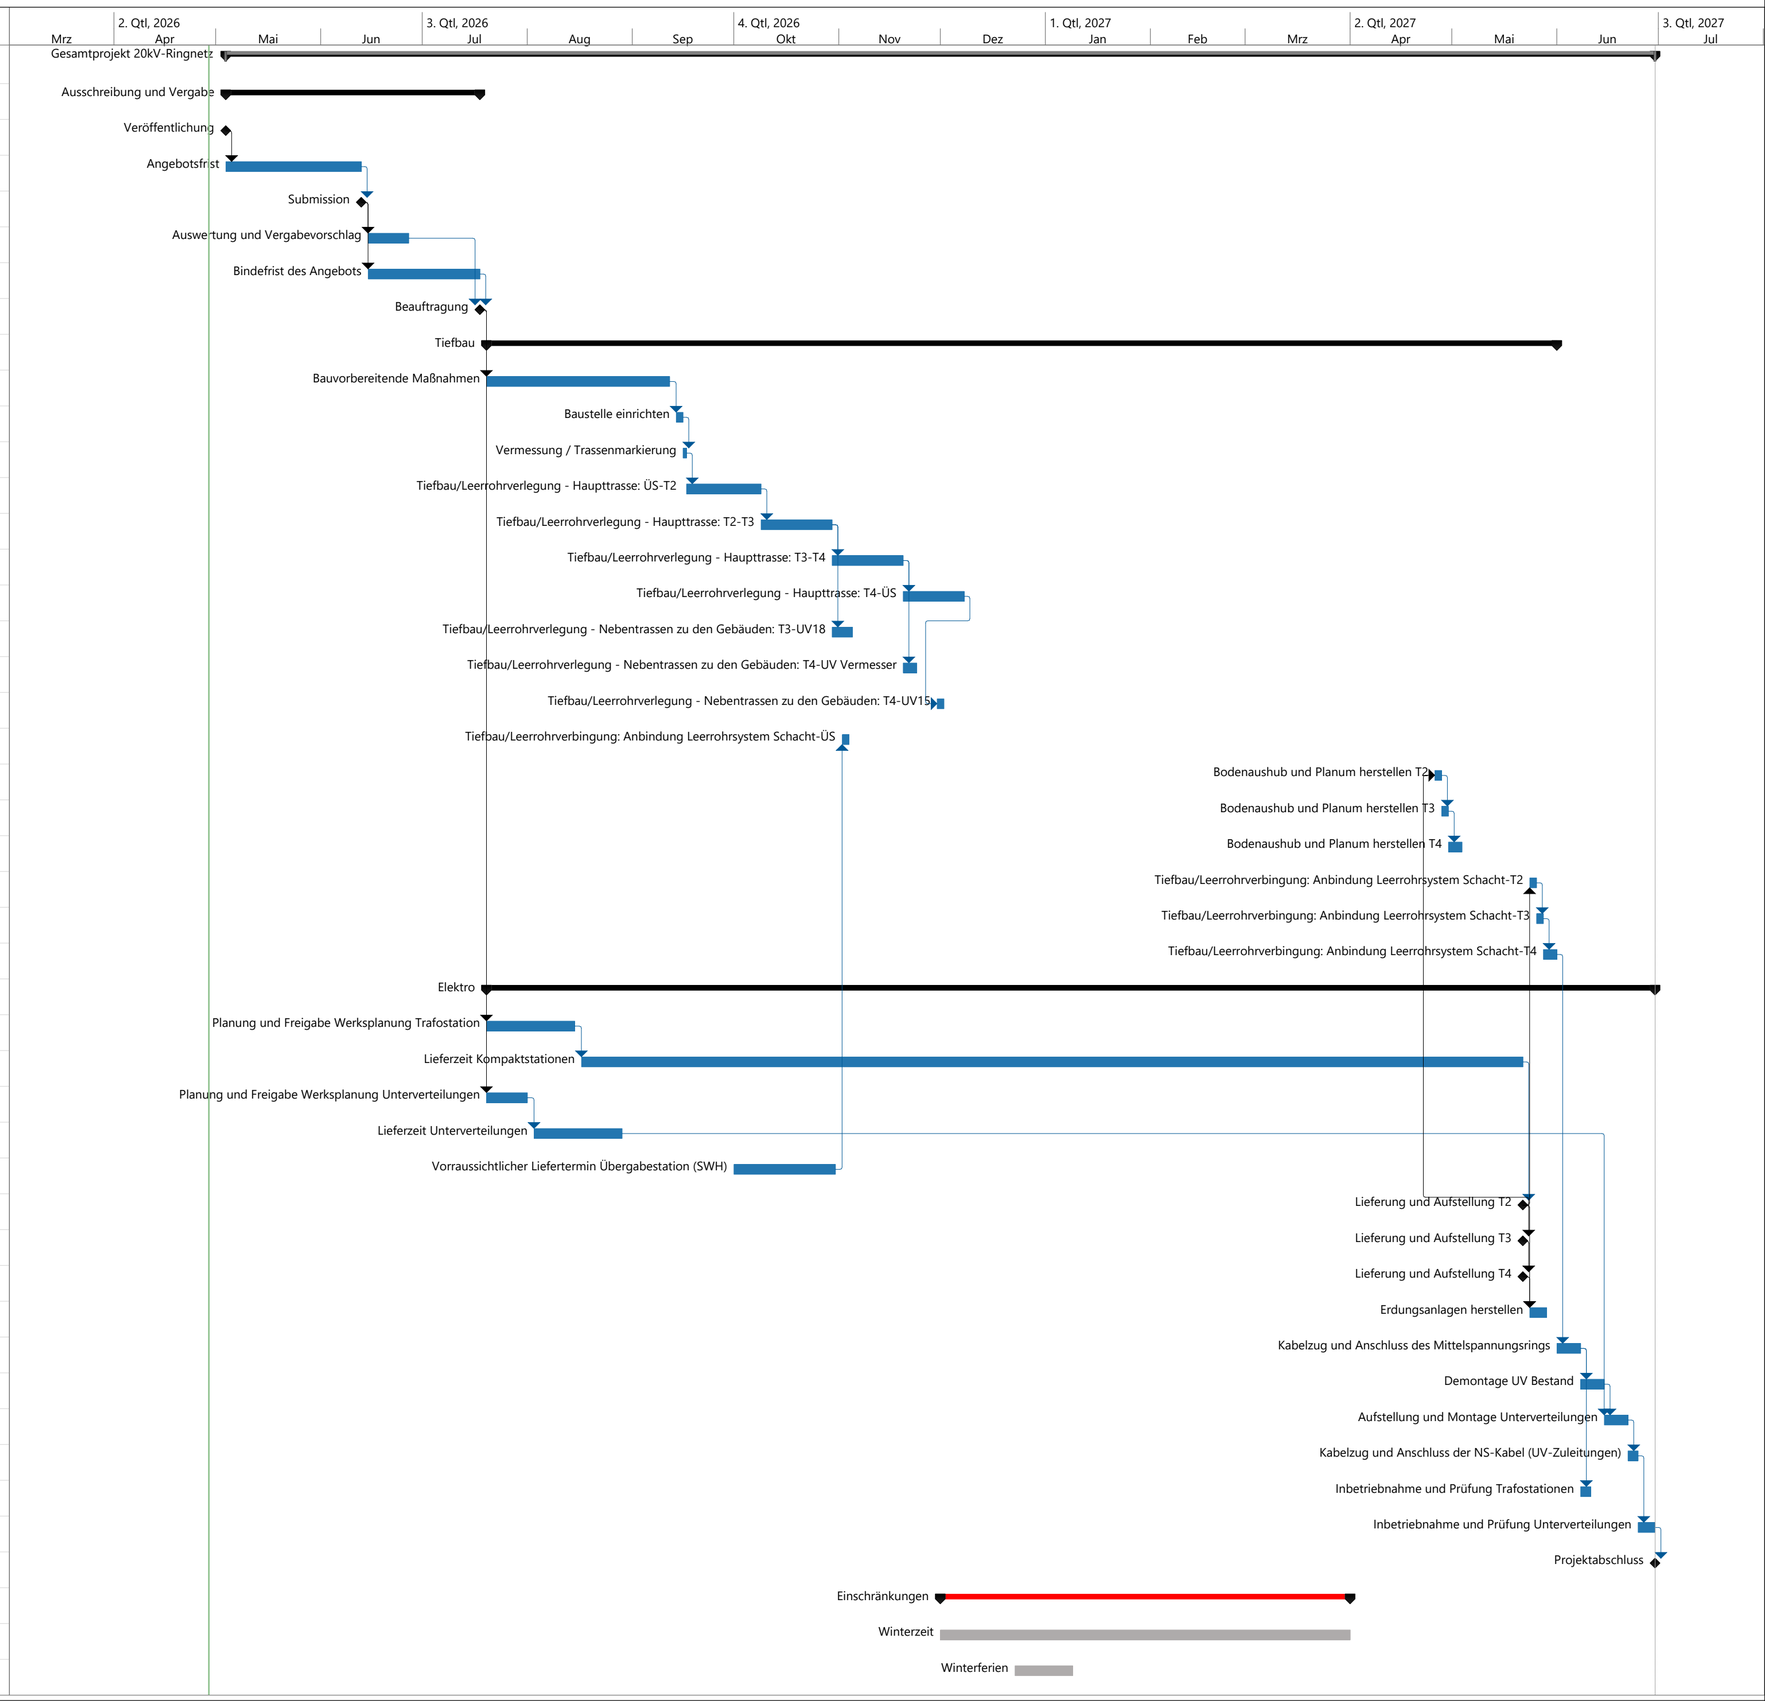
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
0	**Gesamtprojekt 20kV-Ringnetz**	**302 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Die 29.06.27**
1	**1 Ausschreibung und Vergabe**	**55 Tage**	**Mon 04.05.26**	**Fre 17.07.26**
2	1.1 Veröffentlichung	0 Tage	Mon 04.05.26	Mon 04.05.26
3	1.2 Angebotsfrist	30 Tage	Mon 04.05.26	Fre 12.06.26
4	1.3 Submission	0 Tage	Fre 12.06.26	Fre 12.06.26
5	1.4 Auswertung und Vergabevorschlag	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26
6	1.5 Bindefrist des Angebots	25 Tage	Mon 15.06.26	Fre 17.07.26
7	1.6 Beauftragung	0 Tage	Fre 17.07.26	Fre 17.07.26
8	**2 Tiefbau**	**226 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Mon 31.05.27**
9	2.1 Bauvorbereitende Maßnahmen	40 Tage	Mon 20.07.26	Fre 11.09.26
10	2.2 Baustelle einrichten	2 Tage	Mon 14.09.26	Die 15.09.26
11	2.3 Vermessung / Trassenmarkierung	1 Tag	Mit 16.09.26	Mit 16.09.26
12	2.4 Tiefbau/Leerrohrverlegung - Haupttrasse: ÜS-T2	16 Tage	Don 17.09.26	Don 08.10.26
13	2.5 Tiefbau/Leerrohrverlegung - Haupttrasse: T2-T3	15 Tage	Fre 09.10.26	Don 29.10.26
14	2.6 Tiefbau/Leerrohrverlegung - Haupttrasse: T3-T4	15 Tage	Fre 30.10.26	Don 19.11.26
15	2.7 Tiefbau/Leerrohrverlegung - Haupttrasse: T4-ÜS	12 Tage	Fre 20.11.26	Mon 07.12.26
16	2.8 Tiefbau/Leerrohrverlegung - Nebentrassen zu den Gebäuden: T3-UV18	4 Tage	Fre 30.10.26	Mit 04.11.26
17	2.9 Tiefbau/Leerrohrverlegung - Nebentrassen zu den Gebäuden: T4-UV V	2 Tage	Fre 20.11.26	Mon 23.11.26
18	2.10 Tiefbau/Leerrohrverlegung - Nebentrassen zu den Gebäuden: T4-UV1	2 Tage	Mon 30.11.26	Die 01.12.26
19	2.11 Tiefbau/Leerrohrverbingung: Anbindung Leerrohrsystem Schacht-ÜS	2 Tage	Mon 02.11.26	Die 03.11.26
20	2.12 Bodenaushub und Planum herstellen T2	2 Tage	Mon 26.04.27	Die 27.04.27
21	2.13 Bodenaushub und Planum herstellen T3	2 Tage	Mit 28.04.27	Don 29.04.27
22	2.14 Bodenaushub und Planum herstellen T4	2 Tage	Fre 30.04.27	Mon 03.05.27
23	2.15 Tiefbau/Leerrohrverbingung: Anbindung Leerrohrsystem Schacht-T2	2 Tage	Mon 24.05.27	Die 25.05.27
24	2.16 Tiefbau/Leerrohrverbingung: Anbindung Leerrohrsystem Schacht-T3	2 Tage	Mit 26.05.27	Don 27.05.27
25	2.17 Tiefbau/Leerrohrverbingung: Anbindung Leerrohrsystem Schacht-T4	2 Tage	Fre 28.05.27	Mon 31.05.27
26	**3 Elektro**	**247 Tage**	**Mon 20.07.26**	**Die 29.06.27**
27	3.1 Planung und Freigabe Werksplanung Trafostation	20 Tage	Mon 20.07.26	Fre 14.08.26
28	3.2 Lieferzeit Kompaktstationen	200 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.05.27
29	3.3 Planung und Freigabe Werksplanung Unterverteilungen	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26
30	3.4 Lieferzeit Unterverteilungen	20 Tage	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26
31	3.5 Vorraussichtlicher Liefertermin Übergabestation (SWH)	22 Tage	Don 01.10.26	Fre 30.10.26
32	3.6 Lieferung und Aufstellung T2	0 Tage	Fre 21.05.27	Fre 21.05.27
33	3.7 Lieferung und Aufstellung T3	0 Tage	Fre 21.05.27	Fre 21.05.27
34	3.8 Lieferung und Aufstellung T4	0 Tage	Fre 21.05.27	Fre 21.05.27
35	3.9 Erdungsanlagen herstellen	5 Tage	Mon 24.05.27	Fre 28.05.27
36	3.10 Kabelzug und Anschluss des Mittelspannungsrings	5 Tage	Die 01.06.27	Mon 07.06.27
37	3.11 Demontage UV Bestand	5 Tage	Die 08.06.27	Mon 14.06.27
38	3.12 Aufstellung und Montage Unterverteilungen	5 Tage	Die 15.06.27	Mon 21.06.27
39	3.13 Kabelzug und Anschluss der NS-Kabel (UV-Zuleitungen)	3 Tage	Die 22.06.27	Don 24.06.27
40	3.14 Inbetriebnahme und Prüfung Trafostationen	3 Tage	Die 08.06.27	Don 10.06.27
41	3.15 Inbetriebnahme und Prüfung Unterverteilungen	3 Tage	Fre 25.06.27	Die 29.06.27
42	3.16 Projektabschluss	0 Tage	Die 29.06.27	Die 29.06.27
43	**4 Einschränkungen**	**87 Tage**	**Die 01.12.26**	**Mit 31.03.27**
44	4.1 Winterzeit	87 Tage	Die 01.12.26	Mit 31.03.27
45	4.2 Winterferien	13 Tage	Mit 23.12.26	Fre 08.01.27
