Rahmenterminplan HLSE - Ausschreibung / Vergabe

2501 Generalsanierung Albert-Schweitzer-Schule, Parkstraße 9, 69168 Wiesloch
Schulverband Albert-Schweitzer-Schule, marktstraße 13, 69168 Wiesloch

Nr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1				
2	**1 Abbruch- und Rohbauarbeiten**	**136 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Mon 03.05.27**
3	1.1 Ausräumen der Schule	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26
4	1.2 Medientrennung	2 Tage	Mon 02.11.26	Die 03.11.26
5	1.3 Erdarbeiten	28 Tage	Mit 04.11.26	Fre 11.12.26
6	1.4 Gerüst stellen	5 Tage	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26
7	1.5 Abbrucharbeiten	61 Tage	Mon 09.11.26	Mon 01.02.27
8	1.6 Abbrucharbeiten HLSE	33 Tage	Mit 09.12.26	Fre 22.01.27
9	1.7 Rohbauarbeiten	40 Tage	Mon 11.01.27	Fre 05.03.27
10	1.8 Dacharbeiten	65 Tage	Die 02.02.27	Mon 03.05.27
11	1.9 Fassadenarbeiten	45 Tage	Mon 22.02.27	Fre 23.04.27
12	1.10 Fensterarbeiten	45 Tage	Mon 22.02.27	Fre 23.04.27
13				
14	**2 Ausbauarbeiten**	**190 Tage**	**Mon 19.04.27**	**Fre 07.01.28**
15	2.1 Trockenbau	75 Tage	Mon 19.04.27	Fre 30.07.27
16	2.2 Estricharbeiten	18 Tage	Mon 21.06.27	Mit 14.07.27
17	2.3 Fliesenarbeiten	30 Tage	Mon 12.07.27	Fre 20.08.27
18	2.4 Bodenbelagsarbeiten	35 Tage	Mon 09.08.27	Fre 24.09.27
19	2.5 Maler- und Lackierarbeiten	50 Tage	Mon 06.09.27	Fre 12.11.27
20	2.6 Fensterbankarbeiten	20 Tage	Mon 30.08.27	Fre 24.09.27
21	2.7 Sanitärtrennwände	10 Tage	Mon 23.08.27	Fre 03.09.27
22	2.8 Reinigungsarbeiten	10 Tage	Mon 15.11.27	Fre 26.11.27
23	2.9 Möbel	30 Tage	Mon 29.11.27	Fre 07.01.28
24				
25	**3 Heizung**	**295 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 17.12.27**
26	3.1 Medientrennung und Demontagearbeiten	25 Tage	Mon 02.11.26	Fre 04.12.26
27	3.2 Durchbrüche, Wandschlitze, Schlitze FBH	50 Tage	Mon 07.12.26	Fre 12.02.27
28	3.3 Verlegung Fußbodenheizung	20 Tage	Mon 15.02.27	Fre 12.03.27
29	3.4 Rohrleitungen	70 Tage	Mon 15.03.27	Fre 18.06.27
30	3.5 Heizkreisverteiler + Fernwärmestation	33 Tage	Mon 21.06.27	Mit 04.08.27
31	3.6 Endinstallation	45 Tage	Don 05.08.27	Mit 06.10.27
32	3.7 Einregulierung, Inbetriebnahme	52 Tage	Don 07.10.27	Fre 17.12.27
33				
34	**4 RLT**	**295 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 17.12.27**
35	4.1 Medientrennung und Demontagearbeiten	25 Tage	Mon 02.11.26	Fre 04.12.26
36	4.2 Demontage und Einlagerung Bestandsgeräte	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
37	4.3 Installation Luftkanäle und Klappen	95 Tage	Mon 11.01.27	Fre 21.05.27
38	4.4 Zentrales Lüftungsgerät	30 Tage	Mon 24.05.27	Fre 02.07.27
39	4.5 Montage Bestandsgeräte	35 Tage	Mon 05.07.27	Fre 20.08.27
40	4.6 Montage Mess- und Regeltechnik	20 Tage	Mon 23.08.27	Fre 17.09.27
41	4.7 Einregulierung, Inbetriebnahme	65 Tage	Mon 20.09.27	Fre 17.12.27
42				
43	**5 Sanitär**	**295 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 17.12.27**
44	5.1 Medientrennung und Demontagearbeiten	25 Tage	Mon 02.11.26	Fre 04.12.26
45	5.2 Dachentwässerung	30 Tage	Don 28.01.27	Mit 10.03.27
46	5.3 Grundleitungen, Durchbrüche, Wandschlitze	50 Tage	Don 14.01.27	Mit 24.03.27
47	5.4 Vorwandinstallationen	20 Tage	Don 25.03.27	Mit 21.04.27
48	5.5 Rohrleitungen	66 Tage	Don 22.04.27	Don 22.07.27
49	5.6 Wasserverteilung	20 Tage	Fre 23.07.27	Don 19.08.27
50	5.7 Wasseraufbereitung	10 Tage	Fre 20.08.27	Don 02.09.27
51	5.8 Endinstallation	40 Tage	Fre 03.09.27	Don 28.10.27
52	5.9 Einregulierung, Inbetriebnahme	36 Tage	Fre 29.10.27	Fre 17.12.27
53				
54	**6 Elektro**	**295 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 17.12.27**
55	6.1 Medientrennung und Demontagearbeiten	25 Tage	Mon 02.11.26	Fre 04.12.26
56	6.2 Leitungsverbindung zu Trafostation	26 Tage	Mon 07.12.26	Mon 11.01.27
57	6.3 Leitungsverlegung Fassadenbeleuchtung	15 Tage	Mon 22.02.27	Fre 12.03.27
58	6.4 Verlegesysteme (Trassen, Schellen, Schlitze, Durchbrüche)	45 Tage	Mon 18.01.27	Fre 19.03.27
59	6.5 Leitungsanlage	59 Tage	Mon 22.03.27	Don 10.06.27
60	6.6 Montage Brüstungskanäle	15 Tage	Fre 11.06.27	Don 01.07.27
61	6.7 Elektroverteilungen / EDV-Verteiler / Zentralbatterieanlage	20 Tage	Fre 02.07.27	Don 29.07.27
62	6.8 Montage Leuchten und Deckeneinbauten	20 Tage	Fre 30.07.27	Don 26.08.27
63	6.9 Endinstallation	30 Tage	Fre 27.08.27	Don 07.10.27
64	6.10 Programmierung, Einregulierung, Inbetriebnahme	12 Tage	Fre 08.10.27	Mon 25.10.27
65	6.11 Prüfung / Messungen	39 Tage	Die 26.10.27	Fre 17.12.27
66				
67	**7 Brandmeldeanlage**	**245 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Fre 08.10.27**
68	7.1 Medientrennung und Demontagearbeiten	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
69	7.2 Montage Rauchmelder und RAS-System Aufzug	15 Tage	Fre 27.08.27	Don 16.09.27
70	7.3 Montage FIZ / FSD /	3 Tage	Fre 17.09.27	Die 21.09.27
71	7.4 Montage Brandmeldezentrale und Übertragungseinheit	5 Tage	Mit 22.09.27	Die 28.09.27
72	7.5 Programmierung, Einregulierung, Inbetriebnahme	5 Tage	Mit 29.09.27	Die 05.10.27
73	7.6 Prüfung / Messungen	3 Tage	Mit 06.10.27	Fre 08.10.27
74				
75	**8 Blitzschutzanlage**	**273 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Mit 17.11.27**
76	8.1 Demontage Bestandsanlage Dach	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26
77	8.2 Prüfung und Messung Erdungsanlage Bestand	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
78	8.3 Anpassung Erdungsanlage	5 Tage	Mon 23.11.26	Fre 27.11.26
79	8.4 Installation Blitzschutzanlage	20 Tage	Mon 18.10.27	Fre 12.11.27
80	8.5 Prüfung / Messungen	3 Tage	Mon 15.11.27	Mit 17.11.27
81				
82	**9 Aufzugsanlage**	**30 Tage**	**Mon 06.09.27**	**Fre 15.10.27**
83	9.1 Montage Grundgerüst in Aufzugsschacht	5 Tage	Mon 06.09.27	Fre 10.09.27
84	9.2 Montage Aufzugsanlage	20 Tage	Mon 13.09.27	Fre 08.10.27
85	9.3 Programmierung, Einregulierung, Inbetriebnahme	5 Tage	Mon 11.10.27	Fre 15.10.27
86				
87	**10 Abnahmen + Übergabe**	**55 Tage**	**Mon 10.01.28**	**Fre 24.03.28**
88	10.1 Abnahmen HLS	5 Tage	Mon 10.01.28	Fre 14.01.28
89	10.2 Abnahme Elektro	5 Tage	Mon 17.01.28	Fre 21.01.28
90	10.3 Puffer / Nacharbeiten / Abnahmen	45 Tage	Mon 10.01.28	Fre 10.03.28
91	10.4 Einräumen der Schule	39 Tage	Mon 31.01.28	Don 23.03.28
92	10.5 Einzug Schule	1 Tag	Fre 24.03.28	Fre 24.03.28
93				
94	**11 Aussenbereich**	**80 Tage**	**Mon 06.12.27**	**Fre 24.03.28**
95	11.1 Aussenanlage	80 Tage	Mon 06.12.27	Fre 24.03.28
96	11.2 Stahlbauarbeiten	20 Tage	Mon 10.01.28	Fre 04.02.28
97	11.3 Bepflanzungsarbeiten	20 Tage	Mon 28.02.28	Fre 24.03.28

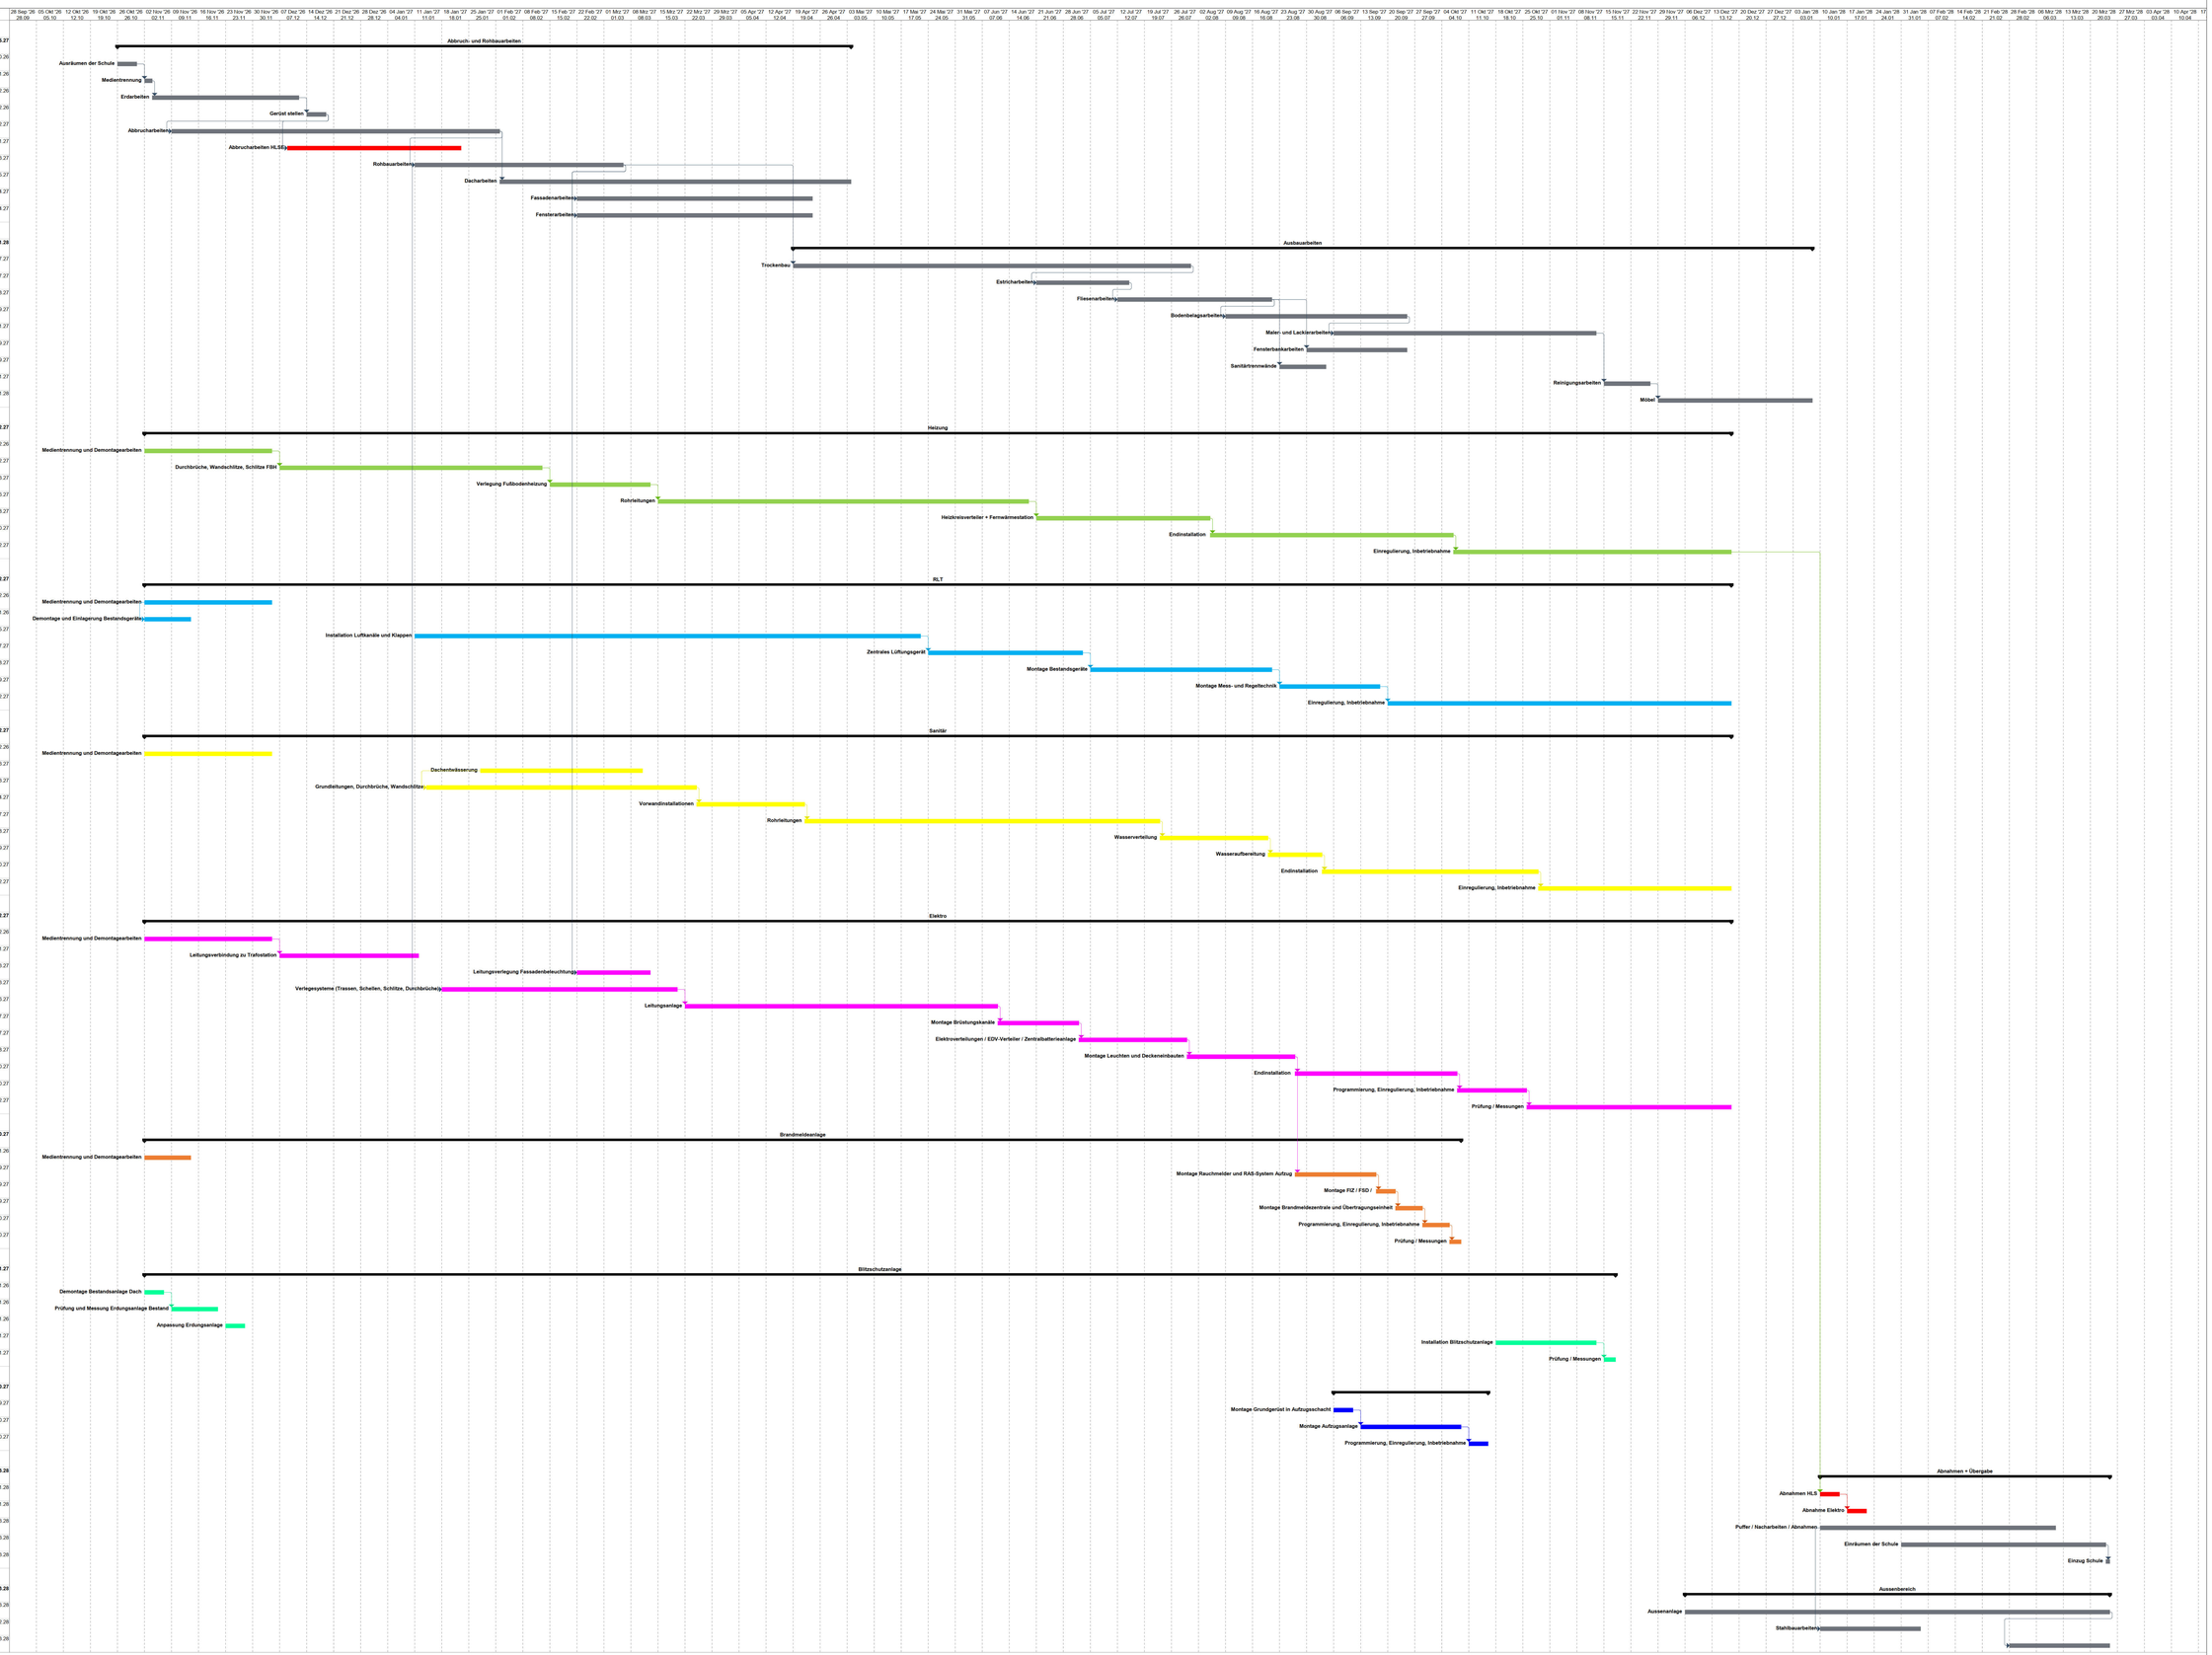

Projekt: 2501
Datum: 29.04.2026

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | In Arbeit | Stichtag

[redacted]

[redacted]
