6 BÜ Strecke 3700 - Rahmenterminplan

Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		Bahnübergänge Strecke 3700 - Änderung von Bahnübergängen	1320 Tage	Die 26.06.18	Mon 17.07.23
2		Entwurfsplanung	1320 Tage	Die 26.06.18	Mon 17.07.23
3		Erstellen Entwurfsplanung	1200 Tage	Die 26.06.18	Mon 30.01.23
5		Erstellen Fachplanungen	151 Tage	Mon 19.12.22	Mon 17.07.23
8		Prüfung/Freigabe EP (DB S&S, DB Netz)	20 Tage	Die 31.01.23	Mon 27.02.23
9		Genehmigungsplanung	849,5 Tage	Die 13.09.22	Mon 15.12.25
10		Erstellen Genehmigungsplanung	120 Tage	Die 13.09.22	Mon 27.02.23
11		Erstellung Fachplanung GP	105 Tage	Die 04.10.22	Mon 27.02.23
14		Prüfung GP durch den AG	15 Tage	Die 28.02.23	Mon 20.03.23
15		Einarbeitung Prüfanmerkungen	5 Tage	Die 21.03.23	Mon 27.03.23
16		*Überarbeitung der gesamten GP*	*13 Monate*	*Don 13.07.23*	*Don 11.07.24*
17		*Prüfung GP durch den AG*	*15 Tage*	*Don 11.07.24*	*Don 01.08.24*
18		*Einarbeitung Prüfanmerkungen*	*26 Tage*	*Don 01.08.24*	*Fre 06.09.24*
19		Planrechtsverfahren	709,5 Tage	Mon 27.03.23	Mon 15.12.25
28		Abschluss EP/GP	0 Tage	Mon 22.12.25	Mon 22.12.25
29		Freigabe Lph 5-9	20 Tage	Mon 30.06.25	Mon 28.07.25
30		Freigabe zur Ausführung	4 Wochen	Mon 30.06.25	Mon 28.07.25
31		Ausführungsplanung	160 Tage	Mon 28.07.25	Mon 09.03.26
44		Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen	94 Tage	Mon 08.09.25	Fre 16.01.26
53		Bauausführung	239 Tage	Mon 01.12.25	Fre 30.10.26
54		Betra-Auftaktbesprechung	0 Tage	Mon 01.12.25	Mon 01.12.25
55		EIGV-Anzeige (10 Wochen vor Baubeginn)	0 Tage	Mon 01.12.25	Mon 01.12.25
56		Bauanzeige VV-Bau (4 Wochen vor Baubeginn)	0 Tage	Mon 12.01.26	Mon 12.01.26
57		Baubeginn (Materialisierung)	0 Tage	Mon 09.02.26	Mon 09.02.26
58		Bauzeit	179 Tage	Mon 23.02.26	Fre 30.10.26
59		Abnahme	5 Tage	Mon 18.05.26	Mon 25.05.26
60		Inbetriebnahme Neubau BÜ	0 Tage	Mit 27.05.26	Mit 27.05.26

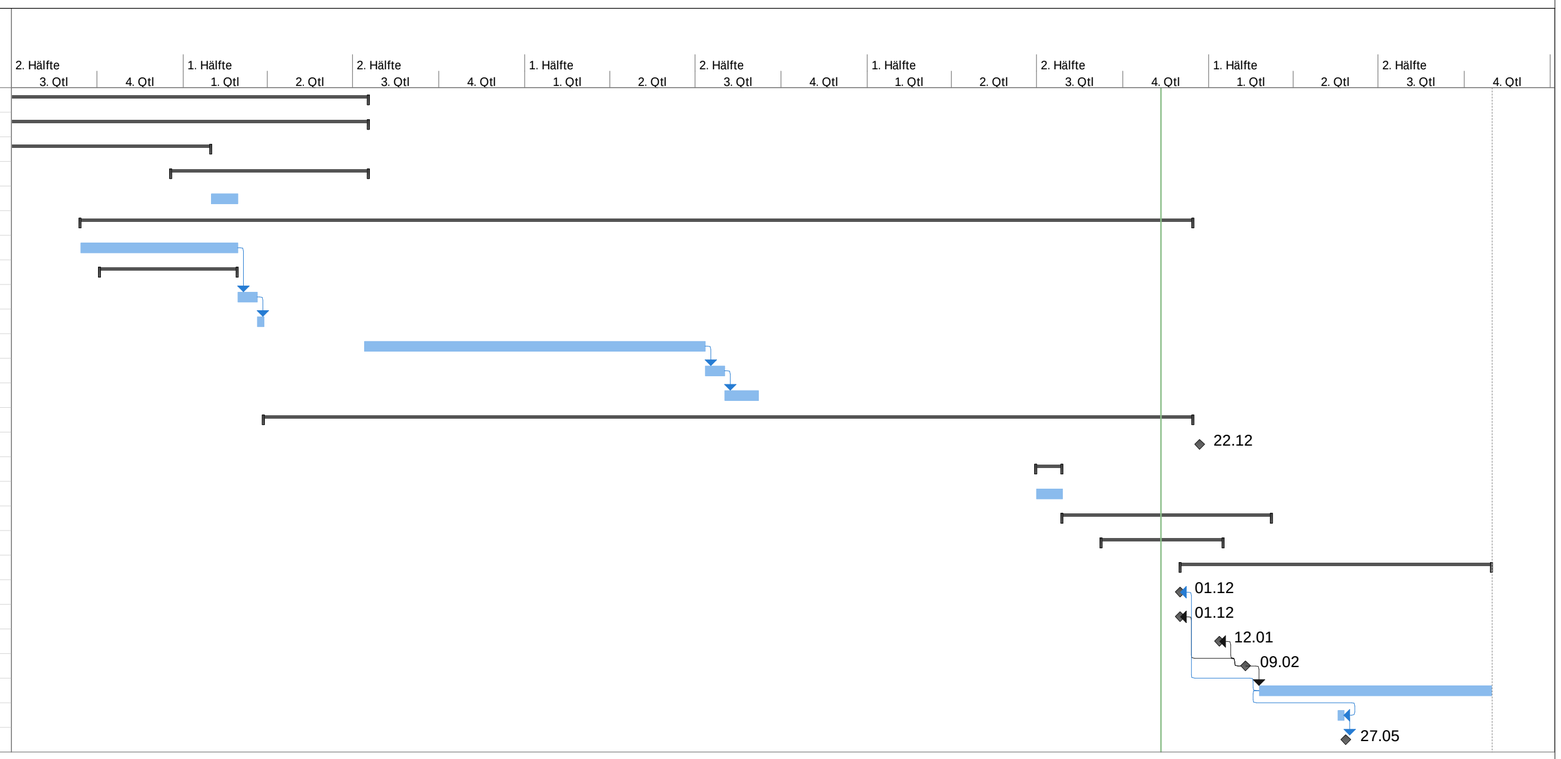

Projekt: Planung der Planung
Datum: Die 11.11.25

Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			
