IDFN Masterplan - Rahmenterminplan LP2-8 Objektplanung

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Insitut der Feuerwehr NRW - SG1 bis SG4**	**2125 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 25.08.34**	
2					
3	**SG 1 - Neubau**	**1050 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 12.07.30**	
4	LP 3 Überarbeitung (Fortschreibung Raumprogramm)	15 Tage	Mon 06.07.26	Fre 24.07.26	
5	LP 4 Genehmigungsplanung	65 Tage	Mon 27.07.26	Fre 23.10.26	4
6	Prüfung Bauantrag	8 Monate	Mon 26.10.26	Fre 04.06.27	5
7	LP 5 Ausführungsplanung	368 Tage	Mon 26.10.26	Mit 22.03.28	5
8	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	215 Tage	Mon 05.07.27	Fre 28.04.28	
9	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe	240 Tage	Mon 01.11.27	Fre 29.09.28	8AA+10 Woc...
10	Fertigstellung AS3	0 Tage	Don 09.12.27	Don 09.12.27	
11	Umzug SG nach AS3	45 Tage	Mon 13.12.27	Fre 11.02.28	
12	Abbruch B2 und B3	46 Tage	Mon 14.02.28	Mon 17.04.28	11
13	LP 8 Objektüberwachung	585 Tage	Mon 17.04.28	Fre 12.07.30	
14					
15	**SG B4 - Umbau Bestand**	**350 Tage**	**Mon 26.02.29**	**Fre 28.06.30**	
16	LP 4 Genehmigungsplanung	20 Tage	Mon 26.02.29	Fre 23.03.29	
17	Prüfung Bauantrag	5 Monate	Mon 26.03.29	Fre 10.08.29	16
18	LP 5 Ausführungsplanung	90 Tage	Mon 07.05.29	Fre 07.09.29	16EA+10 Tage
19	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	50 Tage	Mon 27.08.29	Fre 02.11.29	18EA-10 Tage
20	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe	60 Tage	Mon 22.10.29	Fre 11.01.30	19EA-10 Tage
21	LP 8 Objektüberwachung	120 Tage	Mon 14.01.30	Fre 28.06.30	20EA-5 Tage
22					
23	**SG 3 - Neubau**	**750 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Fre 18.05.29**	
24	LP 4 Genehmigungsplanung	20 Tage	Mon 06.07.26	Fre 31.07.26	
25	Prüfung Bauantrag	6 Monate	Mon 03.08.26	Fre 15.01.27	24
26	LP 5 Ausführungsplanung	215 Tage	Mon 07.09.26	Fre 02.07.27	
27	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	270 Tage	Mon 05.07.27	Fre 14.07.28	
28	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe	250 Tage	Mon 13.09.27	Fre 25.08.28	27AA+10 Wo...
29	LP 8 Objektüberwachung	410 Tage	Mon 25.10.27	Fre 18.05.29	
30					
31	**SG A6 - Umbau Bestand**	**510 Tage**	**Mon 12.10.26**	**Fre 22.09.28**	
32	LP 4 Genehmigungsplanung	40 Tage	Mon 12.10.26	Fre 04.12.26	
33	Prüfung Bauantrag	4 Monate	Mon 07.12.26	Fre 26.03.27	32
34	LP 5 Ausführungsplanung	3 Monate	Mon 18.01.27	Fre 09.04.27	
35	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	20 Tage	Mon 04.10.27	Mon 01.11.27	36AE
36	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe	60 Tage	Mon 01.11.27	Fre 21.01.28	37AE
37	LP 8 Objektüberwachung	9 Monate	Mon 17.01.28	Fre 22.09.28	
38					
39	**SG 2 - Neubau**	**1350 Tage**	**Mon 06.12.27**	**Fre 04.02.33**	
40	LP 4 Genehmigungsplanung	80 Tage	Mon 06.12.27	Fre 24.03.28	
41	Prüfung Bauantrag	8 Monate	Mon 27.03.28	Fre 03.11.28	40
42	LP 5 Ausführungsplanung	365 Tage	Mon 08.05.28	Fre 28.09.29	40EA+10 Tage
43	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	250 Tage	Mon 02.07.29	Fre 14.06.30	
44	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe	240 Tage	Mon 10.09.29	Fre 09.08.30	43AA+10 Wo...
45	Fertigstellung SG1	0 Tage	Fre 12.07.30	Fre 12.07.30	
46	Umzug nach SG1	1 Monat	Mon 15.07.30	Fre 09.08.30	
47	Abbruch A1, A2, A3	2 Monate	Mon 12.08.30	Fre 04.10.30	46
48	LP 8 Objektüberwachung	610 Tage	Mon 07.10.30	Fre 04.02.33	47
49					
50	**SG 4 - Neubau**	**1128 Tage**	**Mit 01.05.30**	**Fre 25.08.34**	
51	LP 4 Genehmigungsplanung	80 Tage	Mit 01.05.30	Die 20.08.30	
52	Prüfung Bauantrag	8 Monate	Mit 21.08.30	Die 01.04.31	51
53	LP 5 Ausführungsplanung	365 Tage	Mit 04.09.30	Die 27.01.32	51EA+10 Tage
54	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	300 Tage	Fre 01.08.31	Don 23.09.32	
55	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe	280 Tage	Don 01.01.32	Mit 26.01.33	54AA+10 Wo...
56	LP 8 Objektüberwachung	530 Tage	Mon 16.08.32	Fre 25.08.34	
57					
58	**SG A8 Kopfbau - Neubau**	**460 Tage**	**Mon 02.02.32**	**Fre 04.11.33**	
59	LP 4 Genehmigungsplanung	20 Tage	Mon 02.02.32	Fre 27.02.32	
60	Prüfung Bauantrag	8 Monate	Mon 01.03.32	Fre 08.10.32	59
61	LP 5 Ausführungsplanung	189 Tage	Mon 01.03.32	Don 18.11.32	59
62	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	250 Tage	Mon 03.05.32	Fre 15.04.33	
63	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe	240 Tage	Mon 12.07.32	Fre 10.06.33	62AA+10 Wo...
64	LP 8 Objektüberwachung	320 Tage	Mon 16.08.32	Fre 04.11.33	
65					
66	**SG A8 - Umbau Bestand**	**201 Tage**	**Don 01.01.32**	**Don 07.10.32**	
67	LP 5 Ausführungsplanung	50 Tage	Don 01.01.32	Mit 10.03.32	
68	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	20 Tage	Don 11.03.32	Mit 07.04.32	67
69	LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe	60 Tage	Don 08.04.32	Mit 30.06.32	68
70	LP 8 Objektüberwachung	71 Tage	Don 01.07.32	Don 07.10.32	69

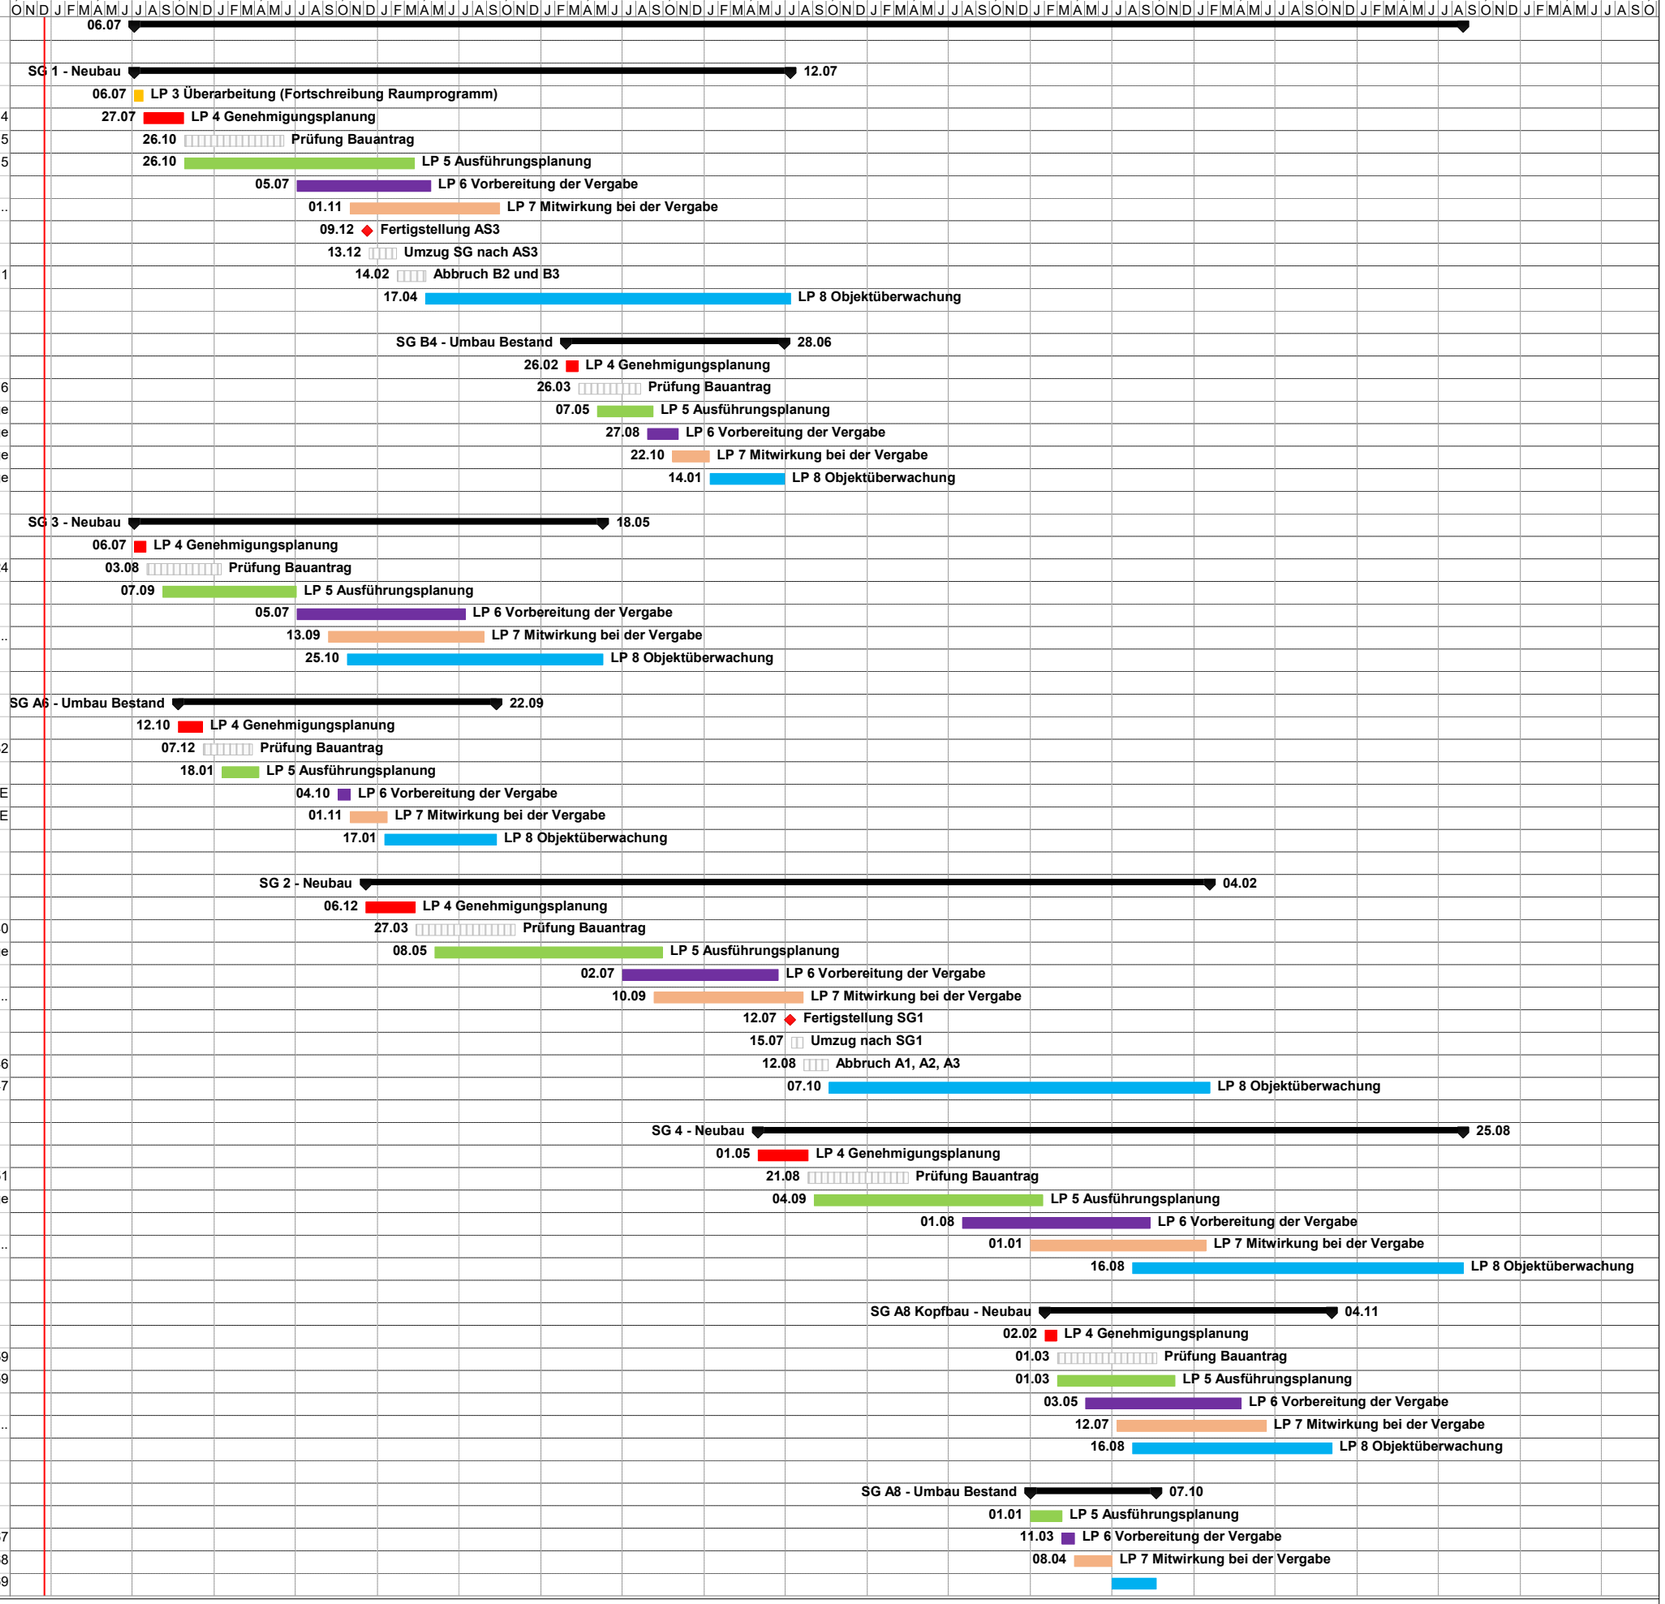

Projekt IdF Infra-opt - AWARO Dokument-Nr. 20685
