| Nr. | | Vorgan | Vorgangsname | Dauer | Gleissperrung | Anfang | Fertig stellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **G.011210668 Leuna Werke Süd Umbau der Verkehrsstation** | | | | |
| 2 | | | **Bauzustand 1, Neubau Bahnsteig 2** | **86 Tage** | | **Fr 15.05.26** | **Fr 11.09.26** |
| 3 | | | Neubau BSK 51 und Fertigteilfundamente 155 m, Zuwegungsanschluss an die Treppe, Befestigung Bahnsteig, Kabeltiefbau, Gründungen Beleuchtung, Tragschichtmaterial, Entwässerung, Rückbau überzählige Bahnsteiglänge | 21 Tage | Gleissperrung durchgängig, Abschaltung Oberleitungn, kein Reisendenhalt über die gesamte Bauzeit, SEV | Fr 15.05.26 | Fr 12.06.26 |
| 4 | | | Restarbeiten Bahnsteig 2 und Treppenzugang außerhalb Gefahrenbereich des Gleises | 16 Tage | kein Reisendenverkehr über Bahnsteig 1 | Fr 12.06.26 | Fr 03.07.26 |
| 5 | | | Restarbeiten Bahnsteig 2 und Treppenzugang mit Reisendenverkehr | 50 Tage | | Mo 06.07.26 | Fr 11.09.26 |
| 6 | | | **Bauzustand 2, Neubau Bahnsteig 1** | **86 Tage** | | **Fr 12.06.26** | **Fr 09.10.26** |
| 7 | | | Neubau BSK 51 und Fertigteilfundamente 155 m, Zuwegungsanschluss an die Treppe, Befestigung Bahnsteig, Kabeltiefbau, Gründungen Beleuchtung, Tragschichtmaterial, Entwässerung, Rückbau überzählige Bahnsteiglänge | 16 Tage | Gleissperrung in b-Richtung, Eisenbahnverkehr am Bahnsteig 2, Abschaltung Oberleitungn, kein Reisendenhalt über die gesamte Bauzeit, SEV | Fr 12.06.26 | Fr 03.07.26 |
| 8 | | | Restarbeiten Bahnsteig 1 und Treppenzugang außerhalb Gefahrenbereich des Gleises | 20 Tage | kein Reisendenverkehr über Bahnsteig 2 | Mo 06.07.26 | Fr 31.07.26 |
| 9 | | | Restarbeiten Bahnsteig 1, Inbetriebnahme Beleuchtung und Bahnsteige | 50 Tage | | Mo 03.08.26 | Fr 09.10.26 |

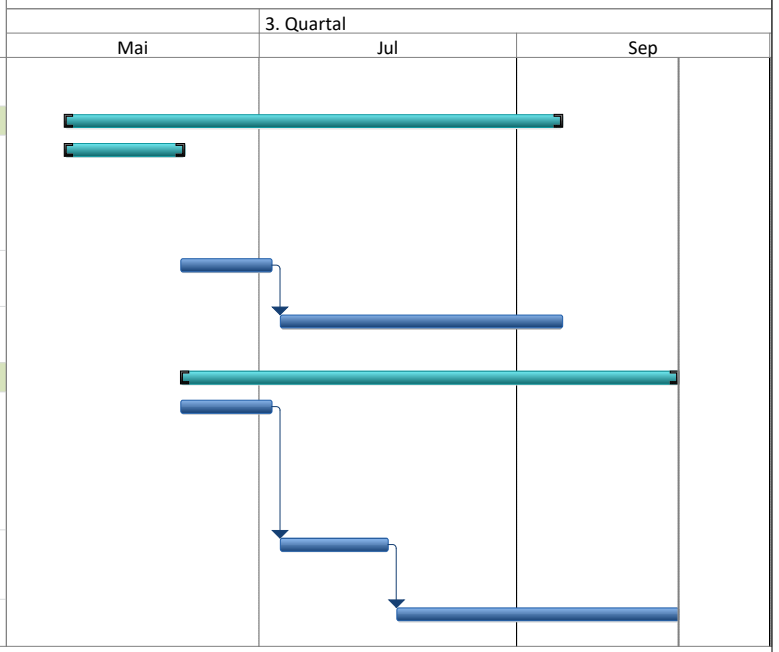


Projekt: Leuna Werke Süd
Datum: 07.11.2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorgang | Externe Vorgänge | Manueller Vorgang | Nur Ende | | |
| Unterbrechung | Externer Meilenstein | Nur Dauer | Stichtag | | |
| Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Manueller Sammelrollup | In Arbeit | | |
| Sammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Sammelvorgang | | | |
| Projektsammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Anfang | | | |
