Bauherr:
Stadt Jüterbog
vertr. durch Bauamt
Markt 21
14913 Jüterbog

01-Umsetzung Brandschutzkonzept 9. BA
Geschwister-Scholl-Grundschule
Eichenweg 43 in 14913 Jüterbog

Nanut Planungsgesellschaft mbH
Hochbauplanung und Bauüberwachung
Lübnitzer Straße 2
14806 Bad Belzig

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	**Ablaufplan 7.BA**	**Don 09.07.26**	**Fre 21.08.26**
2	**Baustelleneinrichtung**	**Don 09.07.26**	**Fre 21.08.26**
3	Baustrom	Don 09.07.26	Fre 21.08.26
4	Schutz Türen	Don 09.07.26	Fre 10.07.26
5	Schutz Bodenfläche	Don 09.07.26	Fre 14.08.26
6	Staubschutzwände	Don 09.07.26	Fre 10.07.26
7	**Elektro**	**Don 09.07.26**	**Fre 21.08.26**
8	Demontage Elektro	Don 09.07.26	Mon 13.07.26
9	Montage Elektro	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
10	**EG**	**Mon 13.07.26**	**Fre 07.08.26**
11	GK-Deckenplatten demontieren	Mon 13.07.26	Mon 13.07.26
12	Maler Küche	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26
13	GK-Deckenplatten montieren	Mon 03.08.26	Die 04.08.26
14	Maler Reparatur nach Türmontage	Mit 05.08.26	Fre 07.08.26
15	**1. OG**	**Mon 13.07.26**	**Die 04.08.26**
16	**Flur 1.02**	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26
17	Maler Wände, Decken	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26
18	**Raum 22 Computerkab.**	**Mon 13.07.26**	**Die 04.08.26**
19	Akustikdecke	Mon 13.07.26	Die 21.07.26
20	Maler Wände, Decken	Mit 22.07.26	Die 04.08.26
21	**Erneuerung Außentreppen**	Don 09.07.26	Fre 14.08.26
22	Baustelleneinrichtung	Don 09.07.26	Fre 10.07.26
23	Abbruch Treppen	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26
24	Terrazzo-Platten ausbauen/ lagern	Fre 10.07.26	Mon 13.07.26
25	Terrazzo + Estrich neu	Mon 27.07.26	Mit 05.08.26
26	Treppenanlagen neu	Don 16.07.26	Fre 07.08.26
27	Wegflächen herrichten	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
28	**Erneuerung Außentüren**	Mon 13.07.26	Mit 12.08.26
29	Erneuerungen Türen T01, 05, 06	Mon 13.07.26	Mon 20.07.26
30	Erneuerungen Türen T02, T03, T04	Die 21.07.26	Die 28.07.26
31	Fertigstellung/ Funktionsprüfung	Mon 10.08.26	Mit 12.08.26
32	**Feinreinigung**	**Mon 17.08.26**	**Fre 21.08.26**

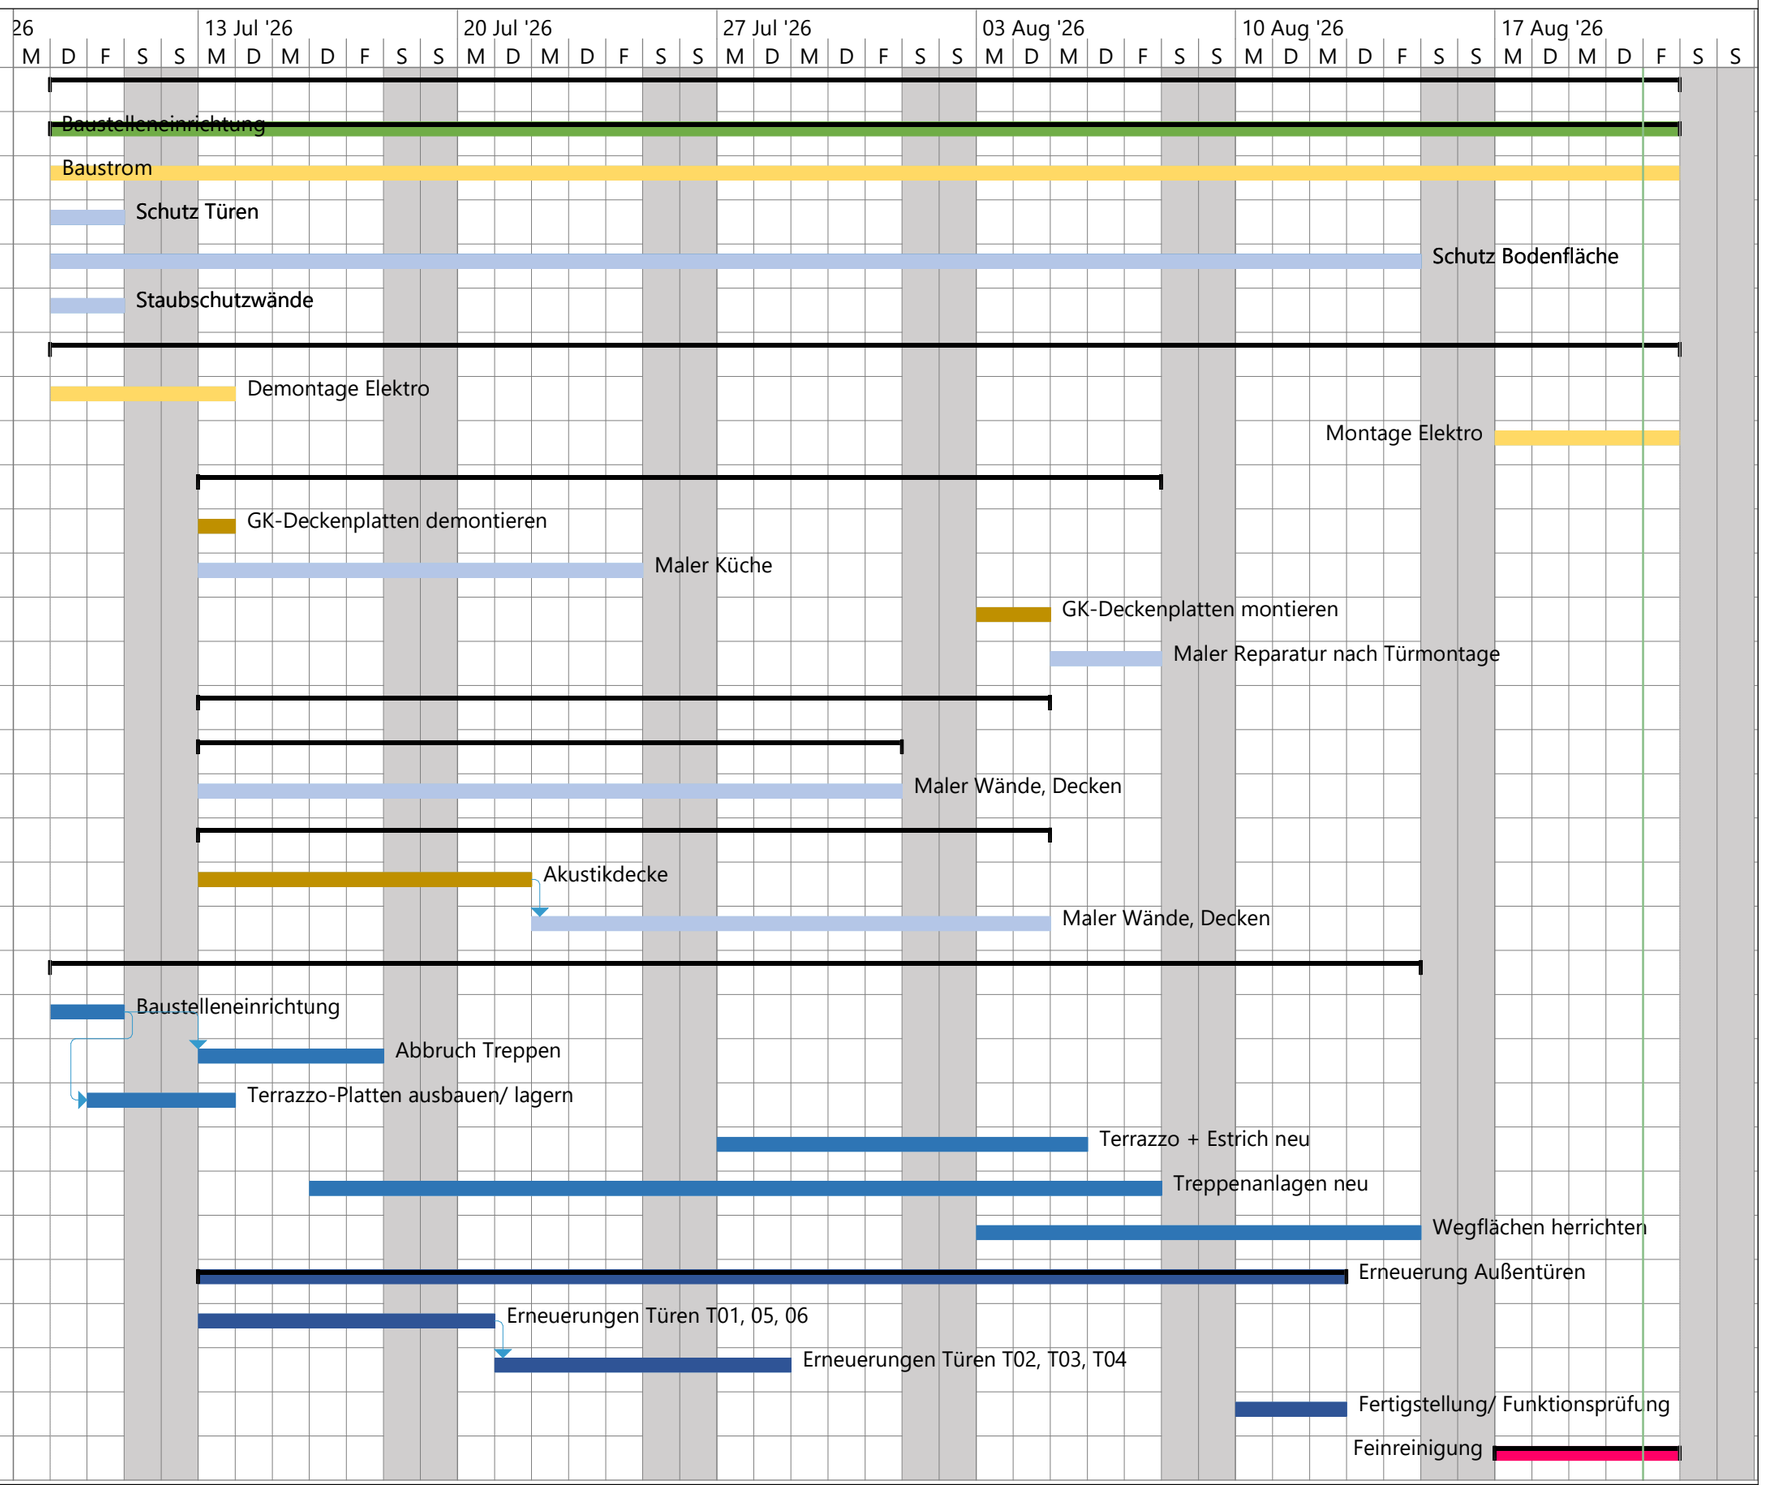

BE — Bauhaupt — Türen — Reinigung — 1. OG
Elektro — Akustikdecke — Maler — 2. OG
