

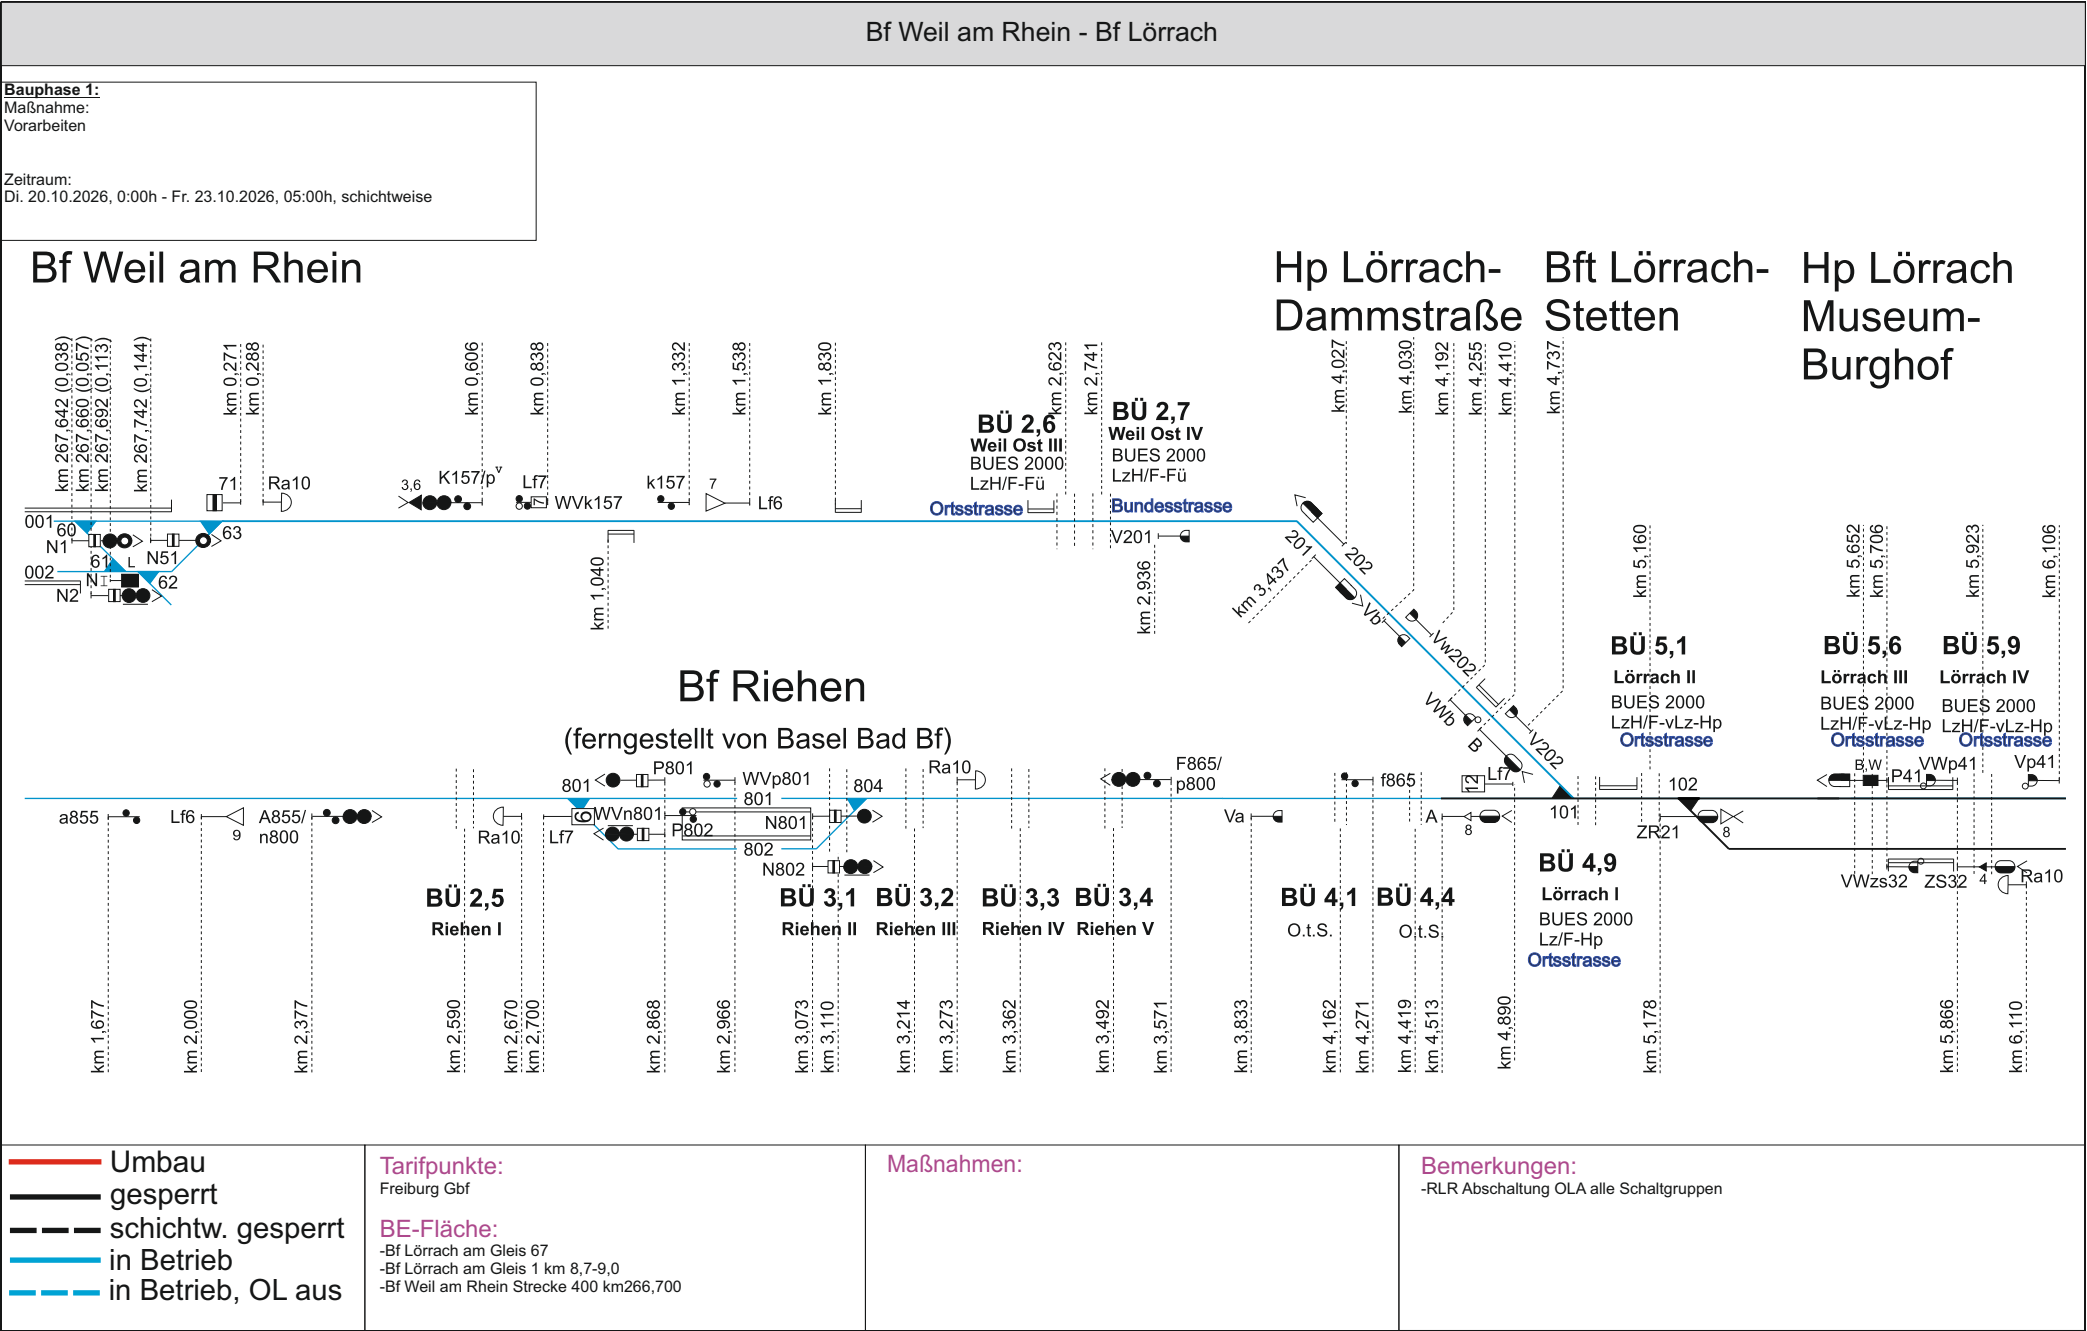
Oberbauprogramm 2026 - Maßnahme 26_Weil (Rhein)-Lörrach

Sperrskizze

DB Engineering & Consulting GmbH

B. Tischer

Büro Karlsruhe



Hbf Lörrach

Bauphase 1:

Maßnahme:
Vorarbeiten

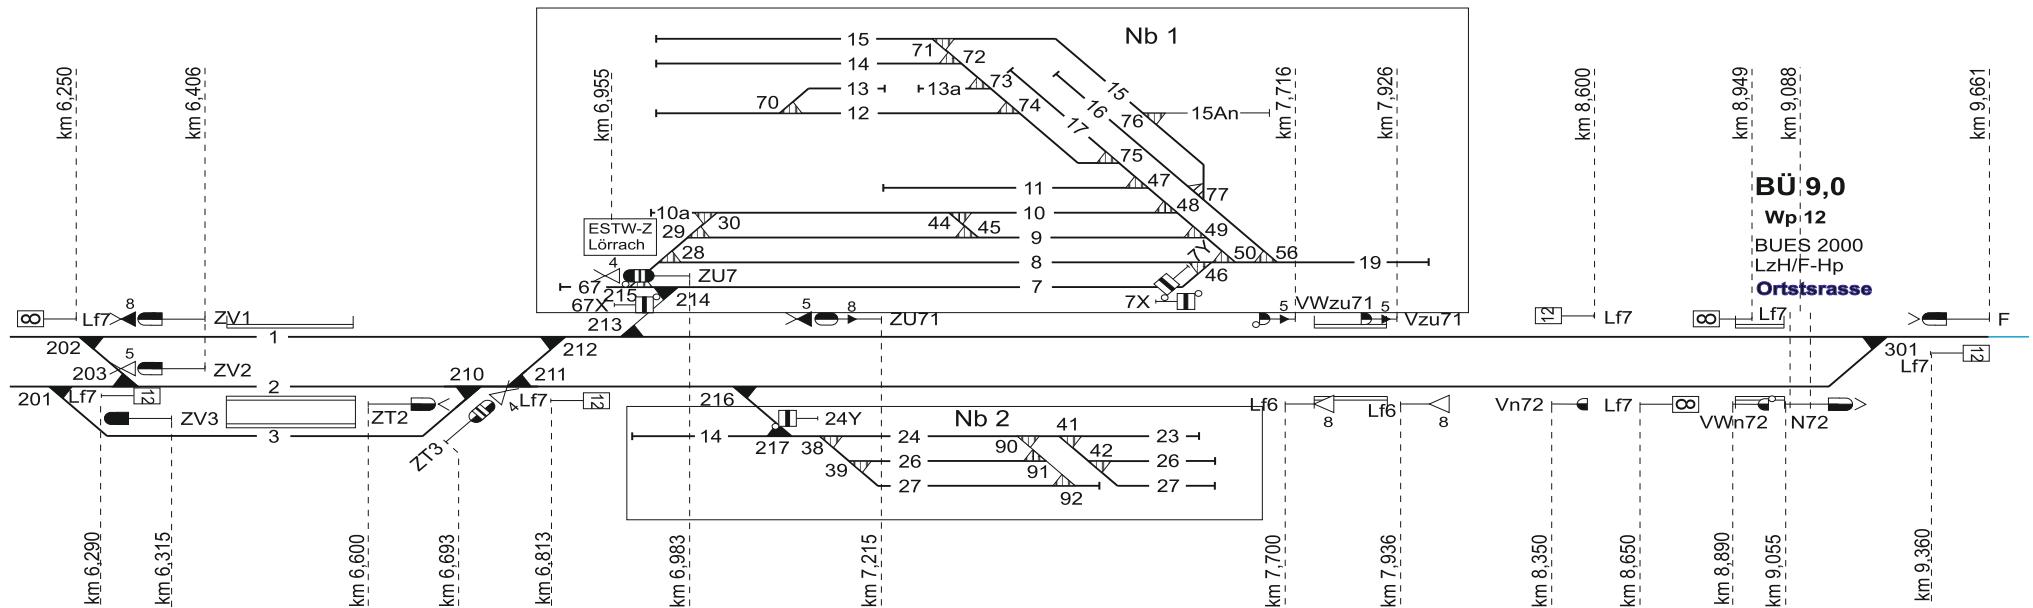
Zeitraum:






Di. 20.10.2026, 0:00h - Fr. 23.10.2026, 05:00h, schichtweise

Bft Lörrach Hbf
ESTW

Hp Lörrach-
Schwarzwaldstraße

Bft Lörrach- Haagen/Messe



	Umbau
	gesperrt
	schichtw. gesperrt
	in Betrieb
	in Betrieb, OL aus

Tarifpunkte:

Freiburg Gbf

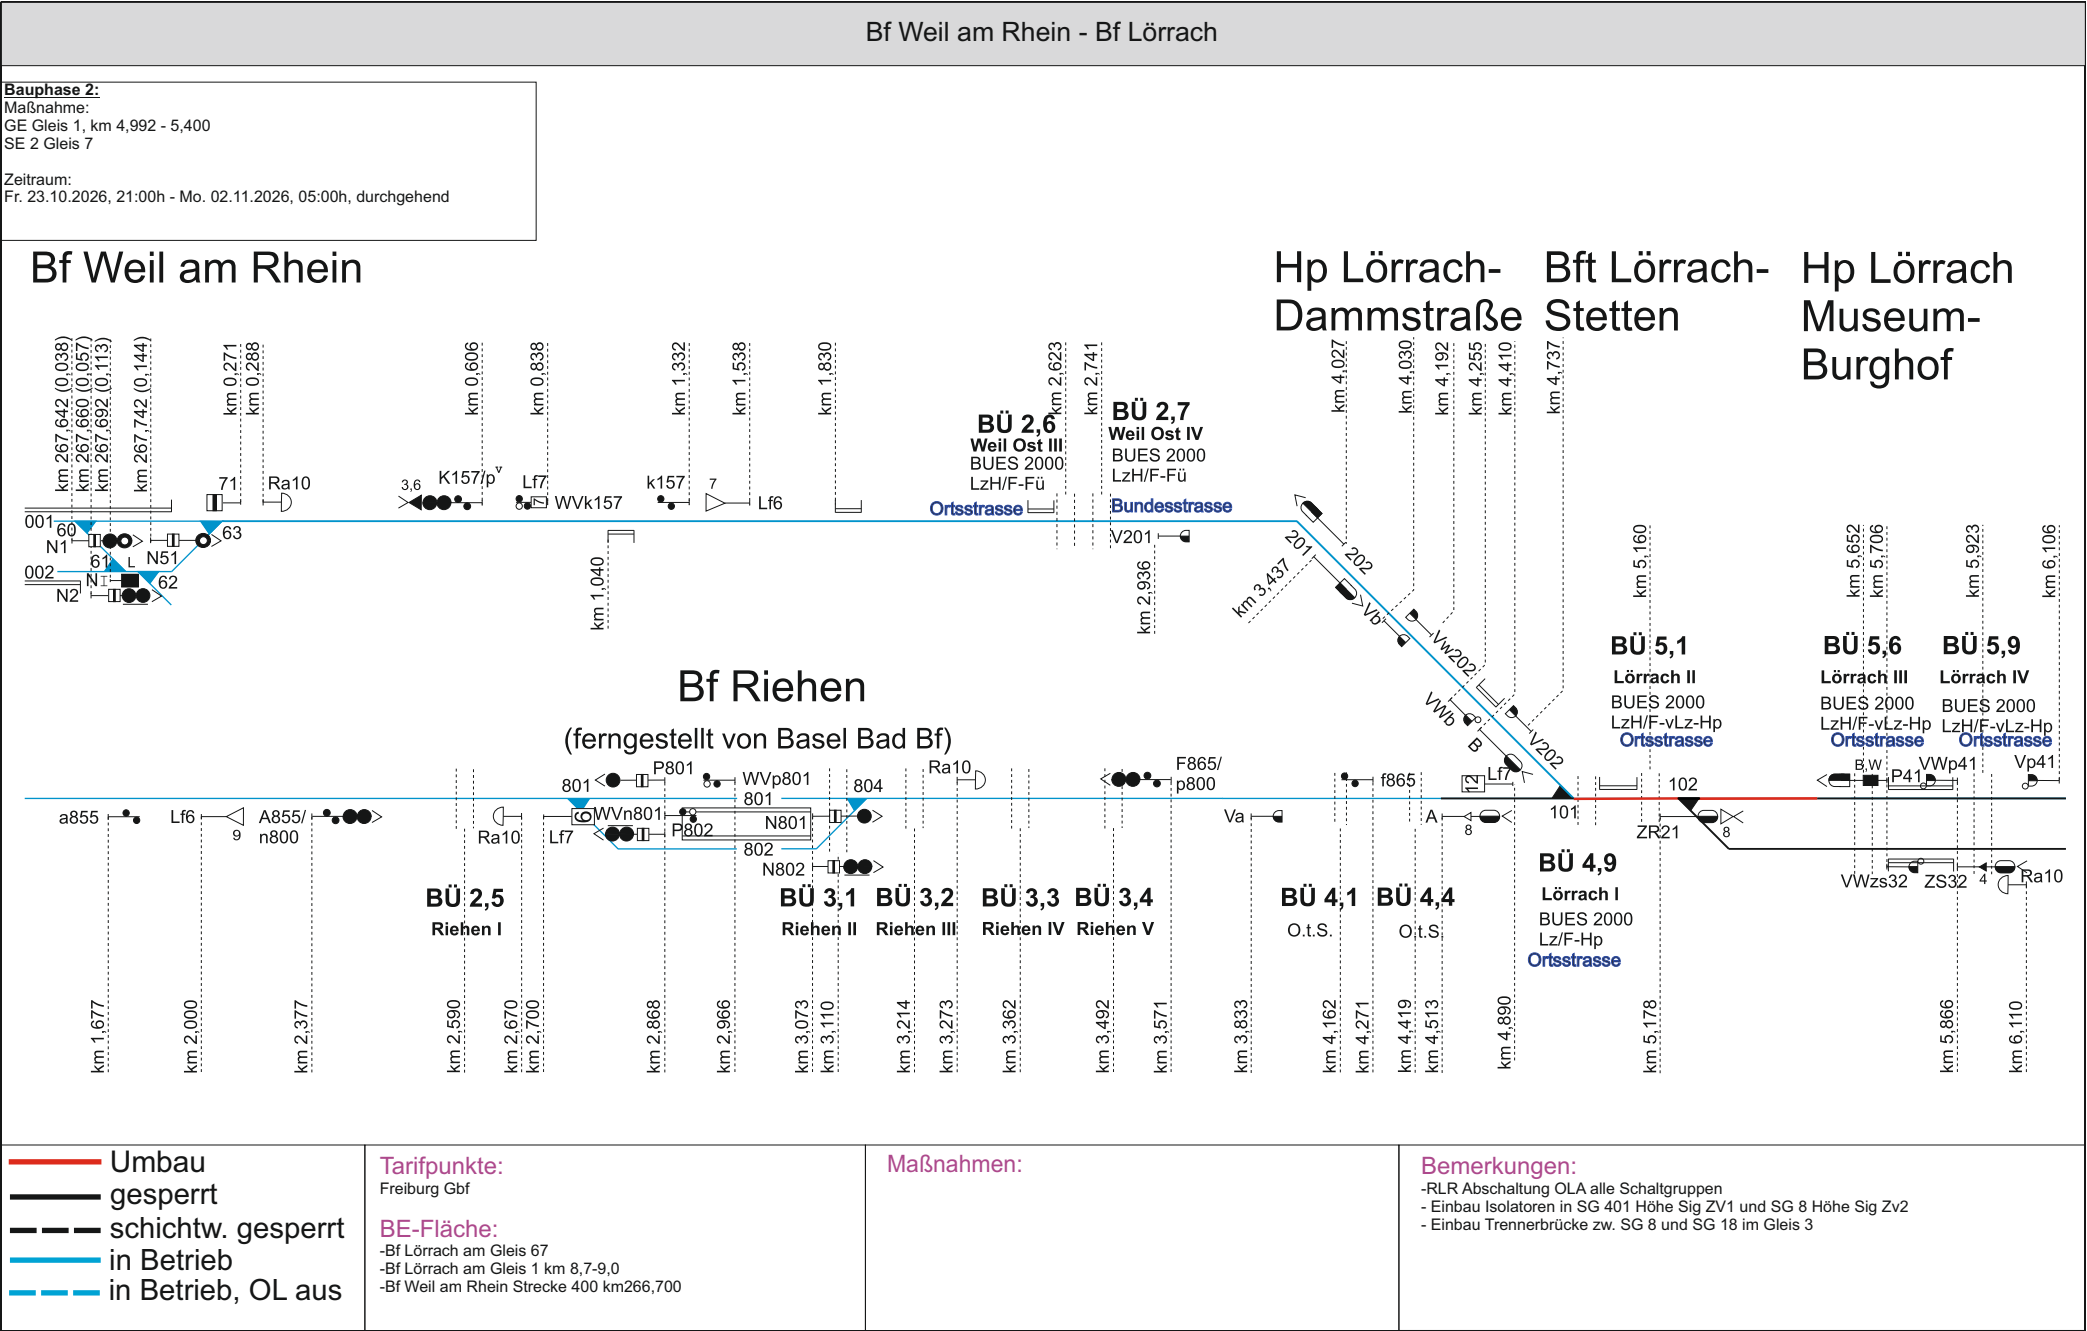
BE-Fläche:

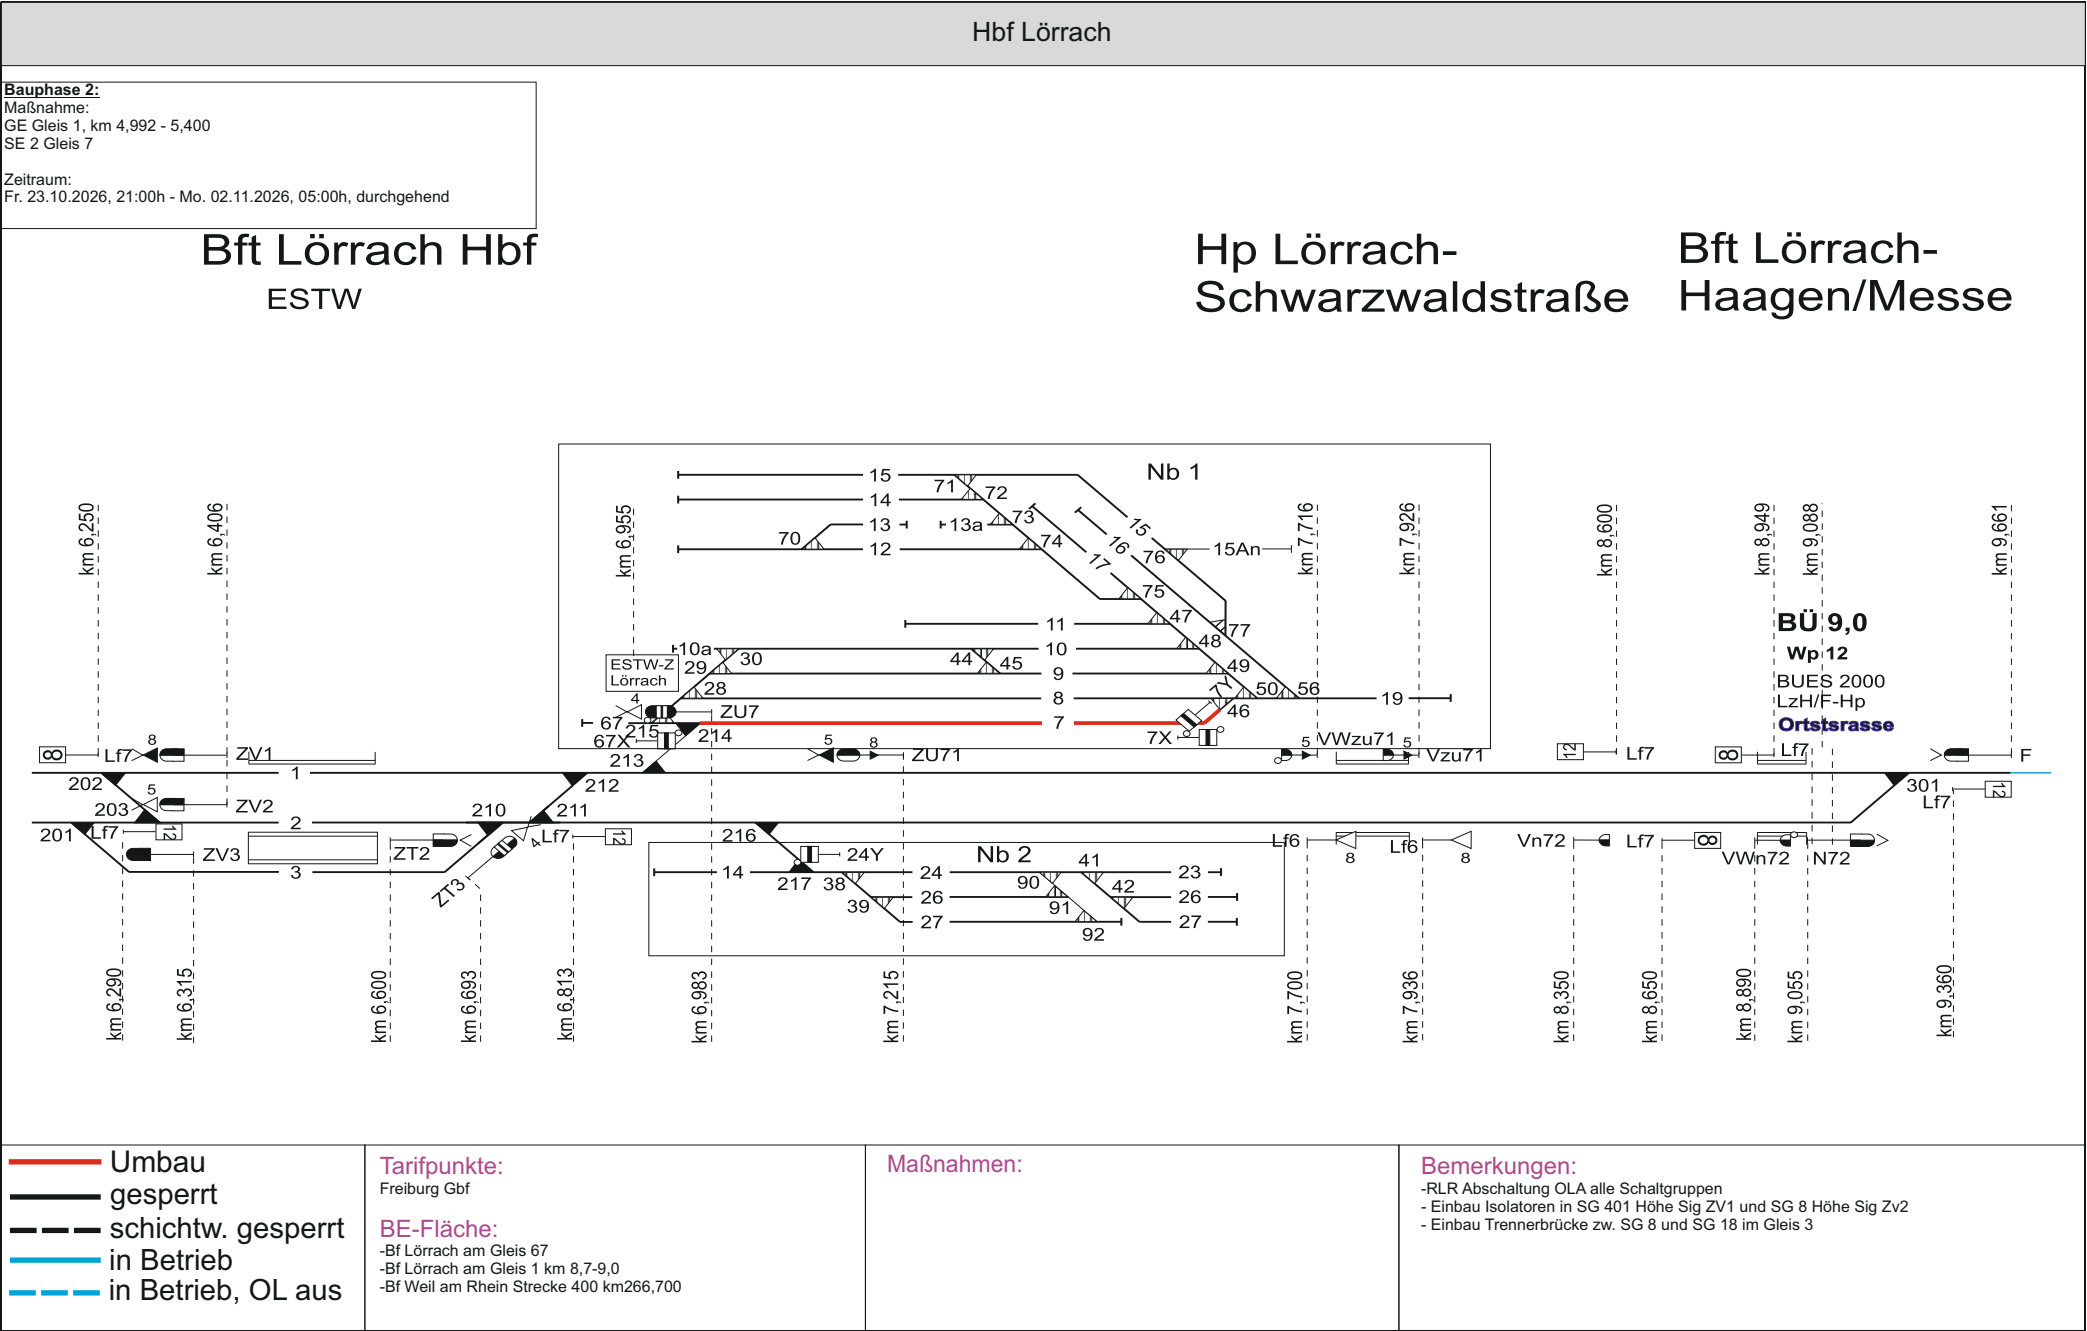
- Bf Lörrach am Gleis 67
- Bf Lörrach am Gleis 1 km 8,7-9,0
- Bf Weil am Rhein Strecke 400 km266,700

Maßnahmen:

Bemerkungen:

- RLR Abschaltung OLA alle Schaltgruppen





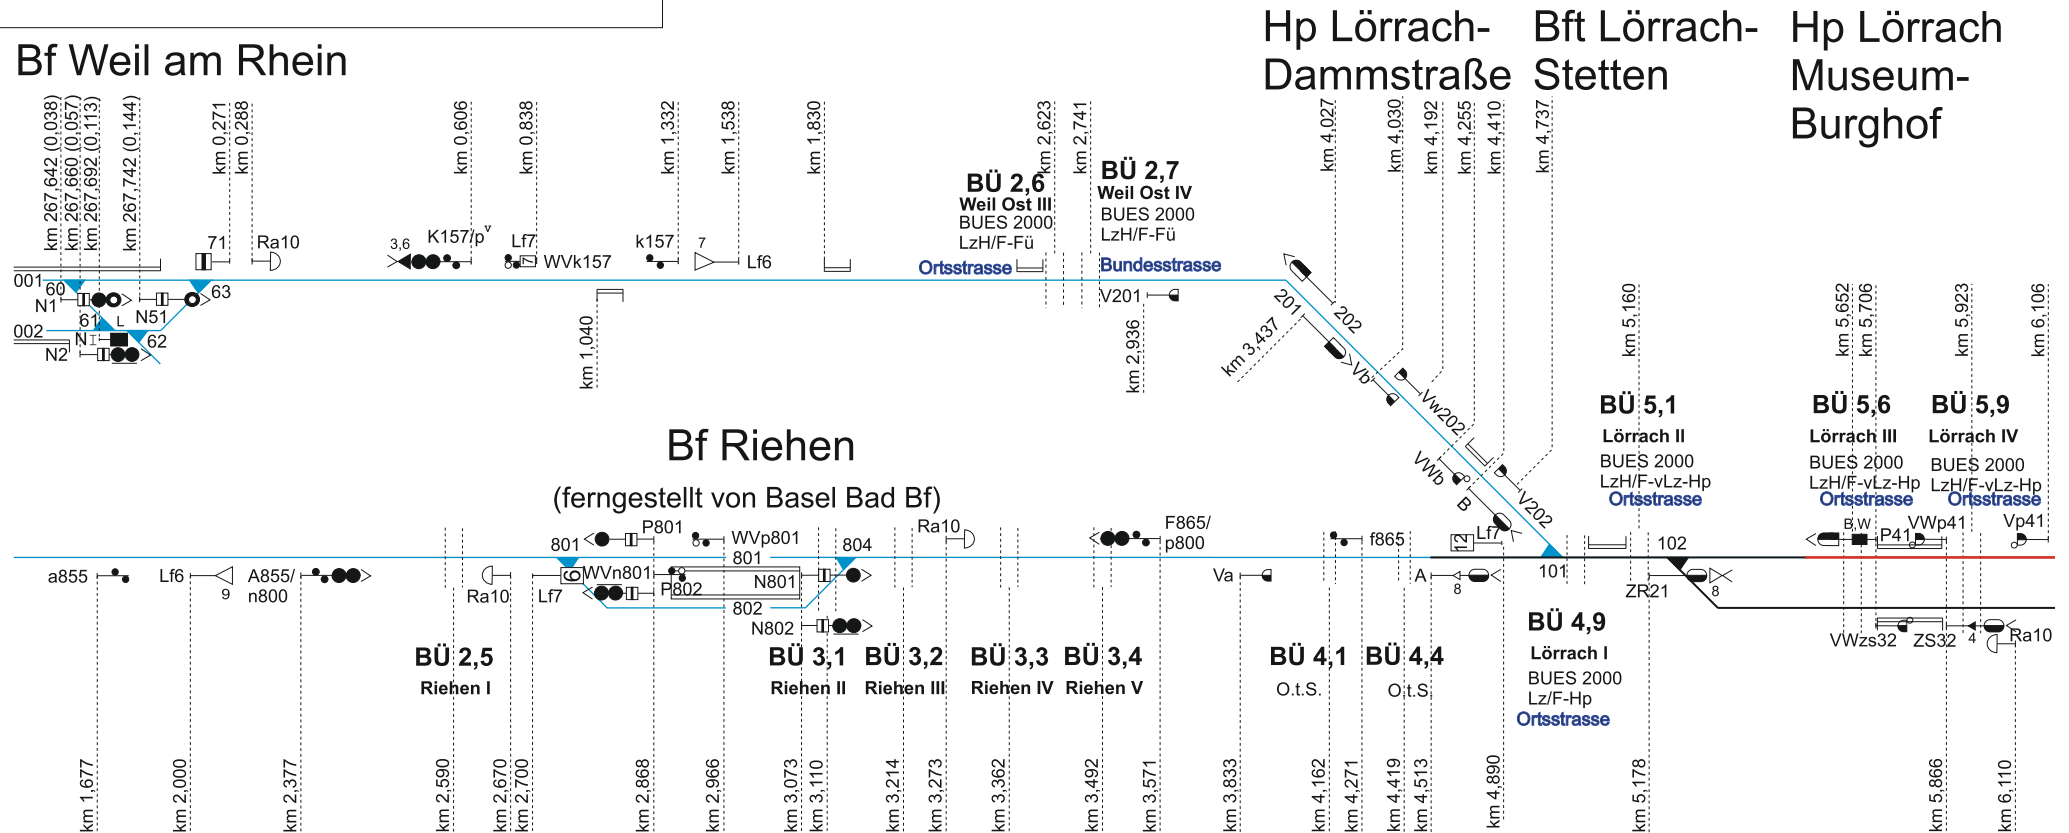
Bf Weil am Rhein - Bf Lörrach






Bauphase 3.1:

Maßnahme:
GE Gleis 1, km 5,400 - 6,250
WE W202

Zeitraum:

Mo. 02.11.2026, 05:00h - Mo. 09.11.2026, 05:00h, durchgehend



	Umbau
	gesperrt
	schichtw. gesperrt
	in Betrieb
	in Betrieb, OL aus

Tarifpunkte:

Freiburg Gbf

BE-Fläche:

- Bf Lörrach am Gleis 67
- Bf Lörrach am Gleis 1 km 8,7-9,0
- Bf Weil am Rhein Strecke 400 km266,700

Maßnahmen:

Bemerkungen:

-RLR Abschaltung OLA SG 1, 8(eingekürzt), 401(eingekürzt)

Hbf Lörrach

Bauphase 3.1:

Maßnahme:
GE Gleis 1, km 5,400 - 6,250
WE W202

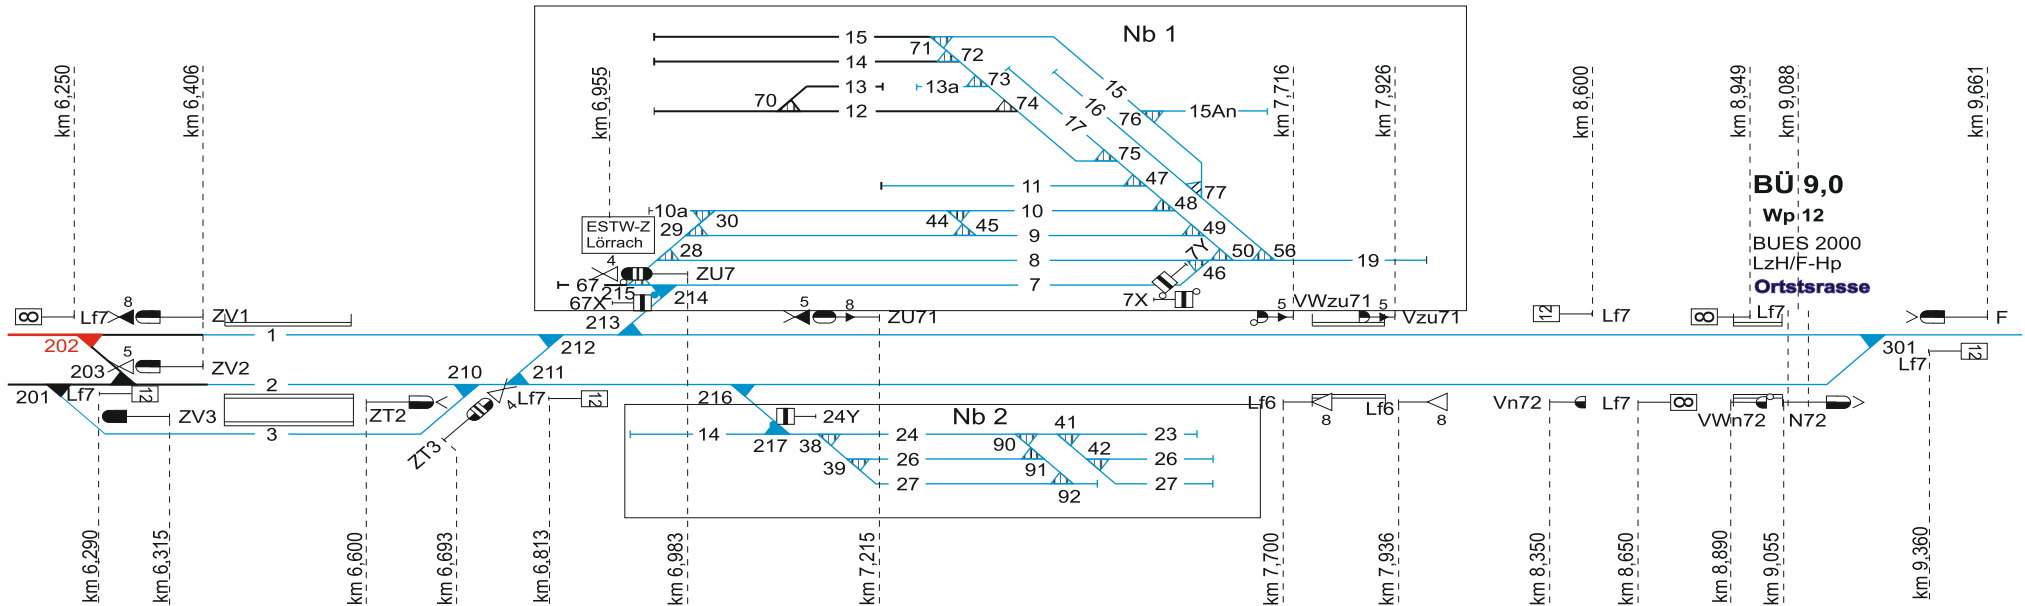
Zeitraum:






Mo. 02.11.2026, 05:00h - Mo. 09.11.2026, 05:00h, durchgehend

Hp Lörrach-
Schwarzwaldstraße

Bft Lörrach- Haagen/Messe

Bft Lörrach Hbf
ESTW



	Umbau
	gesperrt
	schichtw. gesperrt
	in Betrieb
	in Betrieb, OL aus

Tarifpunkte:

Weil am Rhein

BE-Fläche:

- Bf Lörrach am Gleis 67
- Bf Lörrach am Gleis 1 km 8,7-9,0
- Bf Weil am Rhein Strecke 400 km266,700

Maßnahmen:

Bemerkungen:

-RLR Abschaltung OLA SG 1, 8(eingekürzt), 401(eingekürzt)

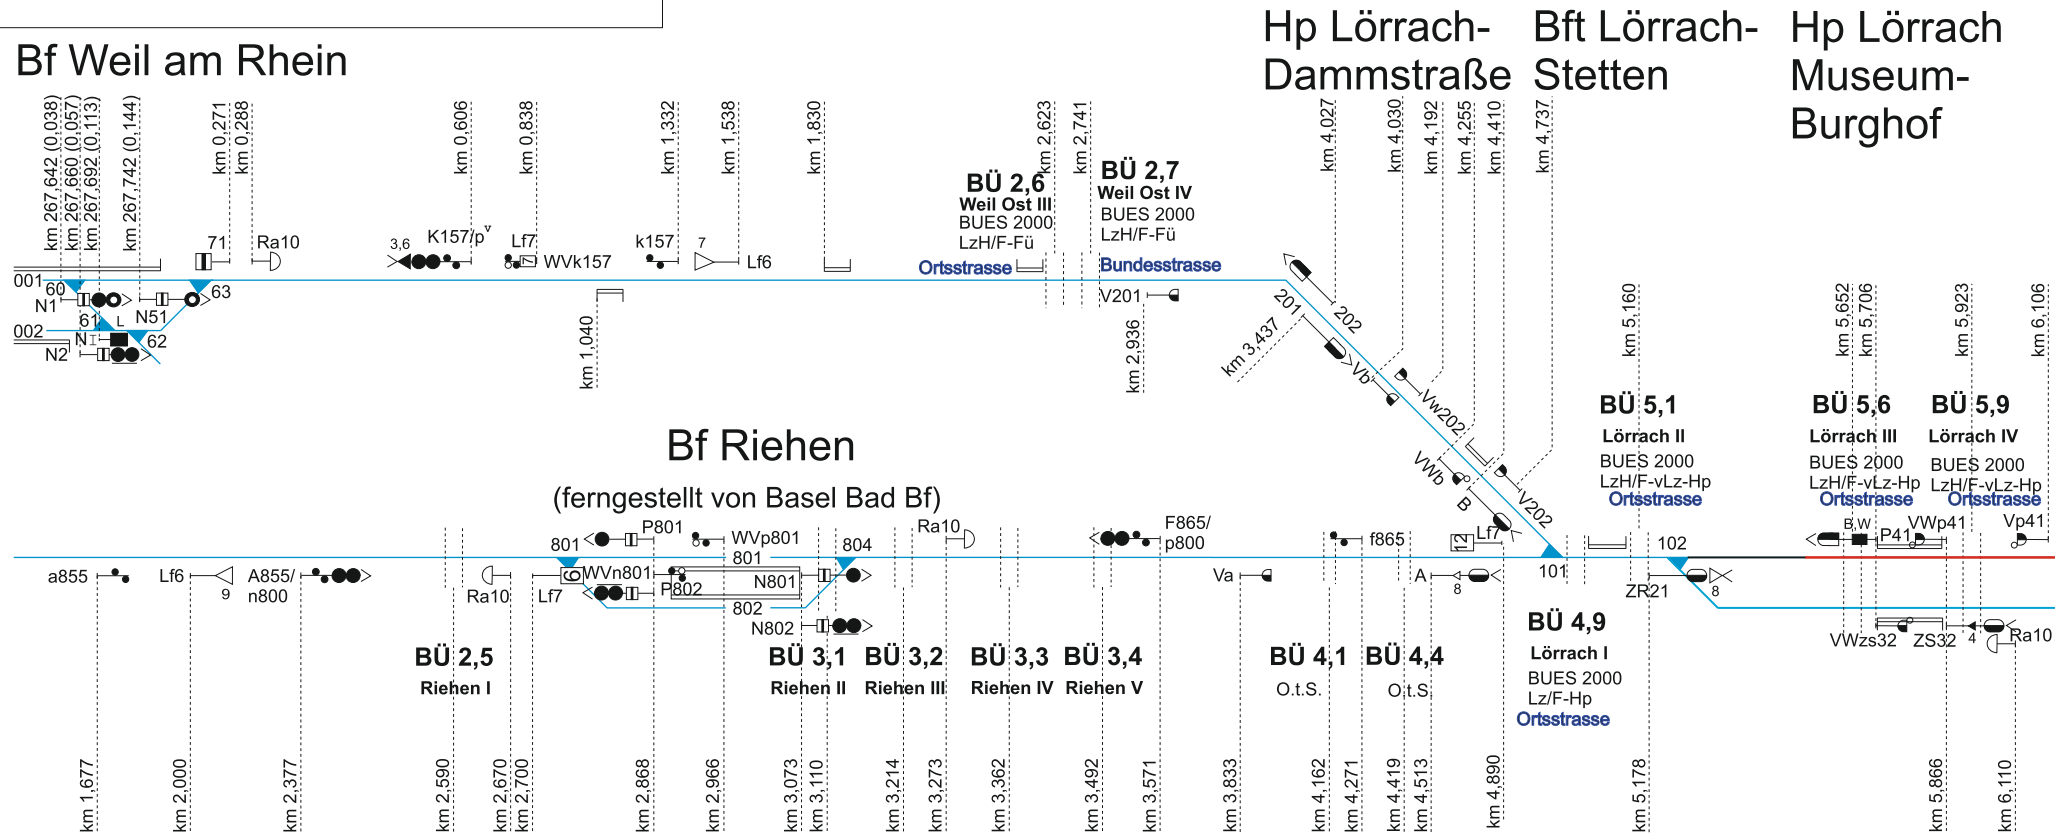
Bf Weil am Rhein - Bf Lörrach






Bauphase 3.2:

Maßnahme:
GE Gleis 1, km 5,400 - 6,250
WE W202

Zeitraum:

Mo. 09.11.2026, 05:00h - Fr. 13.11.2026, 21:00h, durchgehend



	Umbau
	gesperrt
	schichtw. gesperrt
	in Betrieb
	in Betrieb, OL aus

Tarifpunkte:

Freiburg Gbf

BE-Fläche:

- Bf Lörrach am Gleis 67
- Bf Lörrach am Gleis 1 km 8,7-9,0
- Bf Weil am Rhein Strecke 400 km266,700

Maßnahmen:

Bemerkungen:

-RLR Abschaltung OLA SG 1 (eingekürzt), SG 401 (eingekürzt)

Hbf Lörrach

Bauphase 3.2:

Maßnahme:
GE Gleis 1, km 5,400 - 6,250
WE W202

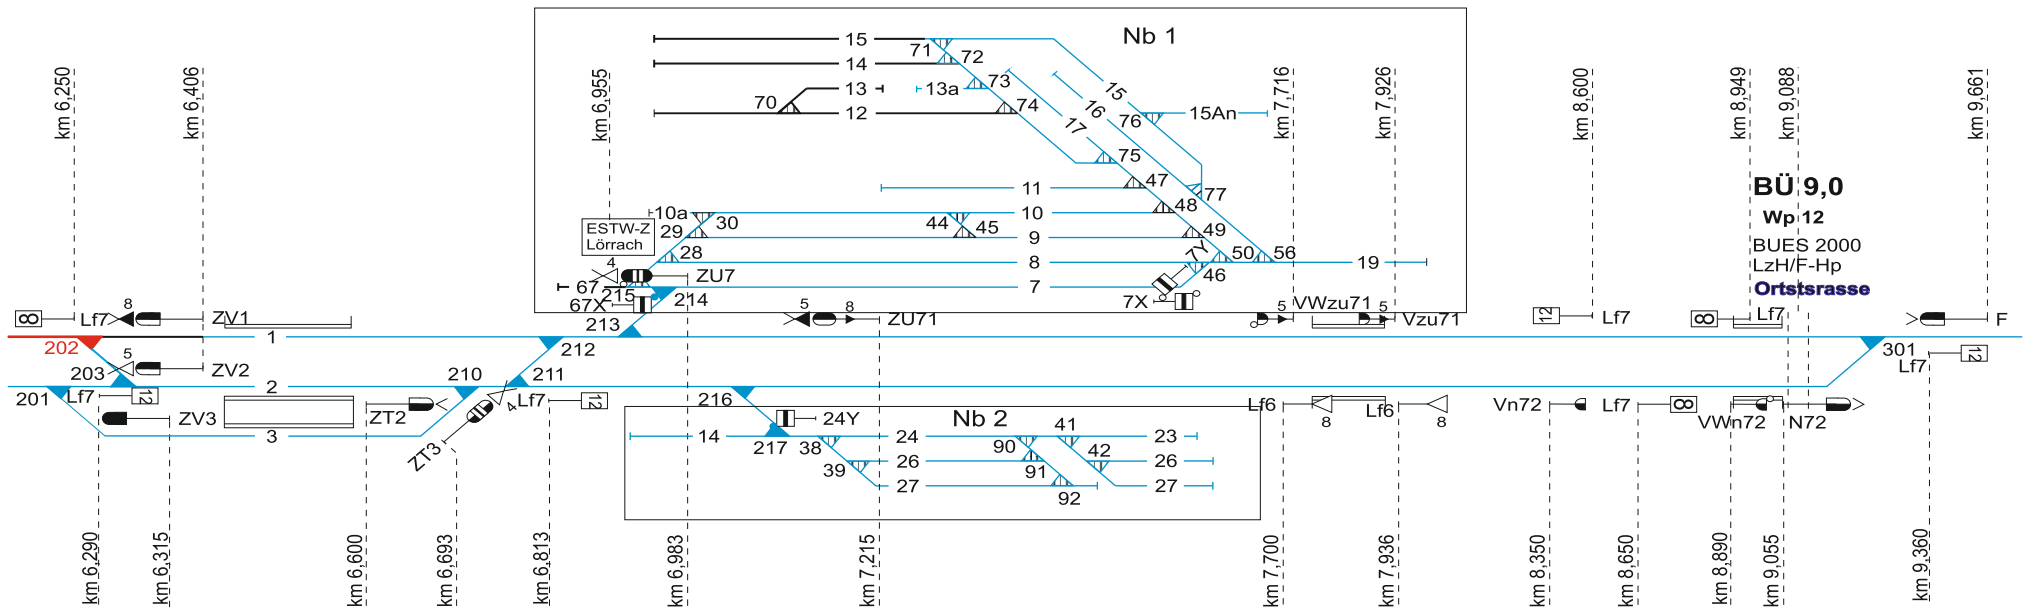
Zeitraum:






Mo. 09.11.2026, 05:00h - Fr. 13.11.2026, 21:00h, durchgehend

Hp Lörrach-
Schwarzwaldstraße

Bft Lörrach- Haagen/Messe

Bft Lörrach Hbf
ESTW



	Umbau
	gesperrt
	schichtw. gesperrt
	in Betrieb
	in Betrieb, OL aus

Tarifpunkte:

Weil am Rhein

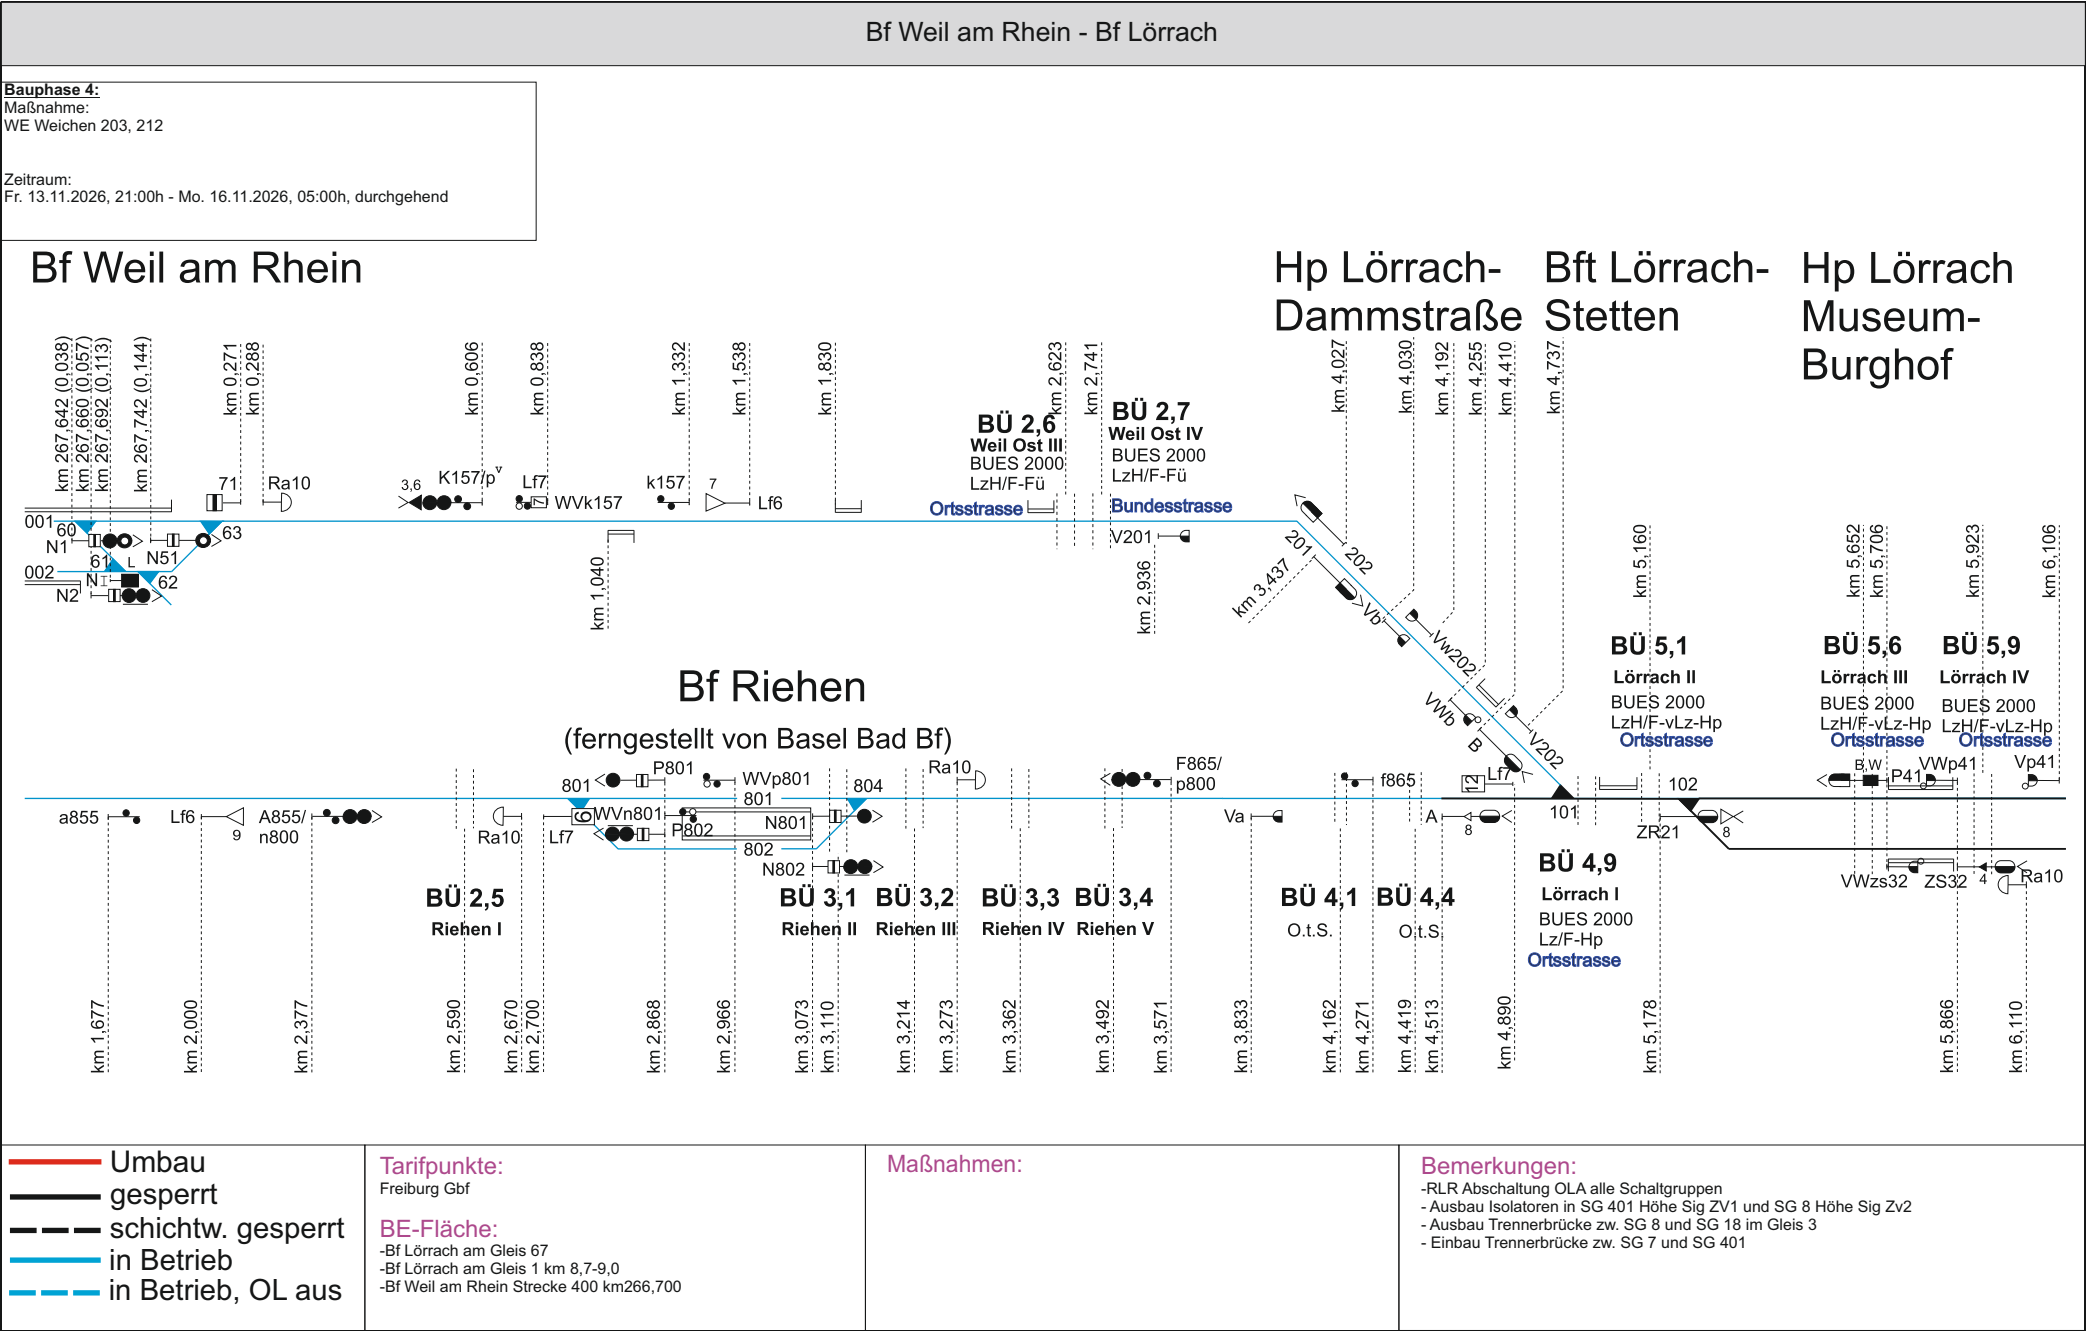
BE-Fläche:

- Bf Lörrach am Gleis 67
- Bf Lörrach am Gleis 1 km 8,7-9,0
- Bf Weil am Rhein Strecke 400 km266,700

Maßnahmen:

Bemerkungen:

-RLR Abschaltung OLA SG 1 (eingekürzt), SG 401 (eingekürzt)



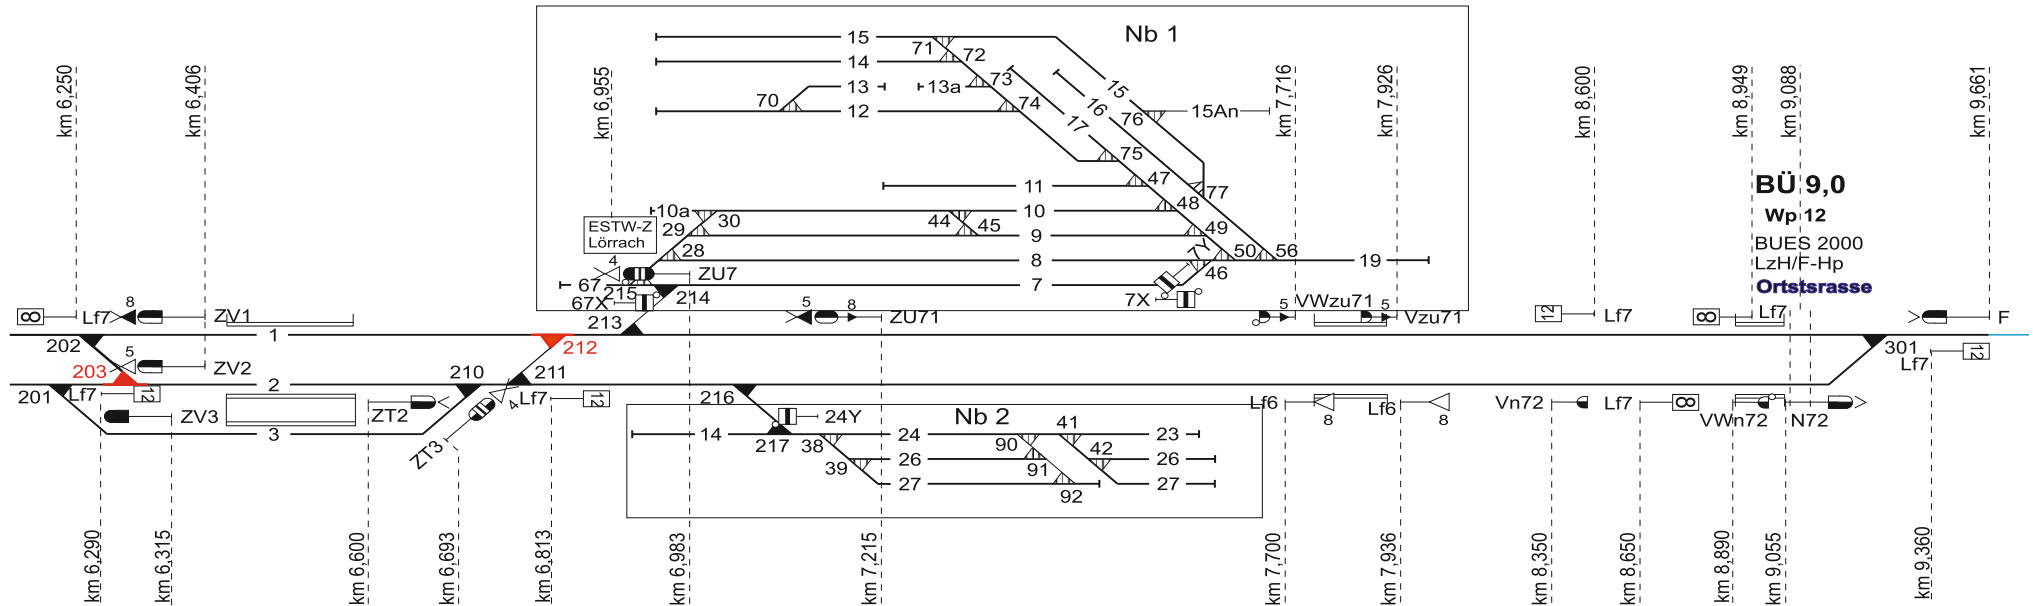
Hbf Lörrach






Bauphase 4:
Maßnahme:
WE Weichen 203, 212

Zeitraum:
Fr. 13.11.2026, 21:00h - Mo. 16.11.2026, 05:00h, durchgehend

Bft Lörrach Hbf
ESTW

Hp Lörrach-
Schwarzwaldstraße Bft Lörrach-
Haagen/Messe



	Umbau
	gesperrt
	schichtw. gesperrt
	in Betrieb
	in Betrieb, OL aus

Tarifpunkte:

Freiburg Gbf

BE-Fläche:

- Bf Lörrach am Gleis 67
- Bf Lörrach am Gleis 1 km 8,7-9,0
- Bf Weil am Rhein Strecke 400 km266,700

Maßnahmen:

Bemerkungen:

- RLR Abschaltung OLA alle Schaltgruppen
- Ausbau Isolatoren in SG 401 Höhe Sig ZV1 und SG 8 Höhe Sig Zv2
- Ausbau Trennerbrücke zw. SG 8 und SG 18 im Gleis 3
- Einbau Trennerbrücke zw. SG 7 und SG 401

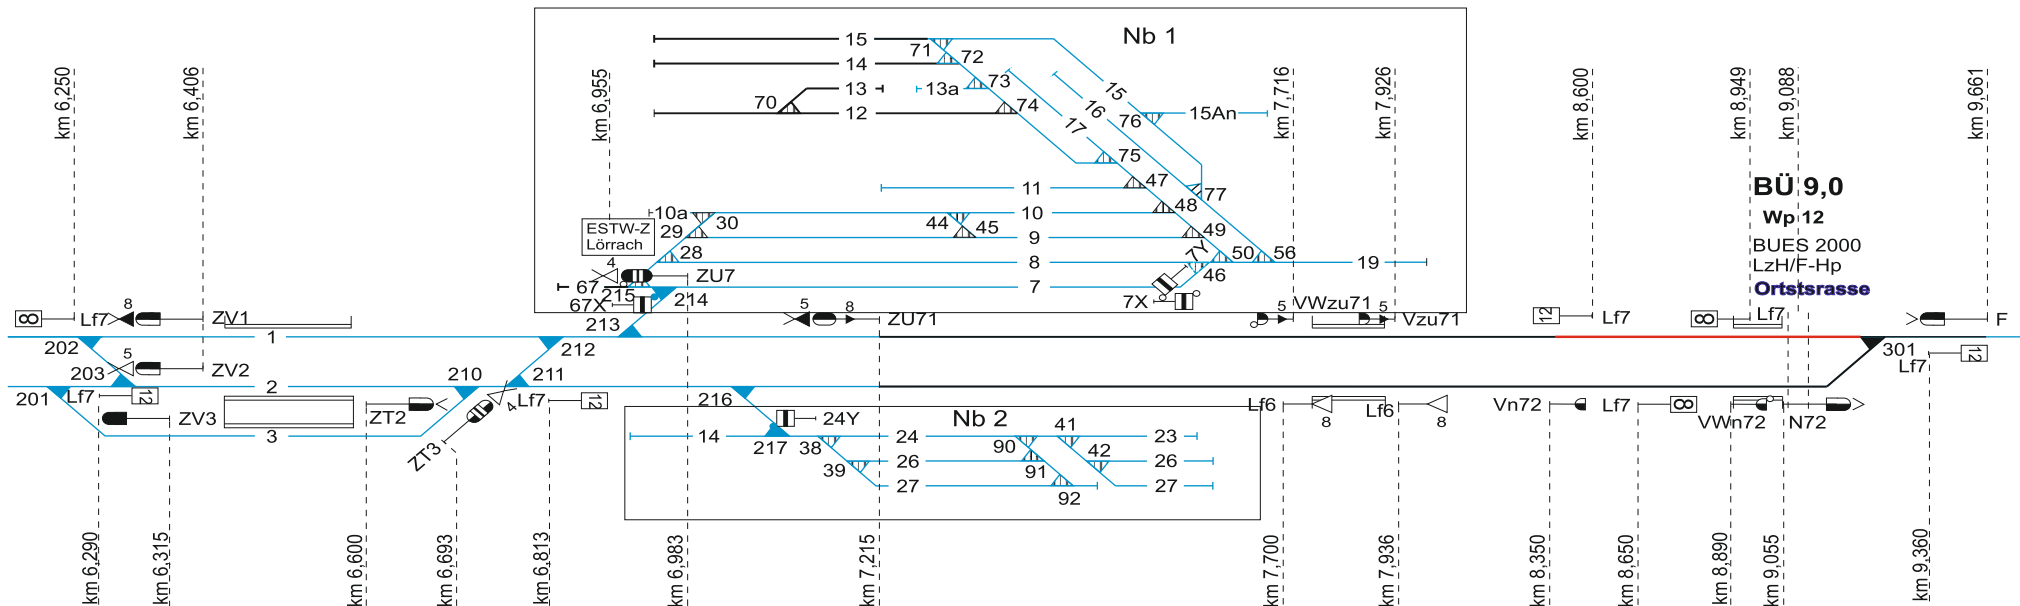
Hbf Lörrach






Bauphase 5:
Maßnahme:
GE Gleis 1, km 8,300 - 9,359 = 1009m

Zeitraum:
Mo. 16.11.2026, 05:00h - Mo. 23.11.2026, 05:00h, durchgehend

Hp Lörrach-
Schwarzwaldstraße Bft Lörrach-
Haagen/Messe

Bft Lörrach Hbf
ESTW



	Umbau
	gesperrt
	schichtw. gesperrt
	in Betrieb
	in Betrieb, OL aus

Tarifpunkte:

Freiburg Gbf

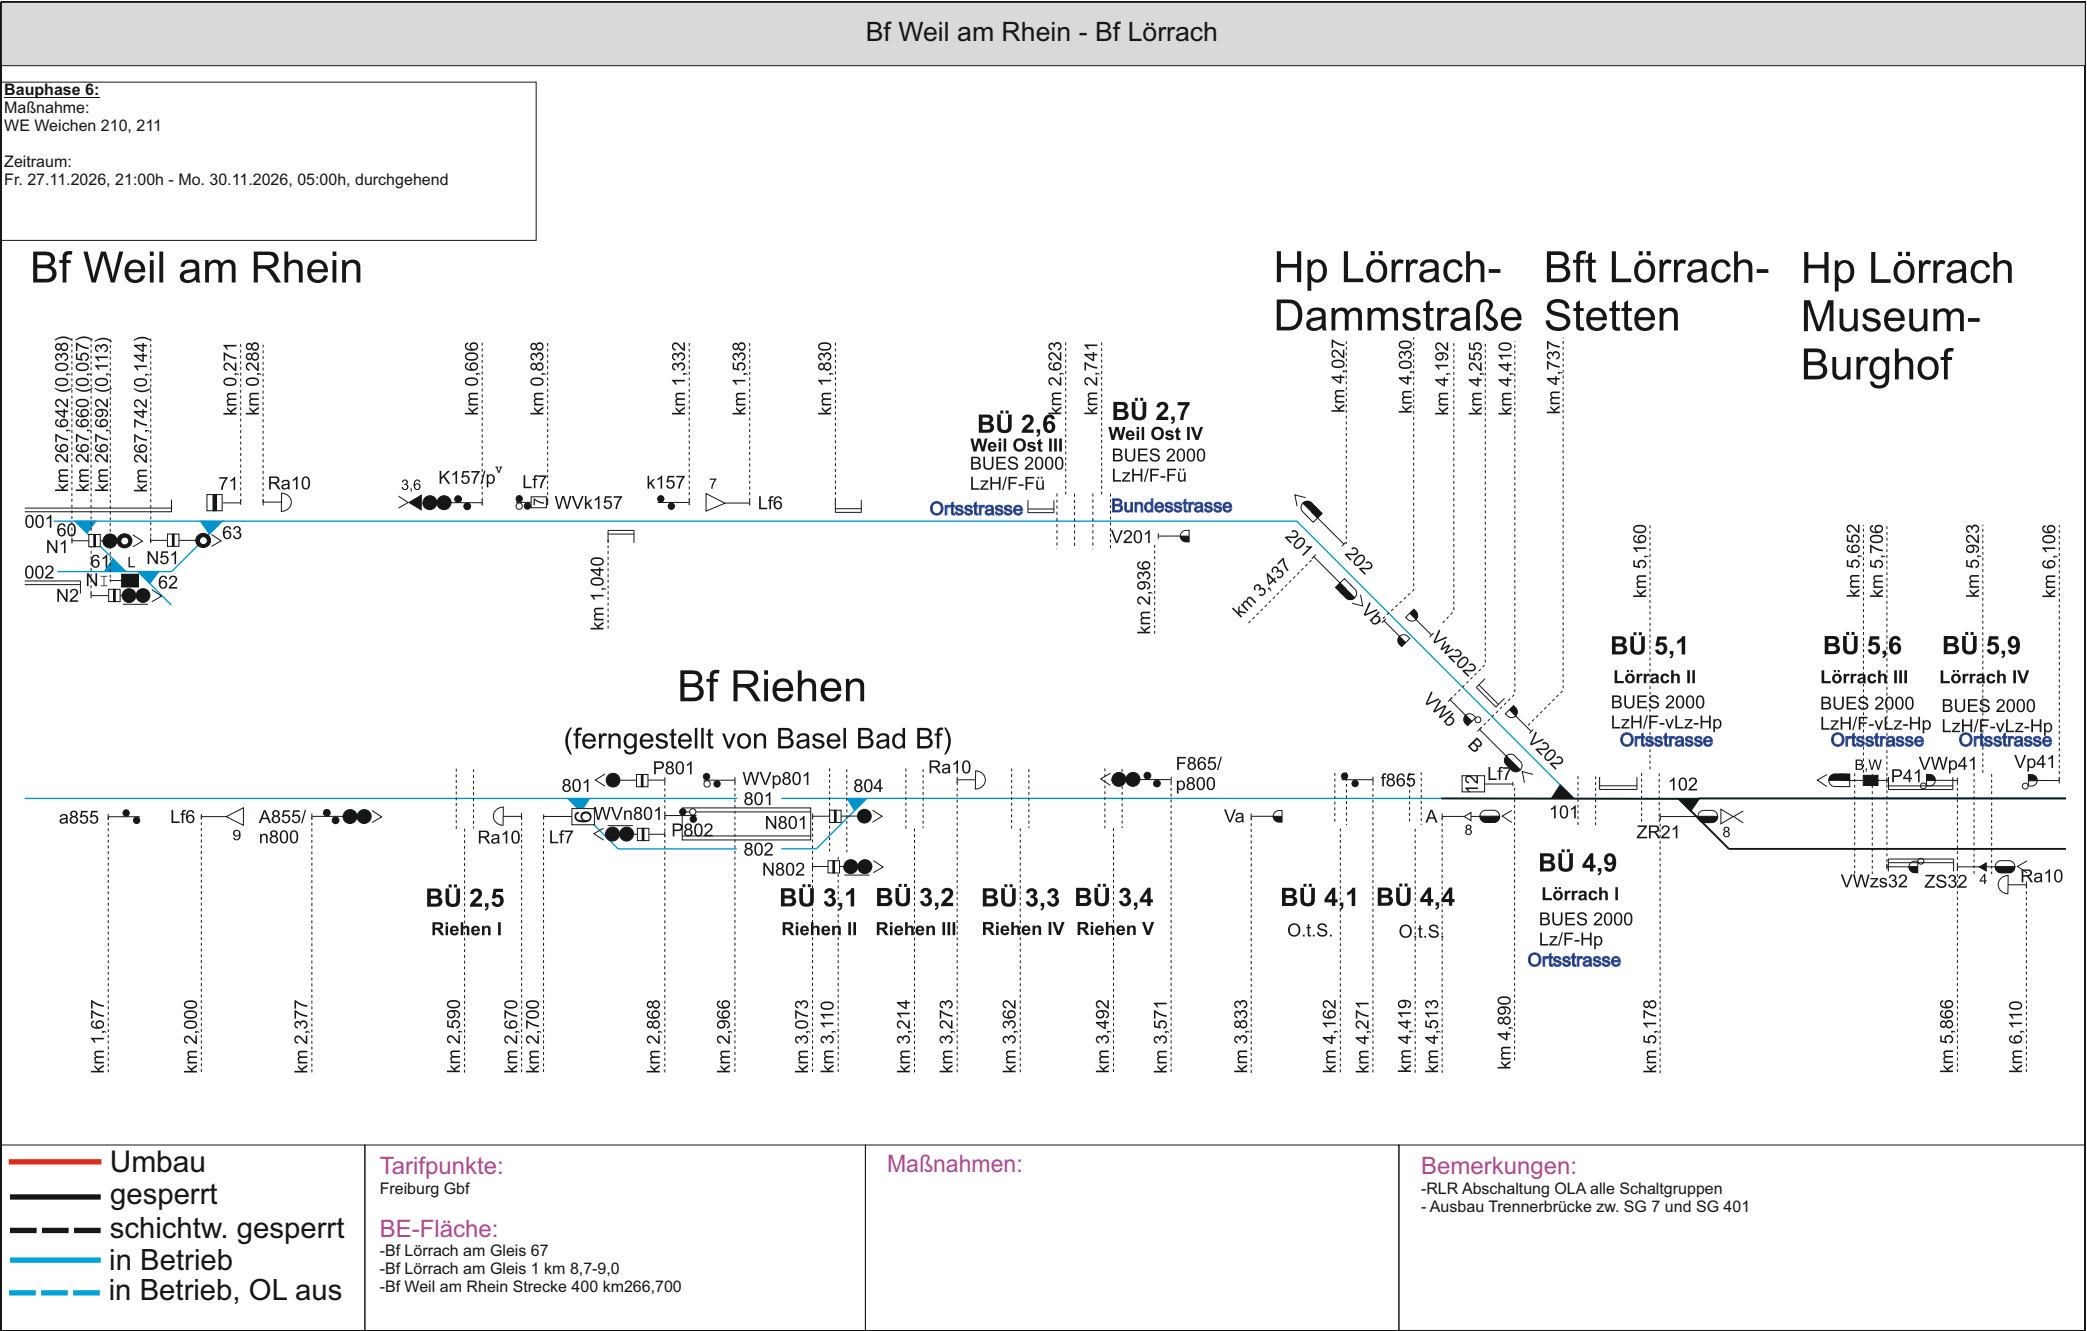
BE-Fläche:

- Bf Lörrach am Gleis 67
- Bf Lörrach am Gleis 1 km 8,7-9,0
- Bf Weil am Rhein Strecke 400 km266,700

Maßnahmen:

Bemerkungen:

- RLR Abschaltung OLA SG 3, 403, 408



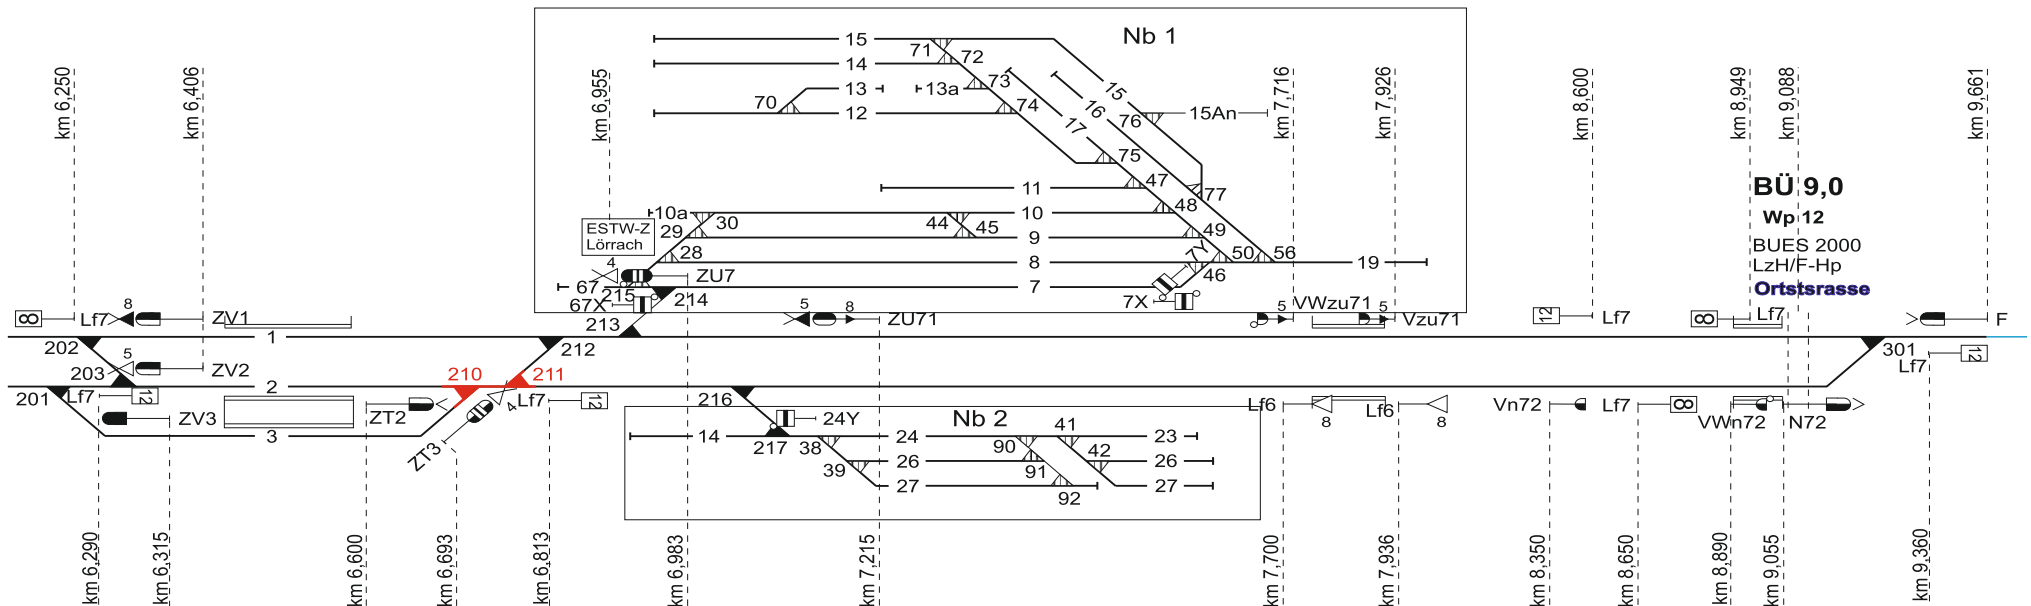
Hbf Lörrach






Bauphase 6:
Maßnahme:
WE Weichen 210, 211

Zeitraum:
Fr. 27.11.2026, 21:00h - Mo. 30.11.2026, 05:00h, durchgehend

Bft Lörrach Hbf
ESTW

Hp Lörrach-
Schwarzwaldstraße Bft Lörrach-
Haagen/Messe



	Umbau
	gesperrt
	schichtw. gesperrt
	in Betrieb
	in Betrieb, OL aus

Tarifpunkte:

Freiburg Gbf

BE-Fläche:

- Bf Lörrach am Gleis 67
- Bf Lörrach am Gleis 1 km 8,7-9,0
- Bf Weil am Rhein Strecke 400 km266,700

Maßnahmen:

Bemerkungen:

- RLR Abschaltung OLA alle Schaltgruppen
- Ausbau Trennerbrücke zw. SG 7 und SG 401

Bf Weil am Rhein - Bf Lörrach

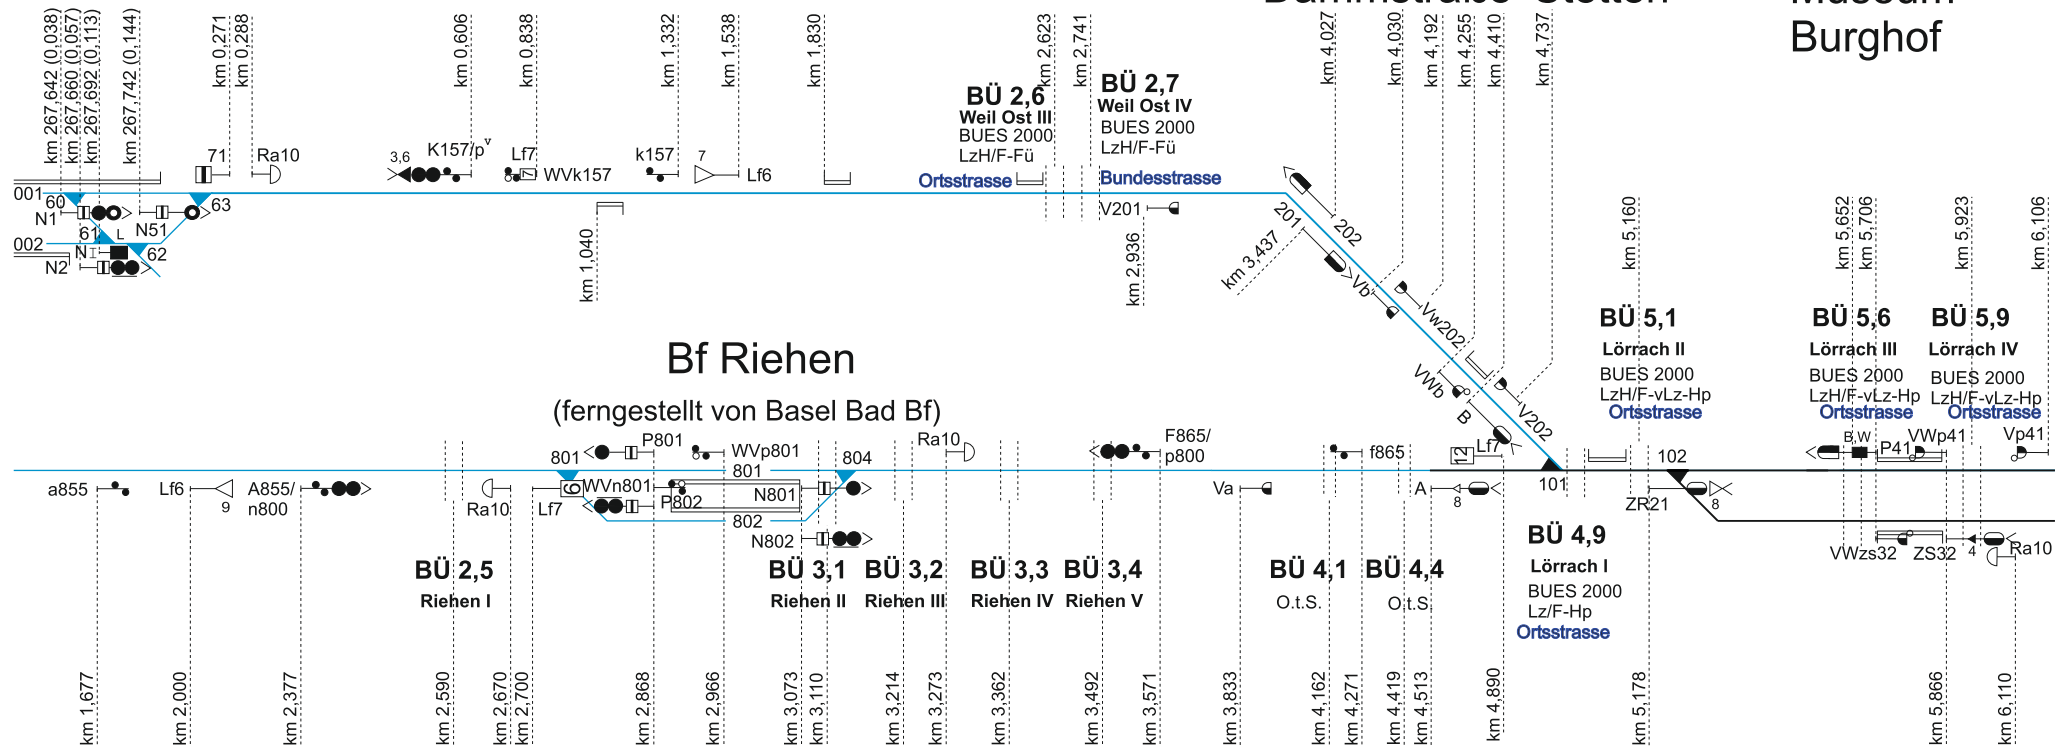
Bauphase 7:






Maßnahme:
Nacharbeiten

Zeitraum:

Di. 01.12.2026, 0:00h - Fr. 04.12.2026, 05:00h, schichtweise

Bf Weil am Rhein



	Umbau
	gesperrt
	schichtw. gesperrt
	in Betrieb
	in Betrieb, OL aus

Tarifpunkte:

Freiburg Gbf

BE-Fläche:

- Bf Lörrach am Gleis 67
- Bf Lörrach am Gleis 1 km 8,7-9,0
- Bf Weil am Rhein Strecke 400 km266,700

Maßnahmen:

Bemerkungen:

- RLR Abschaltung OLA alle Schaltgruppen

Hbf Lörrach

Bauphase 7:

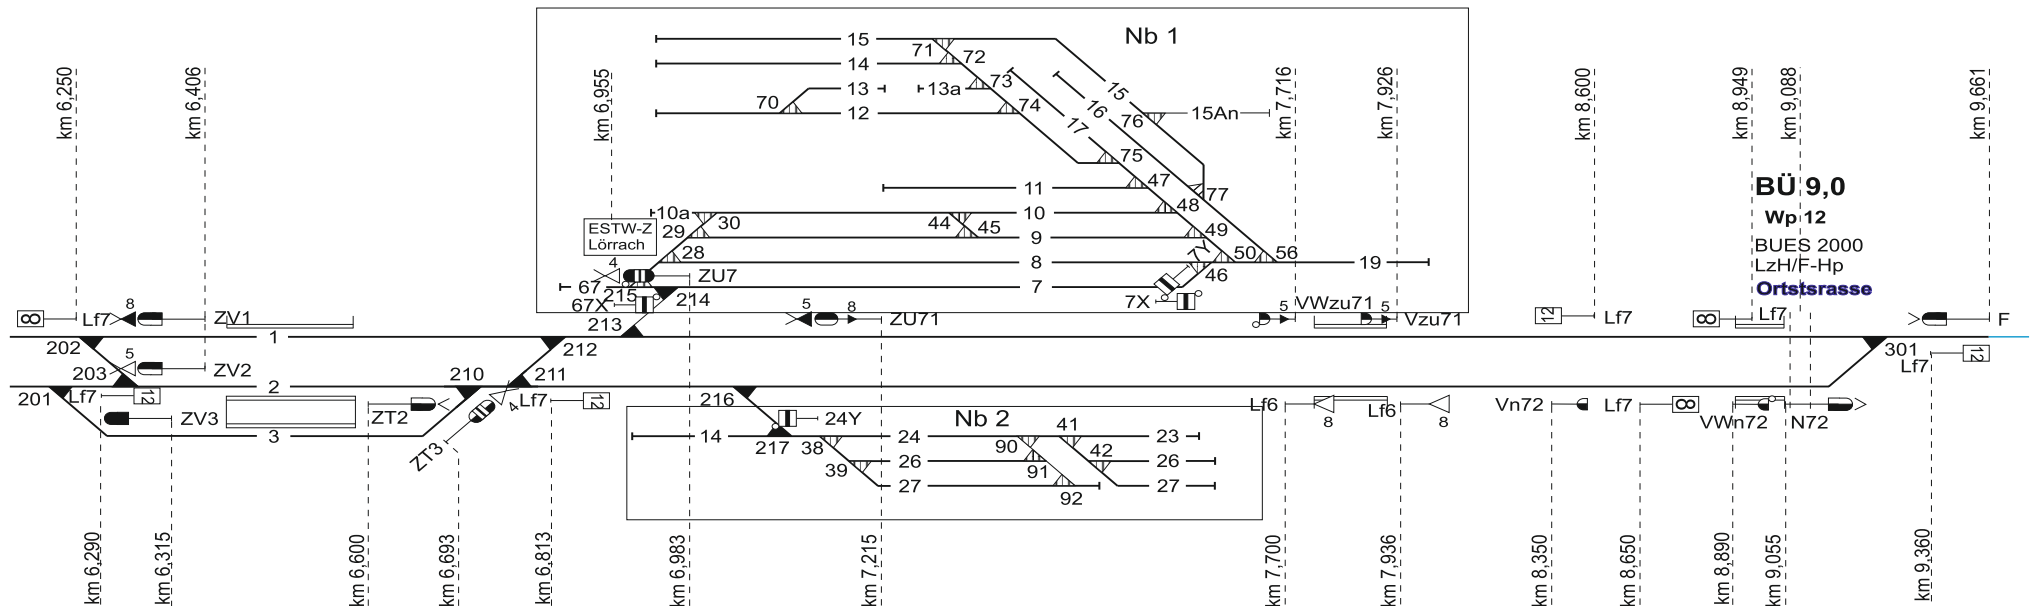
Maßnahme:
Nacharbeiten






Zeitraum:

Di. 01.12.2026, 0:00h - Fr. 04.12.2026, 05:00h, schichtweise

Bft Lörrach Hbf
ESTW

Hp Lörrach-
Schwarzwaldstraße Bft Lörrach-
Haagen/Messe



	Umbau
	gesperrt
	schichtw. gesperrt
	in Betrieb
	in Betrieb, OL aus

Tarifpunkte:

Freiburg Gbf

BE-Fläche:

- Bf Lörrach am Gleis 67
- Bf Lörrach am Gleis 1 km 8,7-9,0
- Bf Weil am Rhein Strecke 400 km266,700

Maßnahmen:

Bemerkungen:

- RLR Abschaltung OLA alle Schaltgruppen
