


gezeichnet unter P:\005176_6_Linie 2 Reiterstation42_Bauphasen\PHS\Zeichnungen\5176_06_VA5BP4.dwg
geplant am 13.02.2026

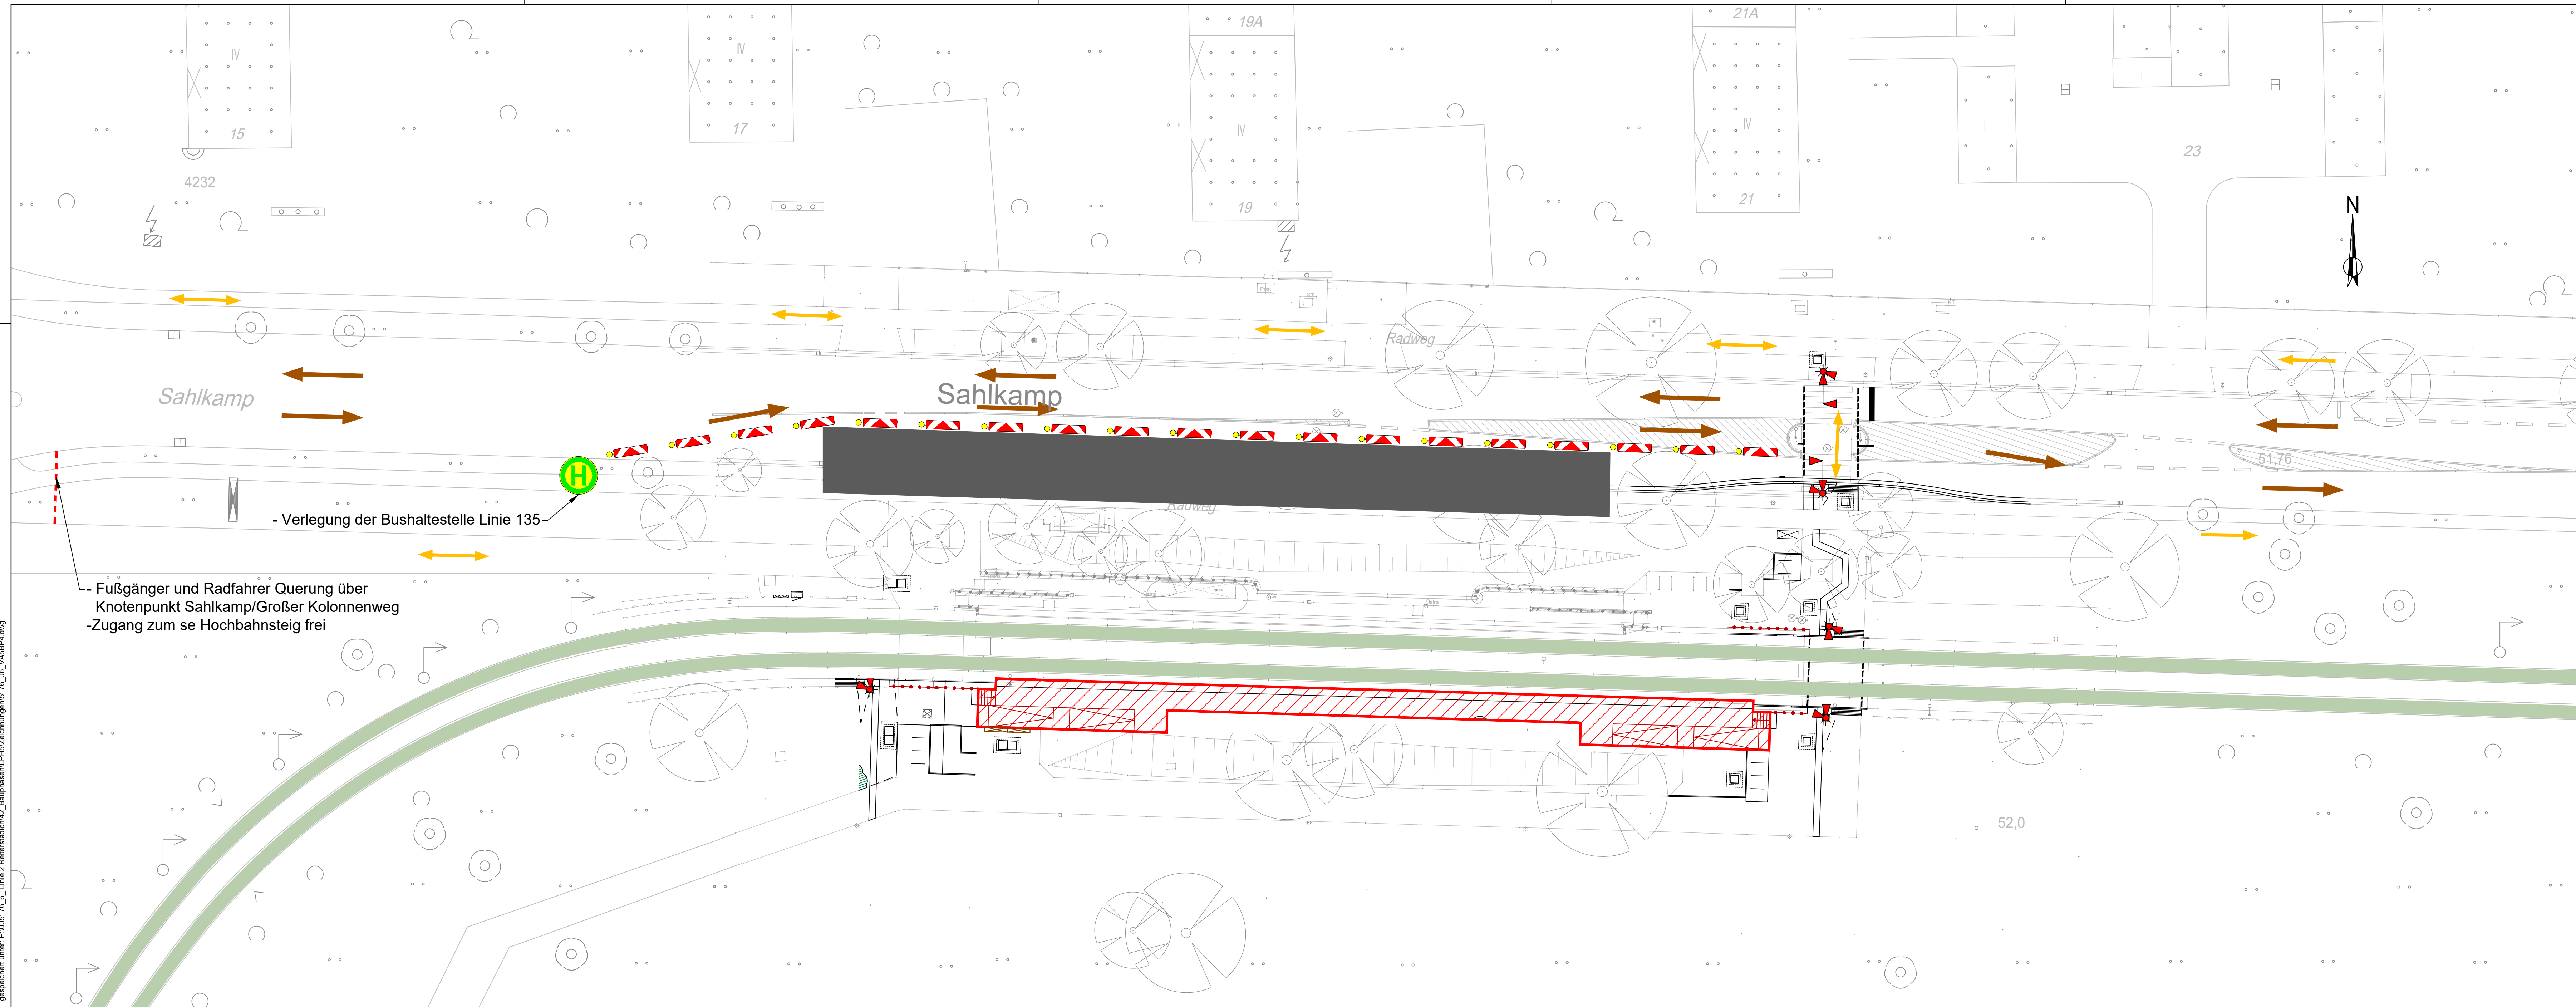

LEGENDE BESTAND			
	Gemeindegrenze		Zaun / Hecke
	Gemarkungsgrenze		Mauer / Stützmauer
	Flurgrenze		Geländer / Kette / Poller
	Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt		Laubwald / Nadelwald
	Lagefestpunkt		Grünland
	Höhenfestpunkt		Laubbaum / Nadelbaum
	Km-Stein		Busch / Baumstumpf
	Einfahrt, Tor / Eingang, Tür		Notrufsäule / Fahrkartenaufnahmegerät
	Denkmal / Brunnen		Sitzbank / Briefkasten
	Anschlagssäule / Werbetafel		Abfallerimer
	Verkehrszeichen / Haltestelle		Überdachung
	Lichtsignalanlage, Ampel		Lichtschacht, Notausstieg
	Beleuchtung, Laterne		Kanalschacht
	Uhr / Spiegel		Ablauf / Kastenrinne
	Unterflurhydrant / Oberflurhydrant		Gasschieber / Wasserschieber
	Schaltschrank / Kabelschacht		Abscheider
	Signalmast		Fahrlängungsmast
	Wandanker		Schienenverbinder, Gleisverbinder
	Schiene		Schiene
	Grenzzeichen		Koppelpule
	FE-Einbauten		Schild SH 7
	Prielbock		Prielbock

Vermessung TTB (Stand: 10/2024)
Stadtkarte 1:1000 (Stand: 11/2020)
© Landeshauptstadt Hannover
Bereich Geoinformation
Lizenz: CC-BY 4.0
ALKIS-Daten (Stand: 08/2023)
© Geobasis-DE/LGN ()
Lizenz: CC-BY 4.0
LGLN

Bezugssystem für die Lage:
Gauß-Krüger-Koordinatensystem
Lagesystem 100

Bezugssystem für die Höhe:
Deutsches Haupthöhenetz 2016
Höhenstatus 170

Legende

	Baufeld Leitungsabau		MIV / Verkehrslenkung
	Baufeld Gleisbau		Linienbusverkehr
	Baufeld Straßenbau		Rad- und Fußgänger
	Baufeld Hochbahnsteig		Anliegerverkehr
	Baufeld Ingenieurbauwerk		Rettungsfahrzeuge
	Baufeld Trassenräumung / Begrünung		Bake
	Baufeld Fahrlängung / Betriebstechnik		prov. Markierung
	Baufeld Bestandshaltestelle / Ersatzhaltestelle		prov. Zaun
	Ersatzhaltestelle fertig		prov. LSA
	BE-Fläche		Stadtbahnstranke
	Rückbau		Anpassung stationäre LSA
	Baustelle Parallel (xxx)		Bauweiche
	Stadtbahn		
	Stadtbahn neu		

Bauphase 4
Dauer: 2 Wochen, 02.11.2026 - 13.11.2026

Baurealisierung:
stadtauswärts:
- Restarbeiten am Hochbahnsteig
- TAB Begehung, VOB Abnahme, Mängelbeseitigung
- Inbetriebnahme stadtauswärtiger Hochbahnsteig am 13.11.2026
- Rückbau Absperrung stadtauswärtiger Bahnsteig

Verkehrseinschränkung:
Sahlkamp stadtein- und stadtauswärts:
- Einengung der stadtein- und stadtauswärtigen Fahrbahn
- je nach Baufortschritt Straßenbau Einschränkungen
Fußgänger und Radfahrer:
stadtauswärts:
- stadteinwärtige Sperrung, Querung auf stadteinwärtige Seite über LSA Knotenpunkt Sahlkamp/Großer Kolonnenweg bis neue Querung auf stadtauswärtige Seite Reiterstadion
Stadtbahn:
- Stadtbahn hält nur am stadteinwärtigen Bahnsteig
- Geschwindigkeitseinschränkung 10 bzw. 30 km/h

Ind.	Art der Änderung/Ergänzung	Datum	TransTecBau
------	----------------------------	-------	-------------

PNr.: 5176_6	Entwurfsverfasser
Bearb.: Mandalka	Hannover,
gez.: Kochan	02 / 2026
gepr.: 02 / 2026	
Zchg.: VA 5 BP 04-	

TransTecBau
TransTec Bauplanungs- und
Managementgesellschaft
Hannover mbH
Gradenstraße 20, D-30163 Hannover
T: 0511/3995-1000, F: 0511/3995-1299
e-mail: info@transtecbau.de
Internet: www.transtecbau.de

Projekt: geprüft:	Projektbeteiligte Hannover,	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
----------------------	--------------------------------	--

Projekt: 1239.02 Blatt:	Vorhabenträger Hannover,	infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH
----------------------------	-----------------------------	---

Anl.: Blatt:	Stadtbahnstrecke B-Nord Grunderneuerung Hochbahnsteig Reiterstadion - Ausführungsplanung - Bauphasenplan 4	
Größe: B: 42 cm L: 116 cm F: 0,49 m²		
42_Bauphasen		
M 1: 250		

NACHRICHTLICH 13.02.2026
