Baustellennr.: T.016073522
T.016078372
T.016085121

Stand: 19.08.2025

Bearbeiter: R. Dubbi

Strecke: 2000 - Münster (W) Gbf - Münster (W) Gbf

Baustelle: Gbf (W) Münster
Abstellanlage

Beschreibung:

Gleis 125 - Weichenherstellung W85b, Rb/Ls W81
- W85b - EW 49-190-1:7,5

Gleis 156 – Weichenherstellung W52b
- W52b - EW49-190-1:9

Gleis 140 – Weichenerneuerung W84 + GE u Rb/Ls W61, W62, W82
- W84 - EW49-190-1:9
- 453 m GE
- 2x Herstellung Gleisüberquerungen am Karrweg

Gleis 149 Rb/Ls W85
- Trassierungsänderung
- 160 m Gleiserneuerung / Gleisneubau
- Gleislage erhöhen mit KG2-Aufschichtungen

Rb Gleis 141 u Rb W63
- 240 m Gleisrückbau

Gleis 142 GE u PSS, Rb/Ls W83
- Gleiserneuerung und Teilneubau inkl. Herstellung PSS
- 500 m GE / Gleisneubau
- 226 m PSS
- 3x Herstellung Gleisüberquerungen am Karrweg

Rb Gleis 149
- 288 m Gleisrückbau

Kabeltiefbau
- 54 m Querungen herstellen
- 17x Kabelaufbauschächte herstellen
- 1100 m KK Gr. I / II i. F. herstellen

VORABZUG
25.08.2025

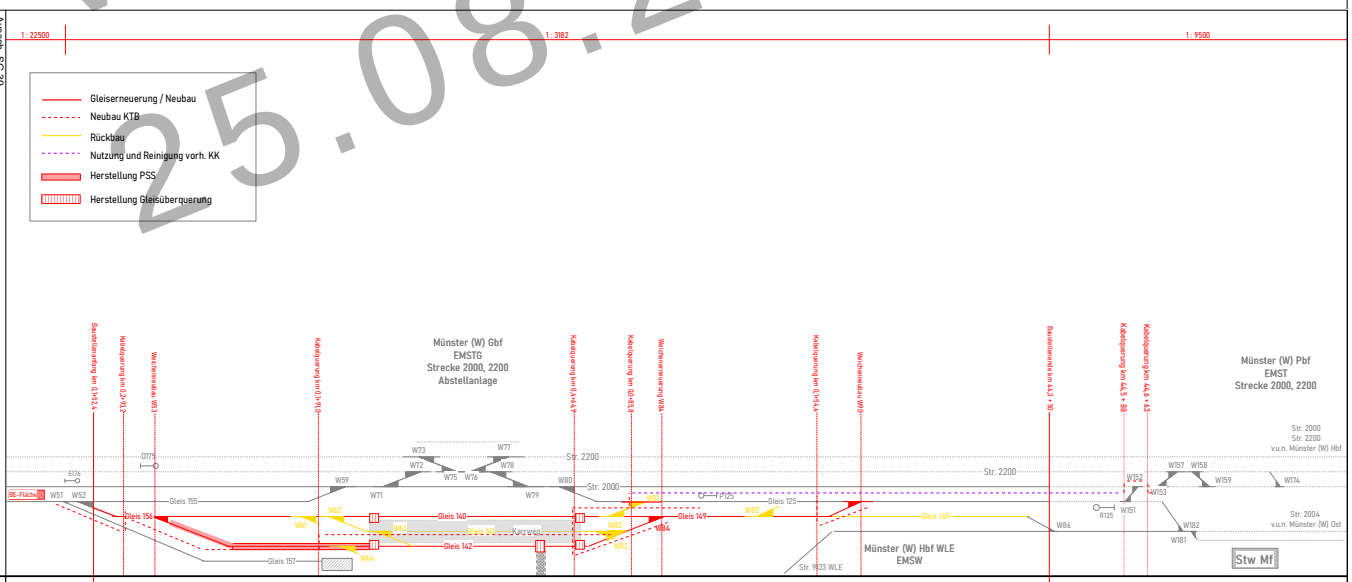

Datum	Uhrzeit	Sp Ngl, VzG 2000, Grz. 80 - Gleisende < WLE km 44,625	Sp Ngl, VzG 2000, Hauptsignal E.176 - Hauptsignal P125, Stopfgang 1- P125 bis E176	Sp Ngl, VzG 2000, Hauptsignal E.176 - Grz. 174, OLA Arbeiten	Sp Ngl, VzG 2000, Grz. 80 - Gleisende < WLE km 44,625	Sp Ngl, VzG 2200, Spl W158 - Grz. W159, OLA Arbeiten	Sp Ngl, VzG 2200, Spl W153 - Grz. W159, OLA Arbeiten	Sp Ngl, VzG 2000, Grz. 80 - Gleisende < WLE km 44,625, KTB, LST, Anbindung an Stellwerk MF	Sp Ngl, VzG 2000, Hauptsignal P125 - Hauptsignal R125, Stopfgang 2- P125 bis R125	Sp Ngl, VzG 2000, Spl W71 - Grz. 174, OLA Arbeiten	Sp Ngl, VzG 2200, km 67,15 - Spl W157, OLA Arbeiten	Sp Ngl, VzG 2200, Spl W153 - Grz. W158, OLA Arbeiten	Sp Ngl, VzG 2200, Spl W153 - Spl W159, OLA Arbeiten	Sp Ngl, VzG 2200, Spl W158 - Spl W159, OLA Arbeiten	Sp Ngl, VzG 2200, Spl W72 - Spl W157, OLA Arbeiten	Sp Ngl, VzG 2200, Spl W78 - Spl W79, OLA Arbeiten	Sp Ngl, VzG 2000, Grz. 151 - Gleisende < WLE km 44,625, GE Gl. 140 u 142, Rb/Ls W81 W82, Herst. W90, OL, LST, DUA	Sp Ngl, VzG 2000, Grz 80 - Grz. 151, Rb W85, Herstellung W90, Anschluss an Gl. 125, Ls W81	Ausch. SG 17 geöffneter Bereich, Grz. 80 - Grz. 151	Ausch. SG 11	Ausch. SG 39
Fr. 30.01.2026	6																					
	12																					
	18																					
	24																					
Sa. 31.01.2026	6																					
	12																					
	18																					
	24																					
So. 01.02.2026	6																					
	12																					
	18																					
	24																					
Mo. 02.02.2026	6																					
	12																					
	18																					
	24																					
Di. 03.02.2026	6																					
	12																					
	18																					
	24																					
Mi. 04.02.2026	6																					
	12																					
	18																					
	24																					
Do. 05.02.2026	6																					
	12																					
	18																					
	24																					

Fr, 06.02.2026
Sa, 07.02.2026
So, 08.02.2026
Mo, 09.02.2026
Di, 10.02.2026
Mi, 11.02.2026
Do, 12.02.2026
Fr, 13.02.2026
Sa, 14.02.2026
So, 15.02.2026
Mo, 16.02.2026
Di, 17.02.2026
Mi, 18.02.2026
Do, 19.02.2026
6
12
18
24

Fr, 20.02.2026
6
12
18
24
Sa, 21.02.2026
6
12
18
24
So, 22.02.2026
6
12
18
24
Mo, 23.02.2026
6
12
18
24
Di, 24.02.2026
6
12
18
24
Mi, 25.02.2026
6
12
18
24
Do, 26.02.2026
6
12
18
24
Fr, 27.02.2026
6
12
18
24
Sa, 28.02.2026
6
12
18
24
So, 01.03.2026
6
12
18
24
Mo, 02.03.2026
6
12
18
24
Di, 03.03.2026
6
12
18
24
Mi, 04.03.2026
6
12
18
24
Do, 05.03.2026
6
12
18
24

Fr, 06.03.2026
6
12
18
24
Sa, 07.03.2026
6
12
18
24
So, 08.03.2026
6
12
18
24
Mo, 09.03.2026
6
12
18
24
Di, 10.03.2026
6
12
18
24
Mi, 11.03.2026
6
12
18
24
Do, 12.03.2026
6
12
18
24
Fr, 13.03.2026
6
12
18
24
Sa, 14.03.2026
6
12
18
24
So, 15.03.2026
6
12
18
24
Mo, 16.03.2026
6
12
18
24
Di, 17.03.2026
6
12
18
24
Mi, 18.03.2026
6
12
18
24
Do, 19.03.2026
6
12
18
24

Fr, 20.03.2026
6
12
18
24
Sa, 21.03.2026
6
12
18
24
So, 22.03.2026
6
12
18
24
Mo, 23.03.2026
6
12
18
24
Di, 24.03.2026
6
12
18
24
Mi, 25.03.2026
6
12
18
24
Do, 26.03.2026
6
12
18
24
Fr, 27.03.2026
6
12
18
24
Sa, 28.03.2026
6
12
18
24
So, 29.03.2026
6
12
18
24
Mo, 30.03.2026
6
12
18
24
Di, 31.03.2026
6
12
18
24
Mi, 01.04.2026
6
12
18
24
Do, 02.04.2026
6
12
18
24
Fr, 03.04.2026
6
12
18
24
Sa, 04.04.2026
6
12
18
24

6 12 18 24

So. 05.04.2026 | Mo. 06.04.2026 | Di. 07.04.2026 | Mi. 08.04.2026 | Do. 09.04.2026 | Fr. 10.04.2026 | Sa. 11.04.2026 | So. 12.04.2026 | Mo. 13.04.2026 | Di. 14.04.2026 | Mi. 15.04.2026 | Do. 16.04.2026 | Fr. 17.04.2026 | Sa. 18.04.2026 | So. 19.04.2026 | Mo. 20.04.2026

Di. 21.04.2026
6
12
18
24
Mi. 22.04.2026
6
12
18
24
Do. 23.04.2026
6
12
18
24
Fr. 24.04.2026
6
12
18
24
Sa. 25.04.2026
6
12
18
24
So. 26.04.2026
6
12
18
24
Mo. 27.04.2026
6
12
18
24
Di. 28.04.2026
6
12
18
24
Mi. 29.04.2026
6
12
18
24
Do. 30.04.2026
6
12
18
24
Fr. 01.05.2026
6
12
18
24
Sa. 02.05.2026
6
12
18
24
So. 03.05.2026
6
12
18
24
Mo. 04.05.2026
6
12
18
24
Di. 05.05.2026
6
12
18
24
Mi. 06.05.2026
6
12
18
24

Do. 07.05.2026
Fr. 08.05.2026
Sa. 09.05.2026
So. 10.05.2026
Mo. 11.05.2026
Di. 12.05.2026
Mi. 13.05.2026
Do. 14.05.2026
Fr. 15.05.2026
Sa. 16.05.2026
So. 17.05.2026
Mo. 18.05.2026
Di. 19.05.2026
Mi. 20.05.2026
Do. 21.05.2026

VORABZUG
25.08.2025

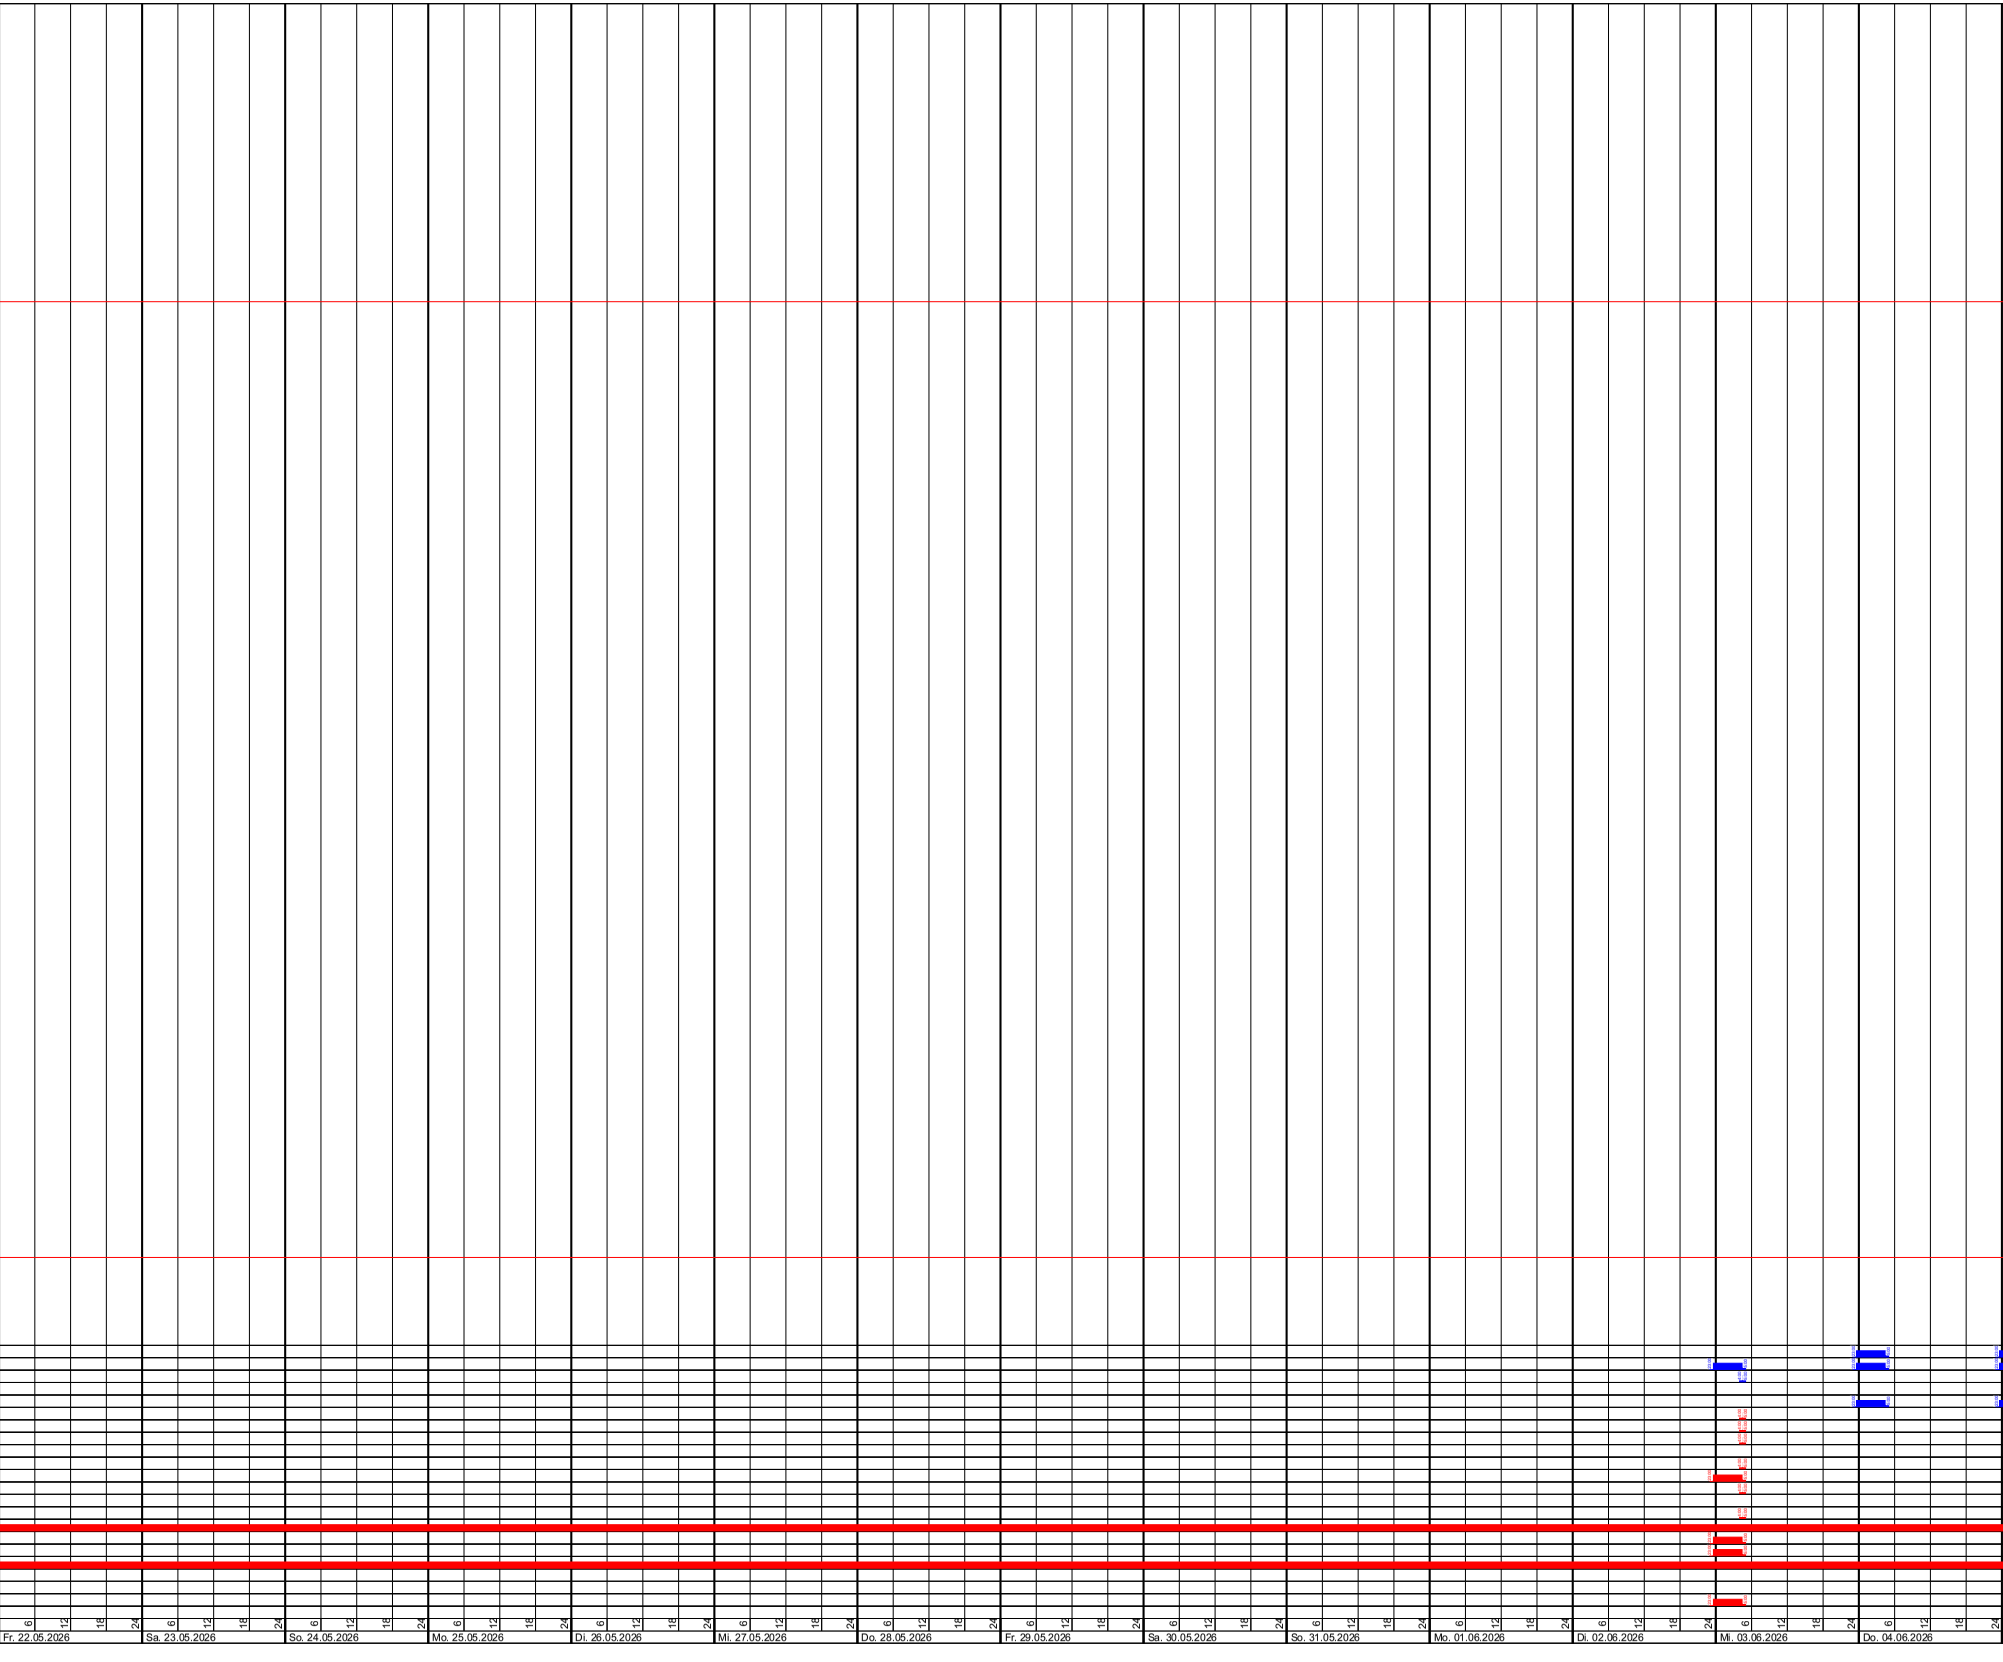
6 12 18 24
Fr. 22.05.2026
Sa. 23.05.2026
So. 24.05.2026
Mo. 25.05.2026
Di. 26.05.2026
Mi. 27.05.2026
Do. 28.05.2026
Fr. 29.05.2026
Sa. 30.05.2026
So. 31.05.2026
Mo. 01.06.2026
Di. 02.06.2026
Mi. 03.06.2026
Do. 04.06.2026

Fr. 05.06.2026
Sa. 06.06.2026
So. 07.06.2026
Mo. 08.06.2026
Di. 09.06.2026
Mi. 10.06.2026
Do. 11.06.2026
Fr. 12.06.2026
Sa. 13.06.2026
So. 14.06.2026
Mo. 15.06.2026
Di. 16.06.2026
Mi. 17.06.2026
Do. 18.06.2026
Fr. 19.06.2026
Sa. 20.06.2026
6
12
18
24

6 12 18 24

So. 21.06.2026 | Mo. 22.06.2026 | Di. 23.06.2026 | Mi. 24.06.2026 | Do. 25.06.2026 | Fr. 26.06.2026 | Sa. 27.06.2026 | So. 28.06.2026 | Mo. 29.06.2026 | Di. 30.06.2026 | Mi. 01.07.2026 | Do. 02.07.2026 | Fr. 03.07.2026 | Sa. 04.07.2026 | So. 05.07.2026

Mo. 06.07.2026
6
12
18
24
Di. 07.07.2026
6
12
18
24
Mi. 08.07.2026
6
12
18
24
Do. 09.07.2026
6
12
18
24
Fr. 10.07.2026
6
12
18
24
Sa. 11.07.2026
6
12
18
24
So. 12.07.2026
6
12
18
24
Mo. 13.07.2026
6
12
18
24
Di. 14.07.2026
6
12
18
24
Mi. 15.07.2026
6
12
18
24
Do. 16.07.2026
6
12
18
24
Fr. 17.07.2026
6
12
18
24
Sa. 18.07.2026
6
12
18
24
So. 19.07.2026
6
12
18
24
Mo. 20.07.2026
6
12
18
24
Di. 21.07.2026
6
12
18
24

Mi. 22.07.2026
6
12
18
24
Do. 23.07.2026
6
12
18
24
Fr. 24.07.2026
6
12
18
24
Sa. 25.07.2026
6
12
18
24
So. 26.07.2026
6
12
18
24
Mo. 27.07.2026
6
12
18
24
Di. 28.07.2026
6
12
18
24
Mi. 29.07.2026
6
12
18
24
Do. 30.07.2026
6
12
18
24
Fr. 31.07.2026
6
12
18
24
Sa. 01.08.2026
6
12
18
24
So. 02.08.2026
6
12
18
24
Mo. 03.08.2026
6
12
18
24
Di. 04.08.2026
6
12
18
24
Mi. 05.08.2026
6
12
18
24
Do. 06.08.2026
6
12
18
24

VORABZUG
25.08.2025

erstellt mit SOG 7.2.1-17980

Name	Anzahl

Legende:

DB Fachdienste — DB Fachdienste

Baustellennr.: T.016073522
T.016078372
T.016085121

Strecke: 2000 - Münster (W) Gbf - Münster (W) Gbf

Baustelle: Gbf (W) Münster
Abstellanlage

BS:

Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 01.02.2026 bis zum 20.08.2026

durch

Rahmenplan erstellt:

Aufgestellt von:

Bearbeitungsvermerk des Unternehmers

Zugestimmt:

Bearbeitet	Dubbi
Gezeichnet	Dubbi
Geprüft	Meyer
Maßstab	

GTU
