VET03 - Auszug wesentliche Meilensteine Lean Terminplan und Steuerungsterminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	**Vergabe / Auftragserteilung**	**0 Tage**	**Sam 13.06.26**	**Sam 13.06.26**		
2	***W&M KGR 400 (gem. Steuerungsterminplan)***	**333 Tage?**	**Fre 12.06.26**	**Die 21.09.27**		
3	VET03 RLT	150 Tage?	Fre 12.06.26	Don 07.01.27		
4	Abruf	0 Tage	Fre 31.07.26	Fre 31.07.26		
5	Erste Freigabe W&M	0 Tage	Fre 25.09.26	Fre 25.09.26		
6	**Starttermine Gewerke (gem. LEAN-TP)**	**696 Tage**	**Fre 27.11.26**	**Fre 27.07.29**		
7	RLT Ring 1 (RLT Einbauteile Dachfläche)	15 Tage	Fre 27.11.26	Don 17.12.26		
8	RLT Ring 2 (RLT Einbauteile Dachfläche)	23 Tage	Fre 11.12.26	Die 12.01.27		
9	**Meilensteine (gem. LEAN-TP)**	**531 Tage**	**Fre 16.07.27**	**Fre 27.07.29**		
10	Musterlabor 3.OG fertig	0 Tage	Mon 22.11.27	Mon 22.11.27		
11	Fertigstellung Ausbau Ring 1 und Ring 2	1 Tag	Die 03.04.29	Die 03.04.29		
12	**Inbetriebnahme/Qualifizierung 1.BA/Abnahmen (gem. STP)**	**500 Tage**	**Fre 16.07.27**	**Don 14.06.29**		
13	**Inbetriebnahme**	**386 Tage**	**Die 02.11.27**	**Die 24.04.29**		
14	RLT	60 Tage	Fre 22.12.28	Don 15.03.29		
15	Gebäudeautomation	80 Tage	Fre 15.12.28	Don 05.04.29		
16	Blower Door Test	80 Tage	Mon 08.05.28	Fre 25.08.28		
17	Wirkprinzipprüfung	10 Tage	Fre 27.04.29	Don 10.05.29		
18	1:1 Test GA	30 Tage	Fre 27.04.29	Don 07.06.29		
19	**Behördliche Abnahmen und Abnahmen nach Prüfverordnung**	**33 Tage**	**Fre 06.04.29**	**Die 22.05.29**		
24	Abnahmereife Fertigstellung	0 Tage	Die 22.05.29	Die 22.05.29		
25	Probebetrieb	15 Tage	Mon 11.06.29	Fre 29.06.29		
26	Mängelbeseitigung	60 Tage	Mon 07.05.29	Fre 27.07.29		
27	Einweisungen	50 Tage	Fre 27.04.29	Don 05.07.29		
28	Gesamtfertistellung inkl. Inbetriebnahme	1 Tag	Don 05.07.29	Don 05.07.29		
29	**Revisionsunterlagen**	**472 Tage**	**Fre 16.07.27**	**Mon 07.05.29**		
30	VET+VEL	120 Tage	Mit 13.12.28	Die 29.05.29		

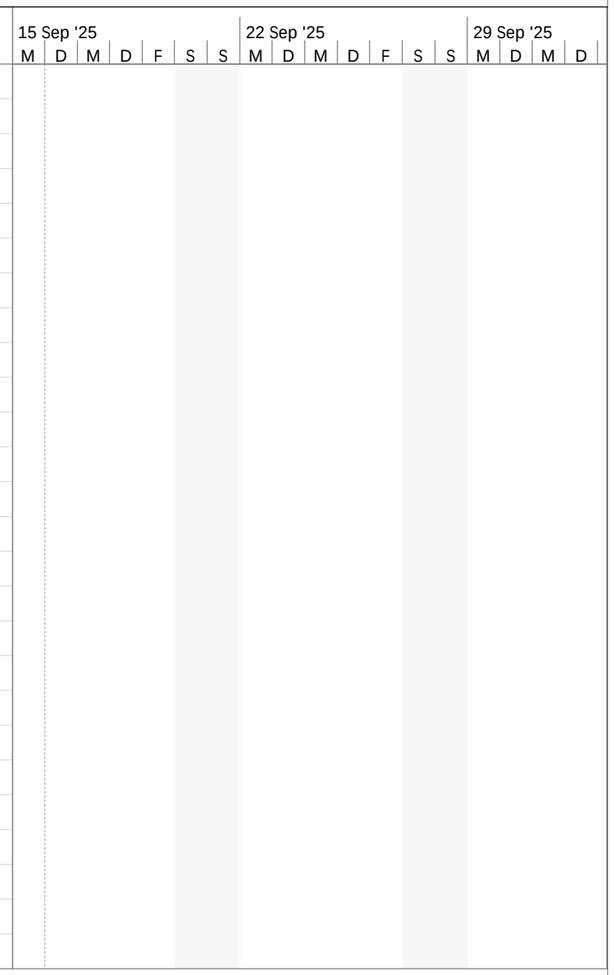

Projekt: 330_23_009_TGA_TP_2
Datum: Die 25.11.25

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	
