Strecke 1120, km 007,203

unverbindlicher Bauablaufplan des AG

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Vertragsbeginn	1 Tag	Mon 23.03.26	Mon 23.03.26	
2	physischer Baubeginn Baustelle	1 Tag	Mit 01.07.26	Mit 01.07.26	
3	La 70, 14.09.-29.09.	14,13 Tage	Mon 14.09.26	Die 29.09.26	
4	**Arbeitsvorbereitung und Planung AN**	**70 Tage**	**Fre 03.04.26**	**Die 23.06.26**	**1EA+10 Tage**
5	BE-Plan, Bauzeitenplan	5 Tage	Fre 03.04.26	Don 09.04.26	
6	Logistik-, Havarie-, Beleuchtungs-, Montage-, Demontagekonzept	15 Tage	Fre 03.04.26	Die 21.04.26	
7	Ausführungsplanung Wasserhaltung	10 Tage	Fre 03.04.26	Mit 15.04.26	
8	Ausführungsplanung/Werkstattplanung Bauwerk und Baubehelfe	40 Tage	Fre 03.04.26	Die 19.05.26	
9	Prüfung und Genehmigung durch AG	30 Tage	Mit 20.05.26	Die 23.06.26	5;6;7;8
10	**Baustraßen, BE-Flächen**	**33 Tage**	**Don 02.07.26**	**Sam 08.08.26**	**2**
11	Baustraßen	15 Tage	Don 02.07.26	Sam 18.07.26	
12	Grabenverrohrung bahnrechts	2 Tage	Sam 18.07.26	Die 21.07.26	11
13	BE-Flächenbefestigung	10 Tage	Die 21.07.26	Sam 01.08.26	12
14	Baustelle einrichten (Container, Ver- und Entsorgung, ...)	5 Tage	Sam 01.08.26	Fre 07.08.26	13
15	Vermessung der Gleislage (Nullmessung)	1 Tag	Fre 07.08.26	Sam 08.08.26	14
16	**Einrichtung der Baubehelfe**	**32 Tage**	**Sam 08.08.26**	**Mon 14.09.26**	**10**
17	Einbringung der Spundwände für die Startgrube- und Zielgrube	10 Tage	Sam 08.08.26	Don 20.08.26	
18	Einbau Gurtung, Aussteifung	5 Tage	Don 20.08.26	Die 25.08.26	17
19	Bodenaushub Start- und Zielgrube	3 Tage	Mit 26.08.26	Fre 28.08.26	18
20	Einbau Betonsohle	3 Tage	Sam 29.08.26	Die 01.09.26	19
21	Einbau Pressenwiderlager, Schweißergrube, Wanddurchführungen	5 Tage	Die 01.09.26	Mon 07.09.26	20
22	Abnahme der Baugruben durch Prüfingenieur	1 Tag	Mon 07.09.26	Die 08.09.26	21
23	ggf. Erdhinterfüllung der Startgrube (Pressenwiderlager)	2 Tage	Die 08.09.26	Don 10.09.26	22
24	Vorpressgerät einrichten	3 Tage	Don 10.09.26	Mon 14.09.26	23
25	**Rohrvortrieb**	**15 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Don 01.10.26**	**16**
26	gesteuerter Pilotrohrvortrieb	1 Tag	Mon 14.09.26	Die 15.09.26	
27	Vortrieb Produktrohr Nr. 1, Bergung Pilotrohre auf Zielseite	1 Tag	Die 15.09.26	Mit 16.09.26	26
28	Rohrstoß schweißen, prüfen, externe Schweißnahtprüfg., Kor-schutz außen	3 Tage	Mit 16.09.26	Sam 19.09.26	27
29	Vortrieb Produktrohr Nr. 2, Bergung Pilotrohre auf der Zielseite	1 Tag	Sam 19.09.26	Mon 21.09.26	28
30	Rohrstoß schweißen, prüfen, externe Schweißnahtprüfg., Kor-schutz außen	3 Tage	Mon 21.09.26	Don 24.09.26	29
31	Vortrieb Produktrohr Nr. 3, Bergung Pilotrohre auf der Zielseite	1 Tag	Don 24.09.26	Fre 25.09.26	30
32	Rohrstoß schweißen, prüfen, externe Schweißnahtprüfg., Kor-schutz außen	1 Tag	Fre 25.09.26	Sam 26.09.26	31
33	Vortrieb Produktrohr Nr. 4, Bergung Pilotrohre auf Zielseite, Zurückziehen Bohrtechnik	1 Tag	Sam 26.09.26	Mon 28.09.26	32
34	Rückbau Pressbohrgerät	1 Tag	Mon 28.09.26	Die 29.09.26	33
35	Rückbau Erdwiderlager	1 Tag	Die 29.09.26	Mit 30.09.26	34
36	Vermessung der Gleislage	1 Tag	Mit 30.09.26	Don 01.10.26	35
37	**Schächte und Leitungen**	**20 Tage**	**Don 01.10.26**	**Fre 23.10.26**	**25**
38	Herstellung Ortbetonschacht und Kunststoffschächte	10 Tage	Don 01.10.26	Die 13.10.26	
39	Verlegung und Anschluss der Leitungen bahnlinks	5 Tage	Die 13.10.26	Sam 17.10.26	38
40	Rückbau Beton-Pressenwiderlager	2 Tage	Mon 19.10.26	Die 20.10.26	39
41	Verfüllung der Baugruben und Leitungsgräben	3 Tage	Mit 21.10.26	Fre 23.10.26	40
42	**Rückbau Baubehelfe**	**11 Tage**	**Sam 24.10.26**	**Don 05.11.26**	**37**
43	Rückbau Gurtung und Aussteifung	1 Tag	Sam 24.10.26	Sam 24.10.26	
44	Abbrennen der bahnseitigen Spundwände	1 Tag	Sam 24.10.26	Mon 26.10.26	43
45	Ziehen der Spundwände außerhalb der ideellen Bö-Linie	3 Tage	Mon 26.10.26	Don 29.10.26	44
46	Teilrückbau BE-Fläche bahnrechts	2 Tage	Don 29.10.26	Sam 31.10.26	45
47	Grabenherstellung bahnrechts, einschl. Sohl- und Bö-befestigung	3 Tage	Sam 31.10.26	Mit 04.11.26	46
48	Wasserumschluss in neuen Durchlass und Grabenverlauf	1 Tag	Mit 04.11.26	Don 05.11.26	47
49	**Verpressung Bestandsdurchlass**	**4 Tage**	**Don 05.11.26**	**Die 10.11.26**	**42**
50	Vorbereitung Durchlassverfüllung (Abmauern, Einfüll- und Entlüftungsrohre)	3 Tage	Don 05.11.26	Mon 09.11.26	
51	Verdämmern des alten Durchlasses einschl. Schacht	1 Tag	Mon 09.11.26	Die 10.11.26	50
52	**Baustelle räumen**	**27 Tage**	**Die 10.11.26**	**Fre 11.12.26**	**49**
53	Rückbau der Baustelleneinrichtung	3 Tage	Die 10.11.26	Fre 13.11.26	
54	Rückbau BE-Flächen	8 Tage	Fre 13.11.26	Mon 23.11.26	53
55	Rückbau der Baustraßen	15 Tage	Mon 23.11.26	Don 10.12.26	54
56	Schlussvermessung	1 Tag	Don 10.12.26	Fre 11.12.26	55

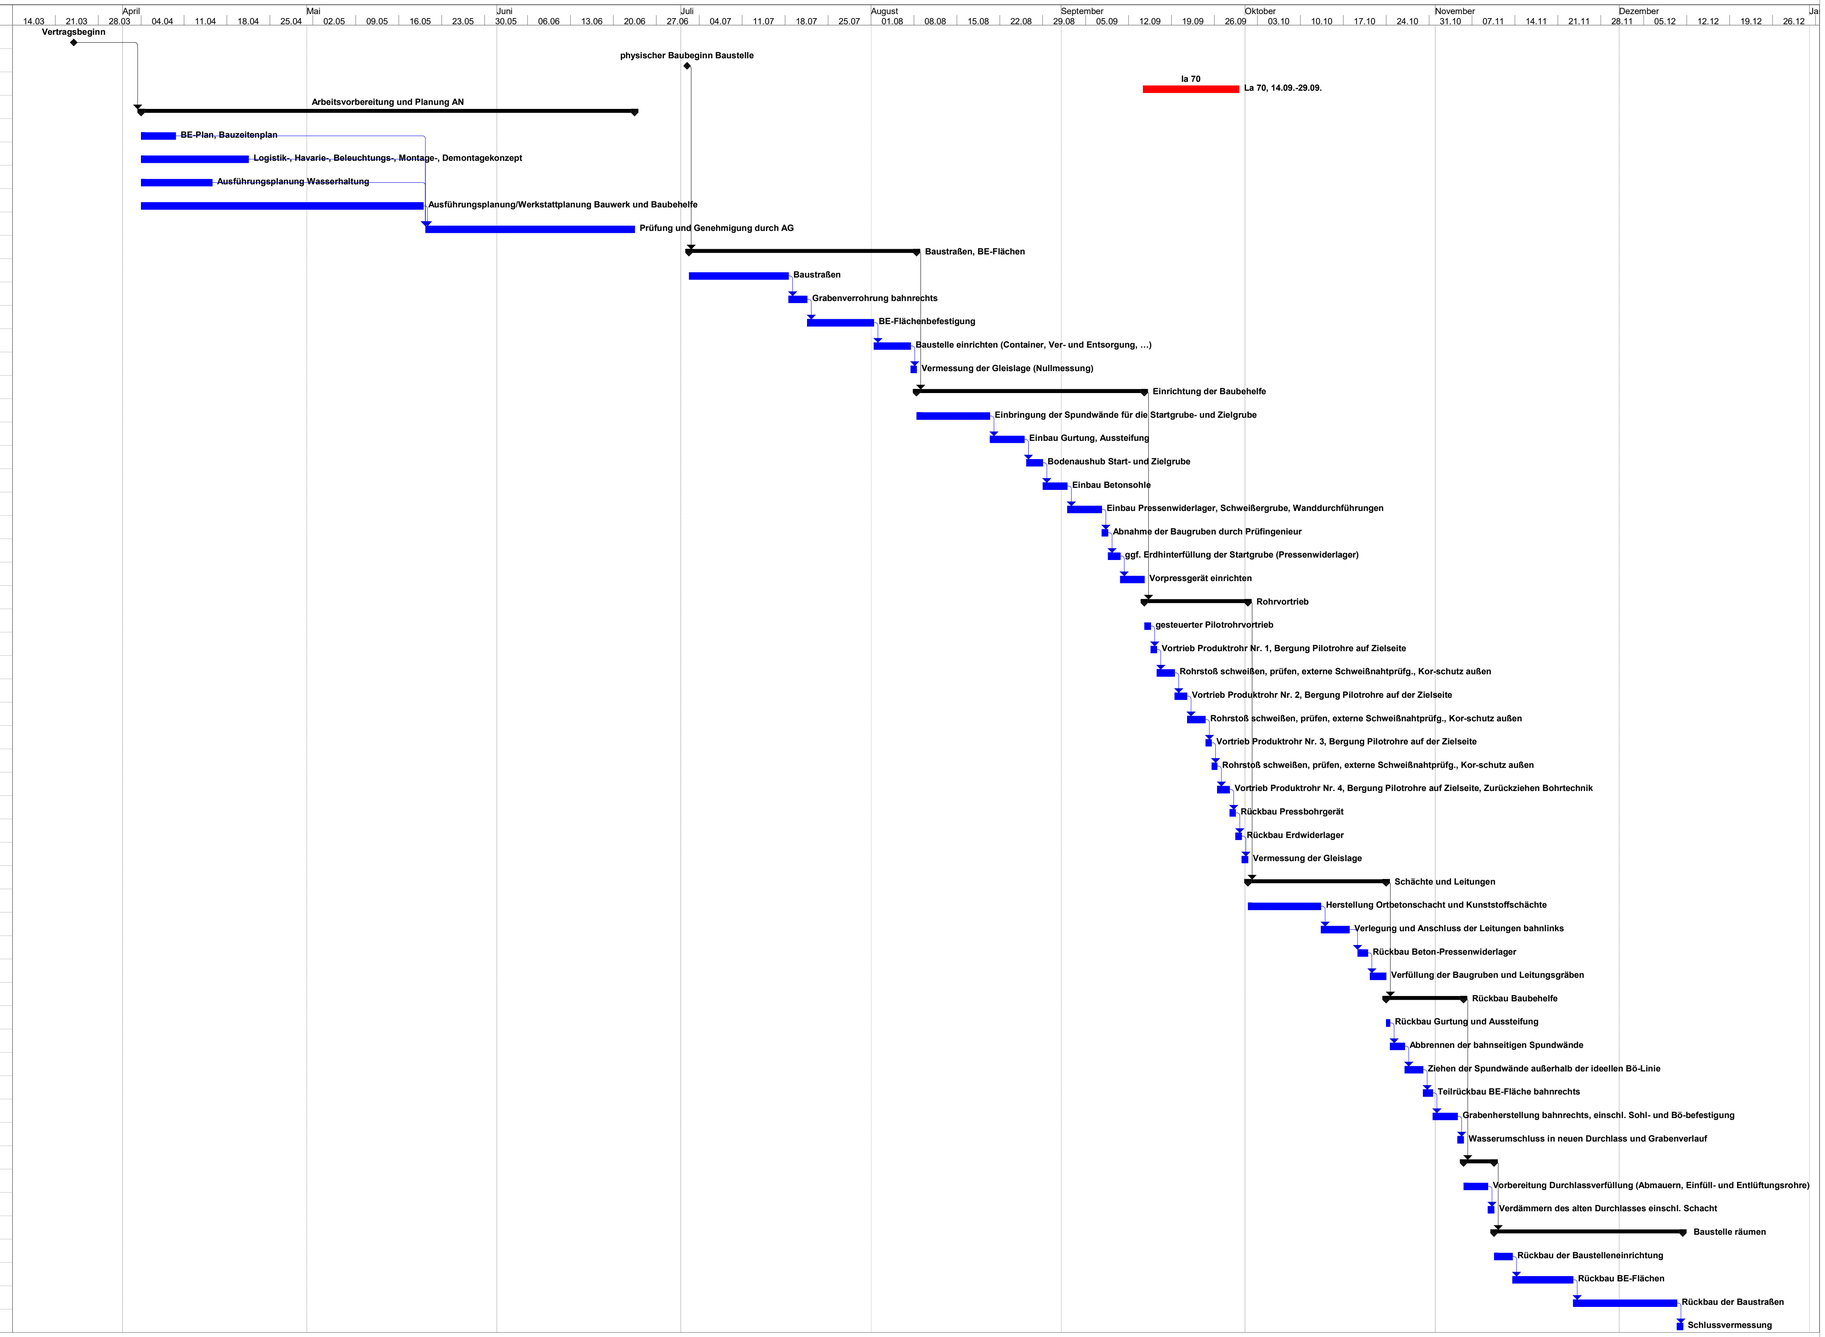

Projekt: Bauzeitenplan
Datum: Fre 12.12.25

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | Stichtag
Unterbrechung | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | In Arbeit
