Projekt: 18050 - Sanierung Schule Grassau

Bauzeitenplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1				
2	**Bauzeit 1. + 2. BA**	**1069 Tage**	**Mon 01.08.22**	**Fre 18.12.26**
3	Baustelleneinrichtung	3 Tage	Mon 01.08.22	Mit 03.08.22
4	Interimsmaßnahme Stronmversorgung für Gebäudebestand im Be	5 Tage	Mit 03.08.22	Die 09.08.22
5	**1. BA einschl. Umzug Schule**	**482 Tage**	**Mon 01.08.22**	**Fre 26.07.24**
71				
73				
74	**2. BA einschl. Umzug Schule**	**563 Tage**	**Mon 02.09.24**	**Fre 18.12.26**
75	**Schadstoffsanierung + Entkernung**	**78 Tage**	**Mon 02.09.24**	**Fre 20.12.24**
78	**Baumeister**	**328 Tage**	**Mit 23.10.24**	**Fre 06.03.26**
89	**Gerüstbau**	**271 Tage**	**Mon 20.01.25**	**Don 26.02.26**
93	**Haustechnische Gewerke**	**406 Tage**	**Mon 14.04.25**	**Fre 04.12.26**
94	HLS-Rohinstallation inkl. Montage Lüftungsgeräte + Heizkör	76 Tage	Mon 14.04.25	Fre 07.11.25
95	HLS: Bodenschienen f. HLS-Ständer/Trockenbau-Sanitärvorw	5 Tage	Mon 15.09.25	Fre 19.09.25
96	ELT-Rohinstallation inkl. Kernbohrungen	77 Tage	Mon 28.04.25	Fre 24.10.25
97	Blitzschutz Dach + Rinnen	10 Tage	Don 11.12.25	Fre 16.01.26
98	Installationen in Trockenbauwänden HLS, ELT	30 Tage	Mon 12.01.26	Fre 20.02.26
99	HLS- + ELT-Brandschotts schließen	15 Tage	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26
100	Feininstallation HLS	45 Tage	Mon 14.09.26	Fre 13.11.26
101	Feininstallation ELT	30 Tage	Mon 21.09.26	Fre 30.10.26
102	Messungen, Inbetriebnahmen, Abnahmen Brandschutz, HLS	23 Tage	Mit 04.11.26	Fre 04.12.26
103	**Zimmerer/Dachdecker**	**240 Tage**	**Mit 09.07.25**	**Fre 03.07.26**
114	**Spengler**	**86 Tage**	**Fre 21.11.25**	**Die 07.04.26**
121	**Alu-Holzfenster/-Pfosten-Riegel-Elemente**	**212 Tage**	**Mon 27.01.25**	**Fre 28.11.25**
126	**Alu-Fenster/-Außentüren**	**376 Tage**	**Mon 03.03.25**	**Fre 11.09.26**
134	**Sonnenschutzanlagen**	**162 Tage**	**Mon 26.05.25**	**Die 27.01.26**
138	**Natursteinarbeiten**	**75 Tage**	**Mit 20.08.25**	**Mit 03.12.25**
141	**Innenputz**	**120 Tage**	**Mit 11.06.25**	**Fre 28.11.25**
145	**Wärmedämmverbundsystem**	**50 Tage**	**Mon 01.12.25**	**Fre 20.02.26**
147	**Trockenbau**	**223 Tage**	**Mon 04.08.25**	**Mon 06.07.26**
148	Abbruch GK-Decken OG Bt1	3 Tage	Mon 04.08.25	Mit 06.08.25
149	Trockenbau: Unterkonstrution Sanitärwände	5 Tage	Mit 22.10.25	Die 28.10.25
150	Abbruch Dachschrägenverkleidung + Dämmung	10 Tage	Mon 08.12.25	Fre 19.12.25
151	Dampfbremse + Dachschrägenverkldg. neu	21 Tage	Mon 22.12.25	Mon 02.02.26
152	Wände neu Bt2 DG	20 Tage	Mon 02.02.26	Fre 27.02.26
153	Trockenbau DG Bt1: Wände, einseitig beplankt	5 Tage	Mon 22.12.25	Fre 09.01.26
154	Trockenbau EG+ OG: Wände, einseitig beplankt	15 Tage	Die 04.11.25	Mon 24.11.25
155	Trockenbau: Wände schließen	15 Tage	Mon 23.02.26	Fre 13.03.26
156	Trockenbau: Türstürze Flure + Abgehängte Decken	80 Tage	Mon 09.03.26	Mon 06.07.26
157	**Gussasphaltestrich**	**10 Tage**	**Mon 16.03.26**	**Fre 27.03.26**
158	Gussasphaltestrich, Trh, Flure + Sanitär	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26
159	**Fliesen**	**69 Tage**	**Mon 30.03.26**	**Fre 10.07.26**
160	Wandfliesen Sanitärbereiche + Klassen	28 Tage	Mon 30.03.26	Mon 11.05.26
161	Bodenfliesen Sanitärbereiche	25 Tage	Mon 27.04.26	Mit 03.06.26
162	Bodenfliesen Treppen , Flure	29 Tage	Mon 01.06.26	Fre 10.07.26
163	**Aufzugschacht im Bestand**	**65 Tage**	**Mon 02.03.26**	**Mon 08.06.26**
166	**Schlosser**	**32 Tage**	**Mon 11.05.26**	**Fre 26.06.26**
167	Schlosser: Demontage Treppengeländer alt + Montage Treppengeländer neu + Rampen Bt2	15 Tage	Mon 11.05.26	Die 02.06.26
168	Schlosser: Vordach Bt1 Haupteingang Nord, Aussengeländer	19 Tage	Mon 01.06.26	Fre 26.06.26
169	**Maler**	**55 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Fre 28.08.26**
172	**Bodenbeläge: Linoleum/Parkett**	**30 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Fre 04.09.26**
173	Bodenbeläge: Ergänzen Trockenestriche, Ausbesserung Gußasphalt (Bestand)	15 Tage	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26
174	Bodenbeläge: Linoleum	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26
175	Parkett	15 Tage	Mon 17.08.26	Fre 04.09.26
176	**Innentüren / WC-Trennwände**	**15 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 18.09.26**
177	Innentüren + Fertigzargen	15 Tage	Mon 31.08.26	Fre 18.09.26
178	WC-Trennwände	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26
179	**Schreiner: Garderoben etc.**	**5 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 04.09.26**
181	**Bauschlussreinigung**	**35 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 16.10.26**
184	Loses Mobiliar	15 Tage	Mon 02.11.26	Fre 20.11.26
185	**Freianlagen: Eingangstreppen**	**37 Tage**	**Die 07.04.26**	**Mon 01.06.26**
189				
190	**Umzug Schule in Bt1 + 2**	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26

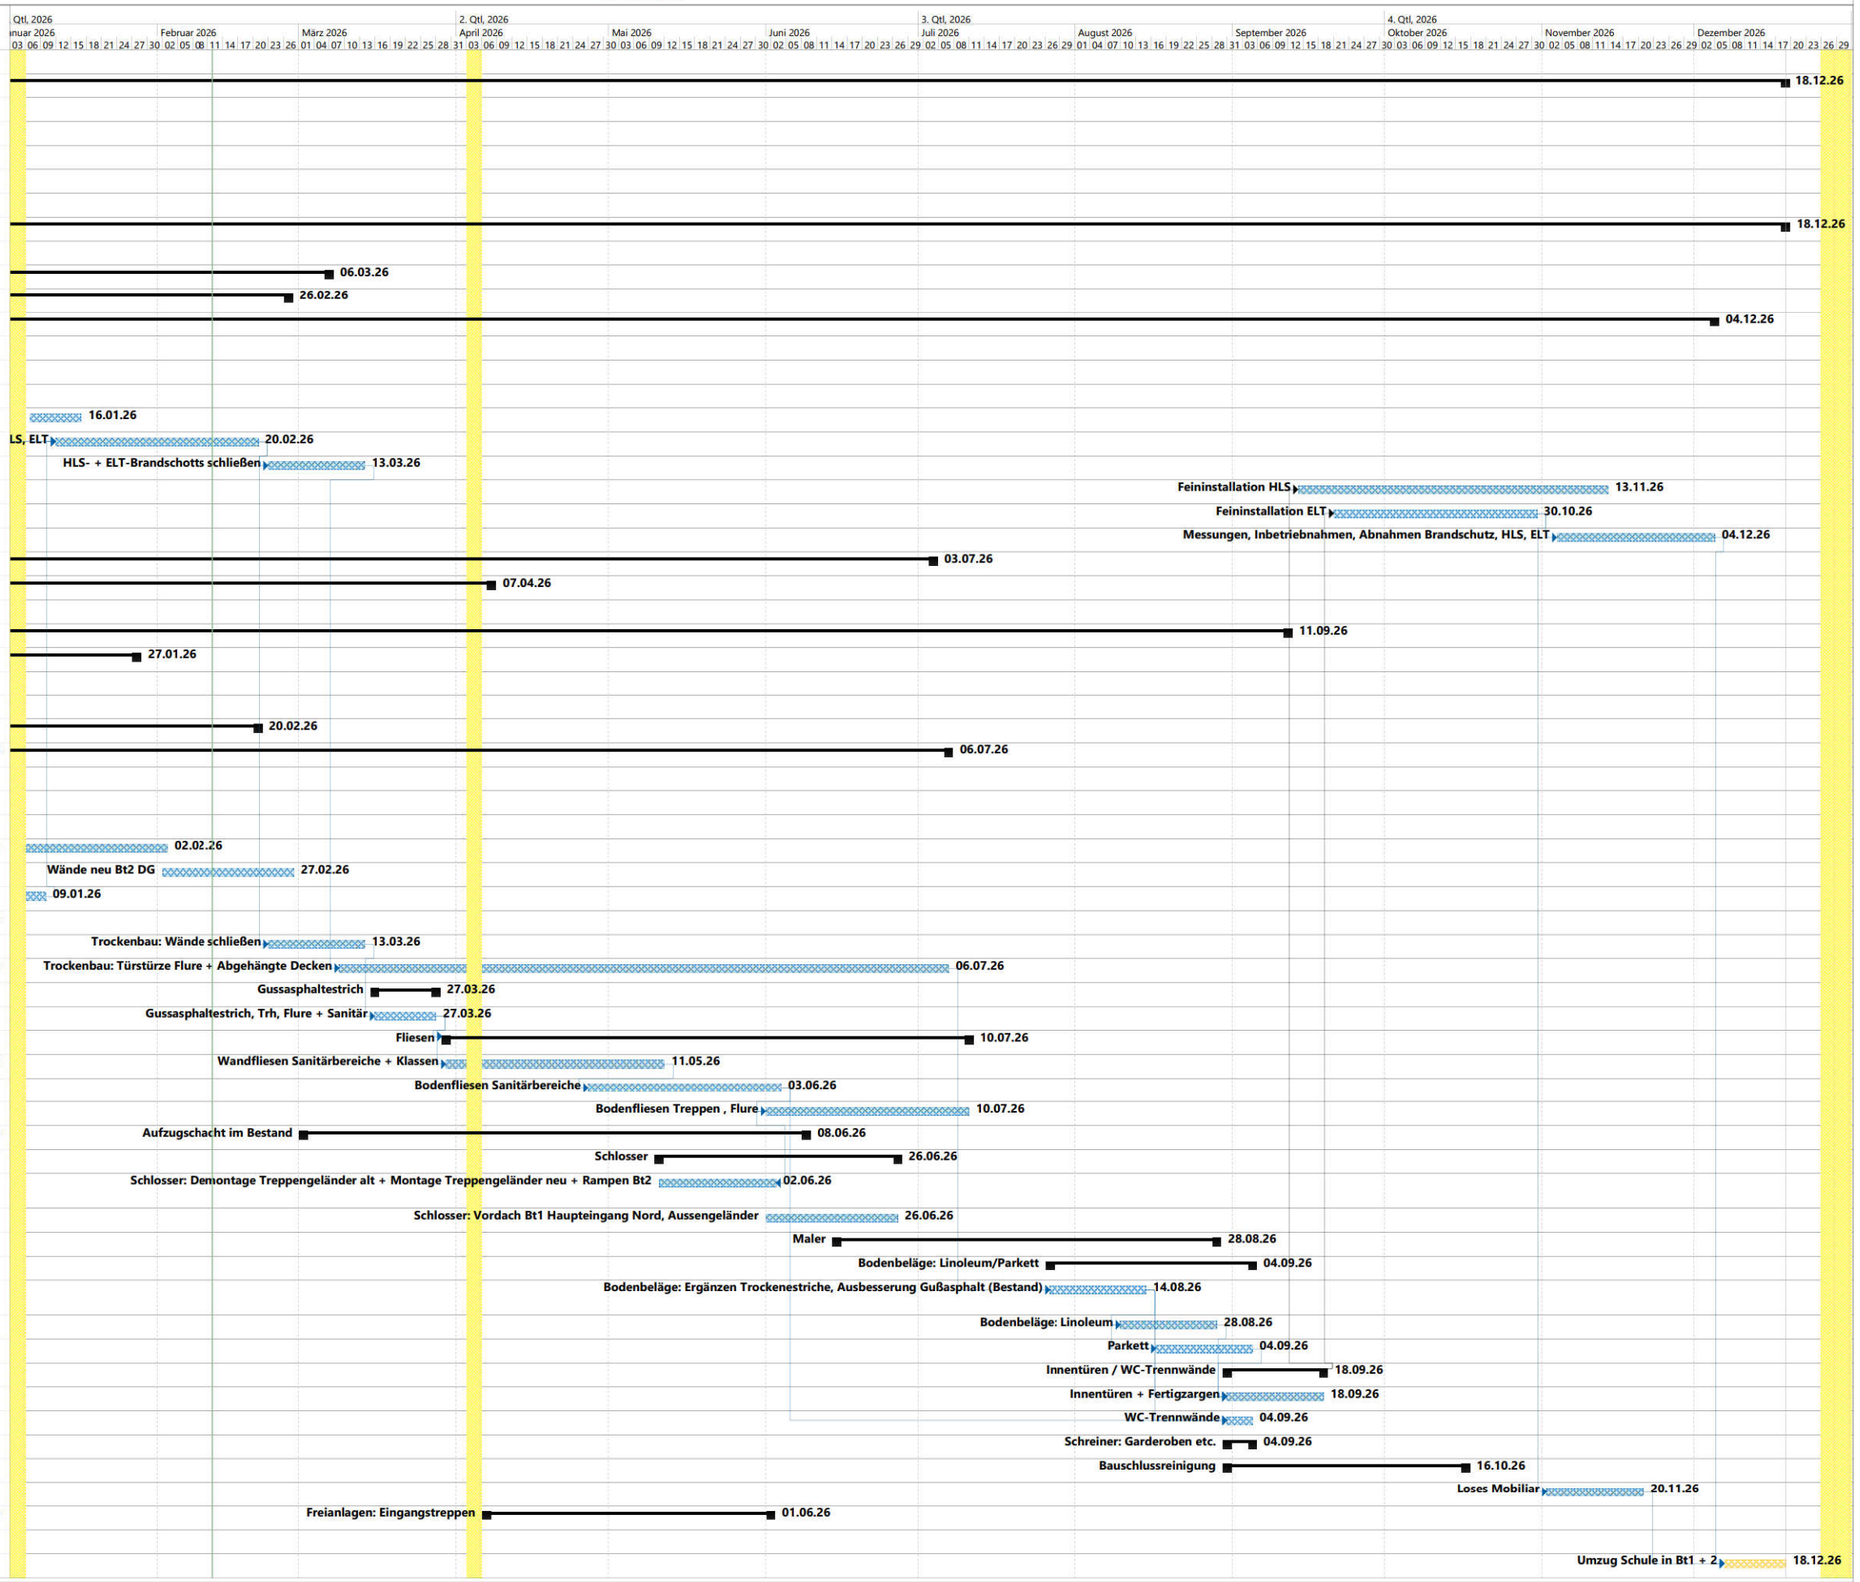

Vorgang Meilenstein Sammelvorgang
