Teilterminplan Bauablauf

Projektname: KBS - Campus Bochum
Datum: 27.02.2026

VORABZUG

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Start	Ende
1	**Ecktermine**	**91,1 W**	**08.09.25**	**19.07.27**
5	Baubeginn	0 W	30.06.26	30.06.26
6	Übergabe Bauherr	0 W	19.07.27	19.07.27
314	**Bauausführung**	**76,3 W**	**05.01.26**	**19.07.27**
315	**Rückbau**	**12 W**	**05.01.26**	**27.03.26**
316	Rückbauarbeiten Wände, Beläge, TGA	12 W	05.01.26	27.03.26
317	**Innenausbau 2 Etagen zusammen**	**52,3 W**	**30.06.26**	**19.07.27**
318	Baustelleneinrichtung	2 W	30.06.26	13.07.26
319	Durchbrüche	3 W	22.07.26	12.08.26
320	Innenputz	4 W	05.08.26	02.09.26
321	Trockenbau 1-seitig	6 W	12.08.26	23.09.26
322	Rohinstallation Lüftung	6 W	09.09.26	20.10.26
323	Rohinstallation Sanitär	2 W	02.09.26	16.09.26
324	Rohinstallation Elektro	7 W	09.09.26	28.10.26
325	Trockenbau schließen	5 W	07.10.26	11.11.26
326	Estrich	1 W	21.10.26	28.10.26
327	Wandfliesen	2 W	28.10.26	11.11.26
328	Glastrennwände	6 W	18.11.26	11.01.27
329	Metallbau	2 W	28.10.26	11.11.26
330	Bodenfliesen	2 W	25.11.26	09.12.26
331	Bodenbelag	6 W	09.12.26	01.02.27
332	Abhangdecken	6 W	11.01.27	22.02.27
333	Maler	6 W	01.02.27	15.03.27
334	Feininstallation Elektro	7 W	15.02.27	07.04.27
335	Feininstallation Lüftung	6 W	22.02.27	07.04.27
336	Feininstallation Sanitär	2 W	01.03.27	15.03.27
337	Gebäudeautomation	2 W	31.03.27	14.04.27
338	Möblierung, Einrichtung	3 W	31.03.27	21.04.27
339	Reinigung	1 W	21.04.27	28.04.27
340	Trockenbau 1-seitig	6 W	11.11.26	04.01.27
341	Rohinstallation Lüftung	6 W	02.12.26	25.01.27
342	Rohinstallation Sanitär	2 W	02.12.26	16.12.26
343	Rohinstallation Elektro	7 W	02.12.26	01.02.27
344	Trockenbau schließen	5 W	11.01.27	15.02.27
345	Estrich	1 W	25.01.27	01.02.27
346	Wandfliesen	2 W	01.02.27	15.02.27
347	Glastrennwände	6 W	01.02.27	15.03.27
348	Metallbau	2 W	01.02.27	15.02.27
349	Bodenfliesen	2 W	01.03.27	15.03.27
350	Bodenbelag	6 W	01.03.27	14.04.27
351	Abhangdecken	6 W	22.03.27	05.05.27
352	Maler	6 W	14.04.27	31.05.27
353	Feininstallation Elektro	7 W	28.04.27	21.06.27
354	Feininstallation Lüftung	6 W	05.05.27	21.06.27
355	Feininstallation Sanitär	2 W	13.05.27	31.05.27
356	Gebäudeautomation	2 W	14.06.27	28.06.27
357	Möblierung, Einrichtung	3 W	14.06.27	05.07.27
358	Reinigung	1 W	05.07.27	12.07.27
359	BE räumen / Außenanlagen	2 W	05.07.27	19.07.27
360	Abnahme / Übergabe	2 W	05.07.27	19.07.27

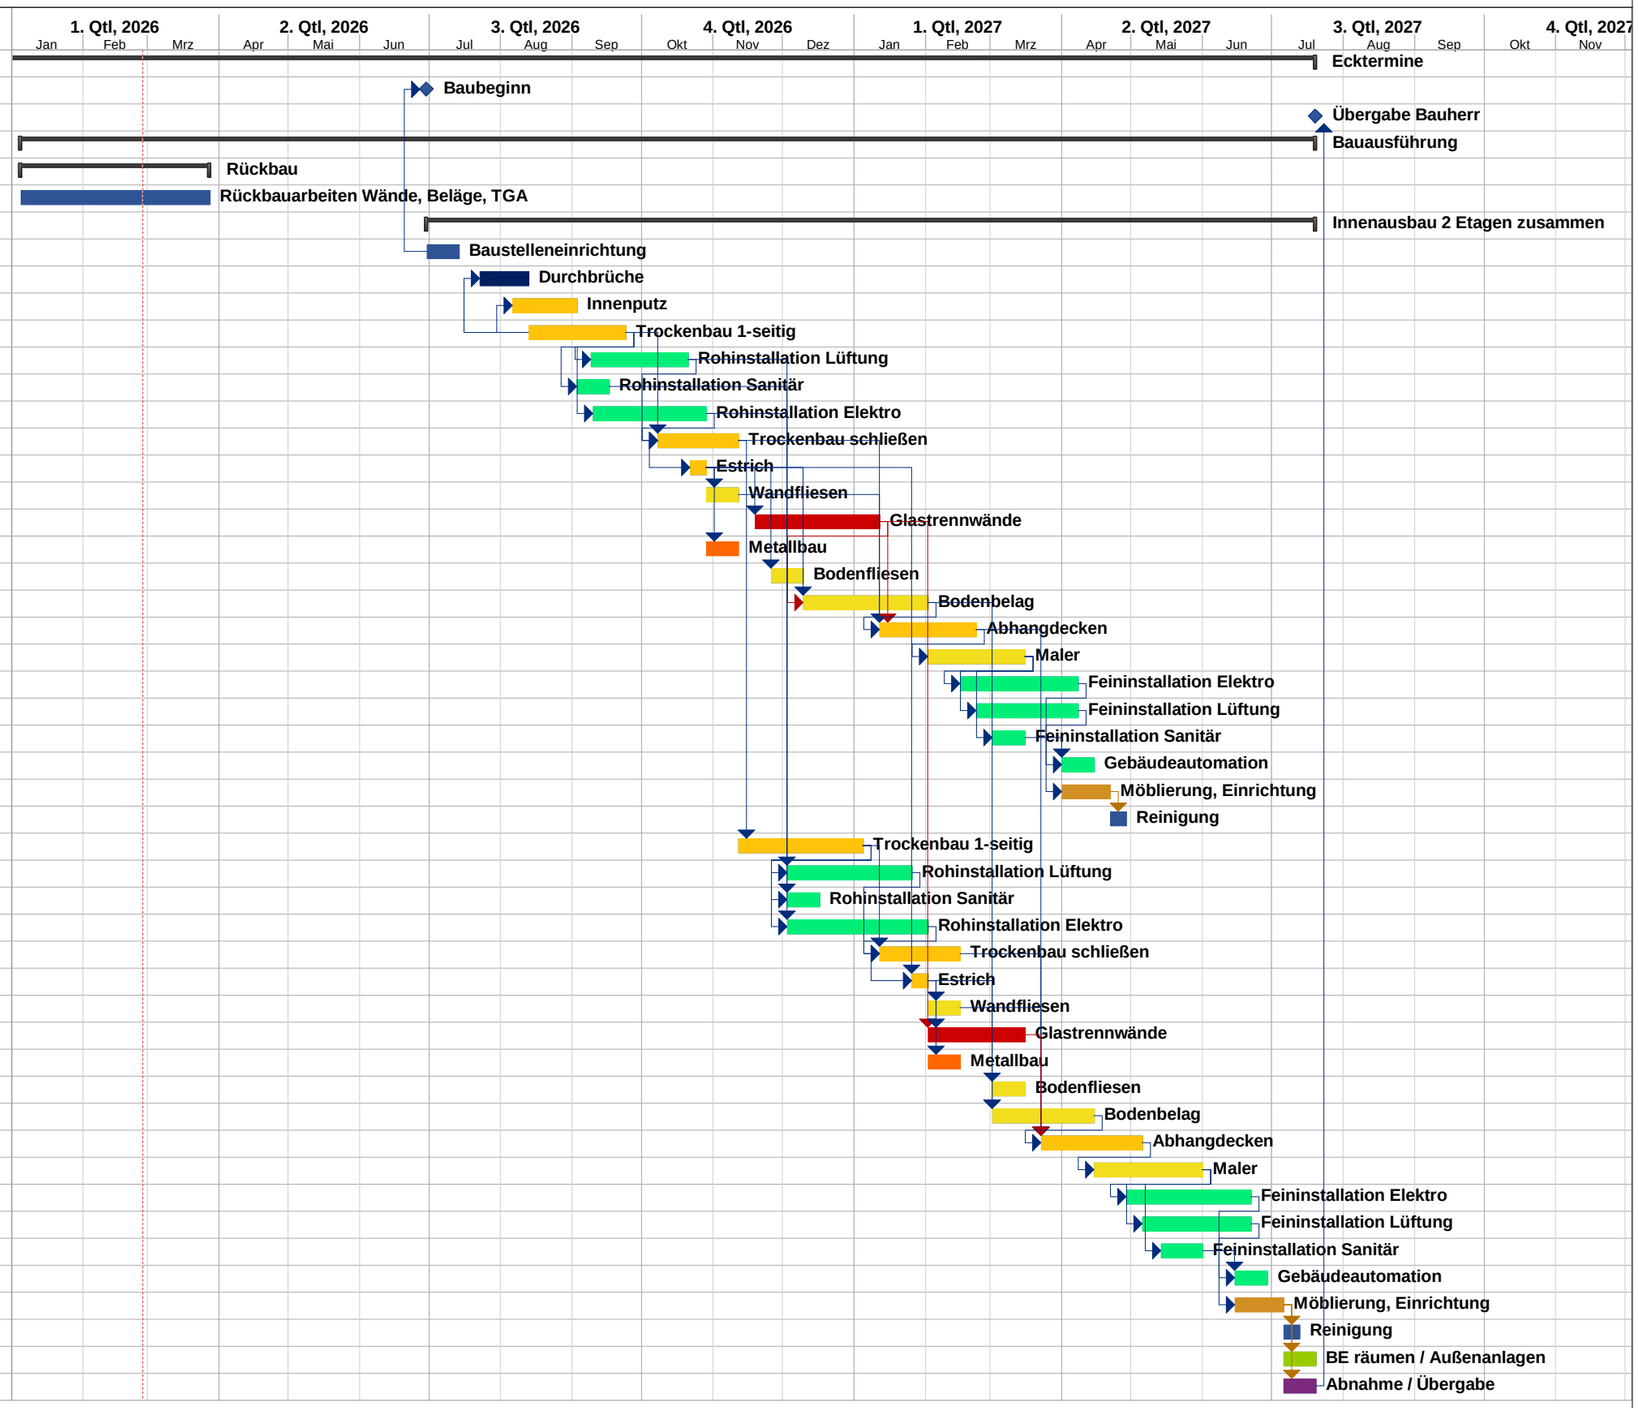

Sammelvorgang | Ecktermin | Rohbau | Glastrennwände | Boden- Wandbeläge | Möblierung
Vorgang | Bauherr | TGA (HKLS, ELT, Kälte) | Estrich, Trockenbau | Schlosser, Türen, Tore | Außenanlagen

Teilterminplan Bauablauf

Projektname: KBS - Campus Bochum
Datum: 27.02.2026
