Bedarfsprogramm 05G24, Grundschule am Windmühlenberg; Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt)

Rahmenterminplan
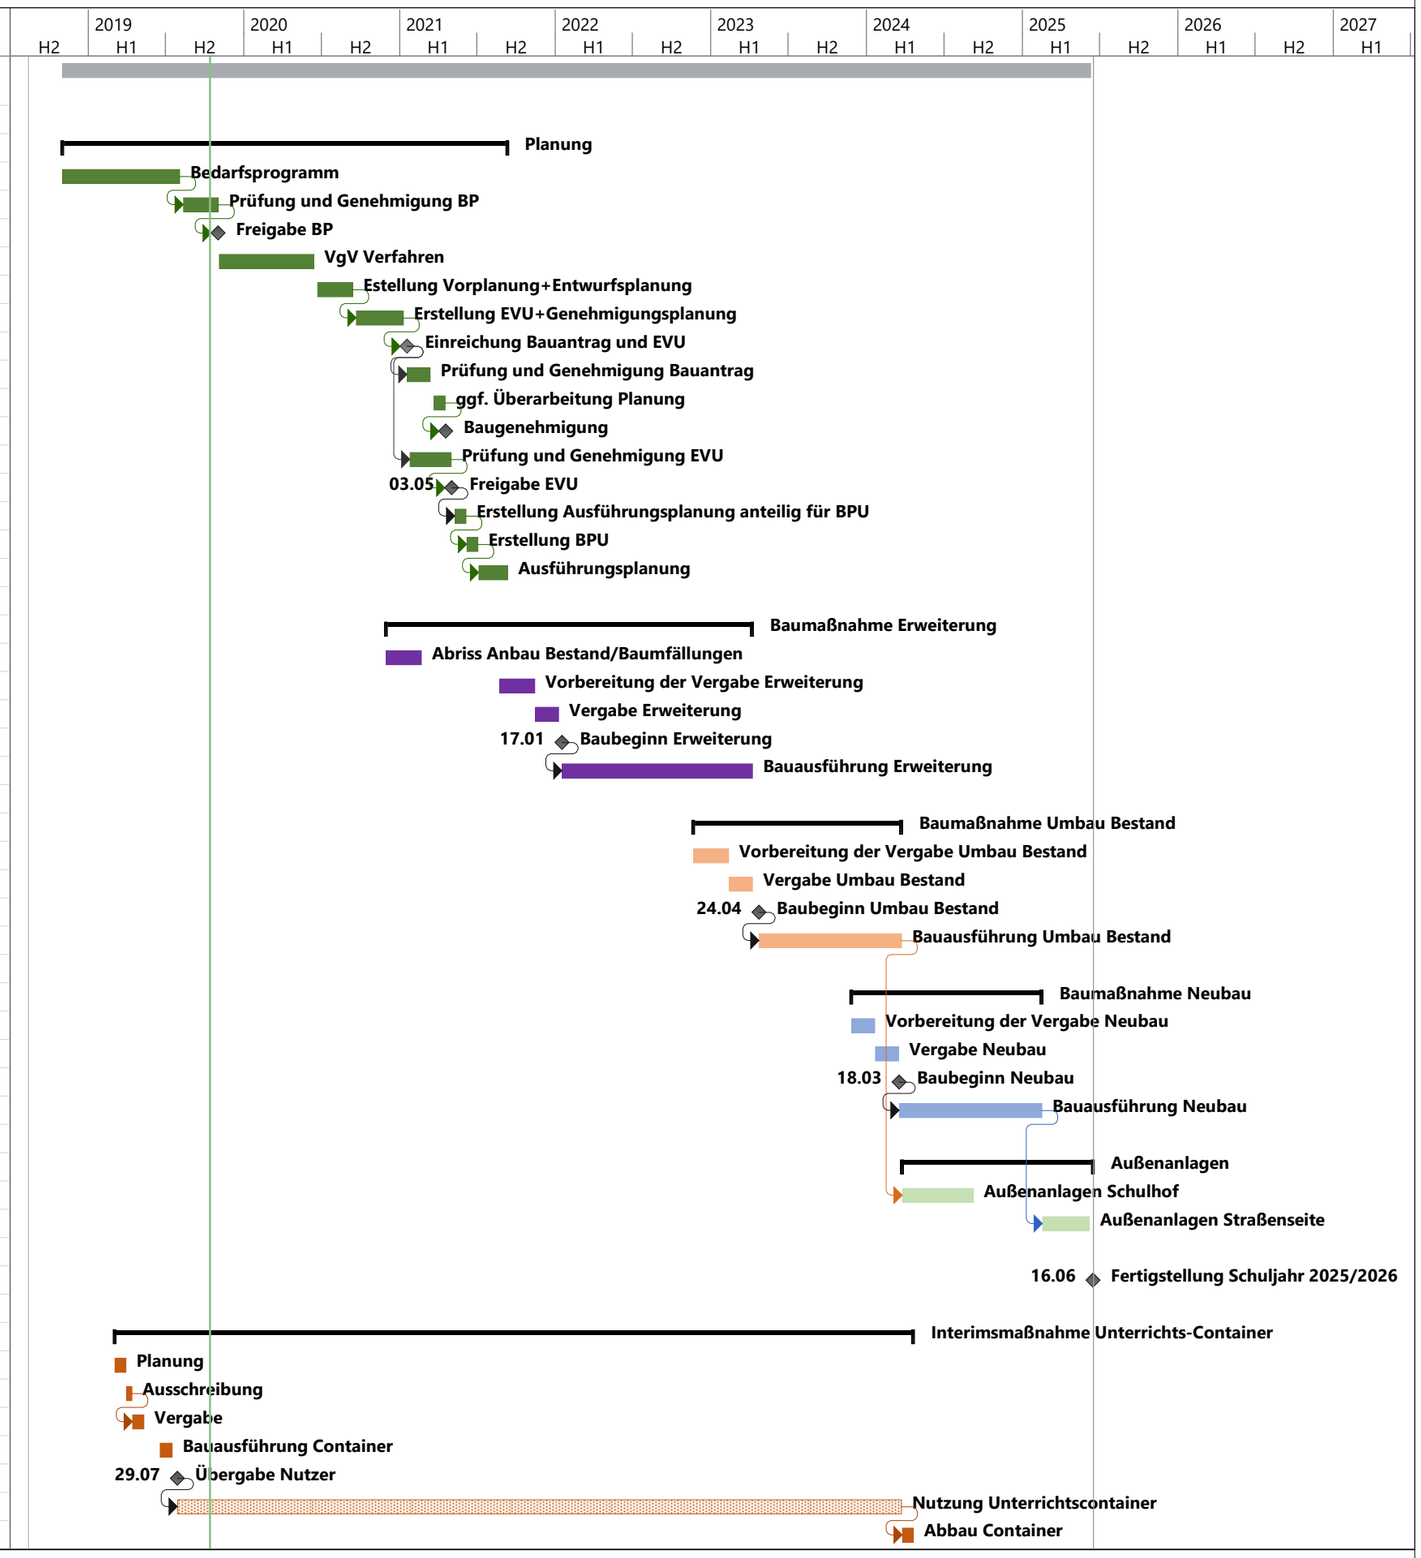
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Sanierung, Umbau und Erweiterung Grundschule am Windmühlenberg**	1723 Tage?	Don 01.11.18	Mon 09.06.25
2				
3	**Planung**	**37,35 Monate**	**Don 01.11.18**	**Fre 10.09.21**
4	Bedarfsprogramm	197 Tage	Don 01.11.18	Fre 02.08.19
5	Prüfung und Genehmigung BP	3 Monate	Mon 12.08.19	Fre 01.11.19
6	**Freigabe BP**	**0 Tage**	**Fre 01.11.19**	**Fre 01.11.19**
7	VgV Verfahren	8 Monate	Mon 04.11.19	Fre 12.06.20
8	Estellung Vorplanung+Entwurfsplanung	3 Monate	Mon 22.06.20	Fre 11.09.20
9	Erstellung EVU+Genehmigungsplanung	4 Monate	Mon 21.09.20	Fre 08.01.21
10	**Einreichung Bauantrag und EVU**	**0 Tage**	**Mon 18.01.21**	**Mon 18.01.21**
11	Prüfung und Genehmigung Bauantrag	2 Monate	Mon 18.01.21	Fre 12.03.21
12	ggf. Überarbeitung Planung	1 Monat	Mon 22.03.21	Fre 16.04.21
13	**Baugenehmigung**	**0 Tage**	**Mon 19.04.21**	**Mon 19.04.21**
14	Prüfung und Genehmigung EVU	3,5 Monate	Mon 25.01.21	Fre 30.04.21
15	**Freigabe EVU**	**0 Tage**	**Mon 03.05.21**	**Mon 03.05.21**
16	Erstellung Ausführungsplanung anteilig für BPU	1 Monat	Mon 10.05.21	Fre 04.06.21
17	Erstellung BPU	1 Monat	Mon 07.06.21	Fre 02.07.21
18	Ausführungsplanung	2,5 Monate	Mon 05.07.21	Fre 10.09.21
19				
20	**Baumaßnahme Erweiterung**	**30,75 Monate**	**Mon 30.11.20**	**Fre 07.04.23**
21	Abriss Anbau Bestand/Baumfällungen	3 Monate	Mon 30.11.20	Fre 19.02.21
22	Vorbereitung der Vergabe Erweiterung	3 Monate	Mon 23.08.21	Fre 12.11.21
23	Vergabe Erweiterung	2 Monate	Mon 15.11.21	Fre 07.01.22
24	**Baubeginn Erweiterung**	**0 Tage**	**Mon 17.01.22**	**Mon 17.01.22**
25	Bauausführung Erweiterung	16 Monate	Mon 17.01.22	Fre 07.04.23
26				
27	**Baumaßnahme Umbau Bestand**	**17,5 Monate**	**Mon 21.11.22**	**Fre 22.03.24**
28	Vorbereitung der Vergabe Umbau Bestand	3 Monate	Mon 21.11.22	Fre 10.02.23
29	Vergabe Umbau Bestand	2 Monate	Mon 13.02.23	Fre 07.04.23
30	**Baubeginn Umbau Bestand**	**0 Tage**	**Mon 24.04.23**	**Mon 24.04.23**
31	Bauausführung Umbau Bestand	12 Monate	Mon 24.04.23	Fre 22.03.24
32				
33	**Baumaßnahme Neubau**	**16 Monate**	**Mon 27.11.23**	**Fre 14.02.25**
34	Vorbereitung der Vergabe Neubau	2 Monate	Mon 27.11.23	Fre 19.01.24
35	Vergabe Neubau	2 Monate	Mon 22.01.24	Fre 15.03.24
36	**Baubeginn Neubau**	**0 Tage**	**Mon 18.03.24**	**Mon 18.03.24**
37	Bauausführung Neubau	12 Monate	Mon 18.03.24	Fre 14.02.25
38				
39	**Außenanlagen**	**16 Monate**	**Mon 25.03.24**	**Mon 16.06.25**
40	Außenanlagen Schulhof	6 Monate	Mon 25.03.24	Fre 06.09.24
41	Außenanlagen Straßenseite	4 Monate	Mon 17.02.25	Fre 06.06.25
42				
43	**Fertigstellung Schuljahr 2025/2026**	**0 Tage**	**Mon 16.06.25**	**Mon 16.06.25**
44				
45	**Interimsmaßnahme Unterrichts-Container**	**67 Monate?**	**Mon 04.03.19**	**Fre 19.04.24**
46	Planung	20 Tage	Mon 04.03.19	Fre 29.03.19
47	Ausschreibung	10 Tage	Mon 01.04.19	Fre 12.04.19
48	Vergabe	1 Monat	Mon 15.04.19	Fre 10.05.19
49	Bauausführung Container	1 Monat	Die 18.06.19	Mon 15.07.19
50	**Übergabe Nutzer**	**0 Tage**	**Mon 29.07.19**	**Mon 29.07.19**
51	Nutzung Unterrichtscontainer	1215 Tage?	Mon 29.07.19	Fre 22.03.24
52	Abbau Container	1 Monat	Mon 25.03.24	Fre 19.04.24
